

DÍA	MES	AÑO
07	11	2016
N° DE OFICIO		GO/ C-0352/ 2016 F

GERENTE/O DIRECTOR: ERNESTO MARROQUIN ALVAREZ	PUESTO: DIRECTOR DE APOYO A MUNICIPIOS
COMISIONADO: J. JESUS LOPEZ JIMENEZ	PUESTO: RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
ACOMPAÑA A:	PUESTO:
ELABORÓ DOCUMENTO: J. JESUS LOPEZ JIMENEZ - RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA	STATUS: Pendiente Autorización de Anticipo por el Usuario

DETALLE DE CONCEPTOS Y MONTOS POR DÍA					
FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE
09/11/2016	Ixtlahuacán del Río	\$ 75.00	Ixtlahuacán del Río \$ 128.00	NA. \$ 0.00	NA. \$ 0.00
ACTIVIDAD: supervisión de obra Ixtlahuacan del Río el chililar, el ancon, el palomar y san miguel de abajo.					
10/11/2016	Ahualulco de Mercado	\$ 100.00	Ahualulco de Mercado \$ 170.00	NA. \$ 0.00	NA. \$ 0.00
ACTIVIDAD: supervisión de obra Ahualulco del Mercado santa cruz de barcenas y chapulmita.					
11/11/2016	Zacoalco de Torres	\$ 75.00	Zacoalco de Torres \$ 128.00	NA. \$ 0.00	NA. \$ 0.00
ACTIVIDAD: supervisión de obra las moras, mpio. Zacoalco de Torres.					

FECHA SALIDA:	09/11/2016	VIÁTICOS \$:	676.00	VEHICULO - PLACAS:	JN 61024
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	TIPO:	F-150
DIA(S) PROBABLES(S):	3	GASOLINA \$:	0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007
FECHA PROB. REGRESO:	11/11/2016	PEAJE \$:	0.00	CILINDRAJE:	6
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	KILOMETRAJE INICIAL:	282,078.00
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	RURAL 2016 (APARURAL S074 S075) ATENCION S	EFFECTIVO EN VALES:	0.00
JUST. VALES EXCE:				EFE. VALES EXCEDENTE:	0
				EFE. VALES MANIOBRA:	0

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: \$ 676.00 (SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN

COMISIONADO J. JESUS LOPEZ JIMENEZ RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA	AUTORIZA COMISIÓN DIRECTOR Ó GERENTE
---	---



Fecha Pago Anticipo:	31/10/2016
Fecha Elab. Compro:	07/11/2016
N° de Oficio:	GO / C-0342 / 2016 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Nov 7 2016 5:15PM

GERENTE O DIRECTOR:	ERNESTO MARROQUIN ALVAREZ	PUESTO:	DIRECTOR DE APOYO A MUNICIPIOS
COMISIONADO:	J. JESUS LOPEZ JIMENEZ	PUESTO:	RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
ACOMPAÑA:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO: J. JESUS LOPEZ JIMENEZ - RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA STATUS: Oficio Comprobado; Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
01/11/2016	MUNICIPIO: Ixtlahuacán del Río \$ 75.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: supervision obras en Ixtlahuacan del Río (el palomar, el ancon, el chilar y san miguel de abajo)	Ixtlahuacán del Río \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS: EXCE: HOSP: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
03/11/2016	MUNICIPIO: Ahualulco de Mercado \$ 100.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: supervision obras Ahualulco del Mercado (Chapulimita, Santa Cruz de Barcenas).	Ahualulco de Mercado \$ 170.00 GASOLINA: 0.00 JUS: EXCE: HOSP: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
04/11/2016	MUNICIPIO: Zacoalco de Torres \$ 75.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: supervision obras Zacoalco de Torres (Las Moras)	Zacoalco de Torres \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS: EXCE: HOSP: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	JN 61024	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA:	01/11/2016	VIÁTICOS \$:	676.00	676.00	0.00	\$ 0.00	TIPO/CILINDROS/REND:	F-150 / 6 Cyl. / 6.5 Km/l.		
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA/ MODELO:	Ford / 2007		
DIA(S) COMISIÓN:	3	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	281,748.00 Km. / 281,748.00 Km.		
FECHA DE REGRESO:	04/11/2016	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	0.00 Km.		
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN:			
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	RURAL 2016 (APARURAL S074 S075) ATENCIO				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0		
HOROMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO:	0.00		
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00		
							VALES MANOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00		
							SALDO VALES MANOBRAS:	0.00		
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **676.00** (SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.


EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE	\$ 676.00
MENOS ANTICIPO	\$ 676.00
SALDO	\$ 0.00

[Firma]
COMISIONADO
J. JESUS LOPEZ JIMENEZ
RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA

[Firma]
AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR O GERENTE

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

J. JESUS LOPEZ JIMENEZ N° OFICIO: GO / C-0342 / 2016

DEL DÍA: 01/11/2016 AL DÍA: 04/11/2016

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

MARTES 01 DE NOVIEMBRE.- SALIDA AL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO, CON EL ARQ. LUIS HORNER VALENCIA Y EL ING. FEDERICO ROMO DE LA CNA, PARA VERIFICAR AVANCES EN LKA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA SAN MIGUEL- EL ANCON, SEGUNDA ETAPA EN LAS LOCALIDADES DE SAN MIGUEL, DE ARRIBA, SAN MIGUEL DE ABAJO, EL PALOMAR, EL CHILAR Y EL ANCON MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO, JALISCO.

JUEVES 03 DE NOVIEMBRE.- SALIDA AL MUNICIPIO DE AHUALULCO DEL MERCADO.- PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA AMPLIACION Y REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE BARCENAS, MUNICIPIO DE AHUALULCO DEL MERCADO, ASI COMO LA SUPERVISION DE LA OBRA DENOMINADA PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE CHAPULIMITA, DEL MISMO MUNICIPIO.







VIERNES 04 DE NOVIEMBRE.- SALIDA CON EL ING. VICENTE QUINTERO ARAIZA Y EL ING. FEDERICO ROMO DE LA CNA AL MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES PARA REVISAR AVANCES DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LAS MORAS, MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES, JALISCO.

COMENTARIOS:

SIN COMENTARIOS.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
J. JESUS LOPEZ JIMENEZ	Nº OFICIO: GO / C-0342 / 2016
DEL DÍA: 01/11/2016 AL DÍA: 04/11/2016	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ÉS)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
    	<p>Leticia Gómez Lara Secretaria 01/11/2016</p> <p>José Luis 03/11/2016</p> <p>Miguel Ángel Castillo Delegado Municipal. 04/11/2016.</p> 

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

REPORTE DE AVANCE FISICO DE OBRA


07/11/2016

OBRA: PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE CHAPULIMITA
 CONTRATO.: CEA-ZR-CI-076-2016.
 UBICACIÓN: AHUALULCO DEL MERCADO

OBJETIVO DEL REPORTE:
 CONOCER CONCRETAMENTE EL AVANCE FISICO DE LA OBRA , ANALIZAR LA PROBLEMÁTICA Y ACCIONES QUE SE ESTÉN LLEVANDO A CABO CON LA FINALIDAD DE PROPONER ACCIONES QUE LLEVEN A LA CONCLUSION DE LA OBRA EN TIEMPO Y FORMA, Y SOBRE TODO LA TERMINACION CON CALIDAD EN LA MISMA.

PROGRAMACION

	INICIA	TERMINA	DIAS NATURALES
PROGRAMA DE OBRA	19-sep-16	17-dic-16	90
PROGRAMA DE OBRA DIFERIDO			
PRORROGA			
PROGRAMA DE OBRA REAL	19-sep-16	17-sep-16	90
	FISICO	FINANCIERO	
AVANCE PROGRAMADO %	77.00%	30.00%	
AVANCE REAL %	45.00%	30.00%	
	CONTRATO	ESTIMADO	SALDO
IMPORTE SIN IVA	\$ 2,630,082.69	\$ -	\$ 2,630,082.69
			POR ESTIMAR
			\$ 2,630,082.69

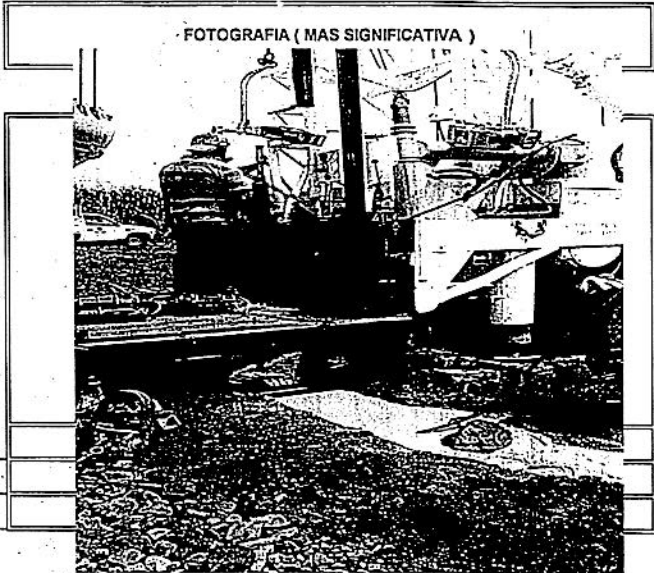

SITUACION ACTUAL DE LA OBRA:
 A LA FECHA SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE PERFORACION EXPLORATORIA EN 12 1/4" DE DIAMETRO.
 SE TIENE PERFORADOS 165 MTS.

PENDIENTES POR ATENDER A LA FECHA:
 INF A EMPRESA CONTRATISTA ALCOR DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. QUE YA RECIBIÓ EL ANTICIPO Y SOLICITARÁ EL DIFERIMIENTO CORRESPONDIENTE.
 PA ACTUALIZACION DE PROGRAMA.

OBSERVACION:

[Handwritten Signature]

ING. JESUS LOPEZ JIMENEZ
 ELABORO REPORTE

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

REPORTE DE AVANCE FISICO DE OBRA

07/11/2016


OBRA: AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE LAS MORAS
 CONTRATO.: CEA-ZR-CI-078-2016
 UBICACIÓN: LAS MORAS, MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES, JALISCO.

OBJETIVO DEL REPORTE:
 CONOCER CONCRETAMENTE EL AVANCE FISICO DE LA OBRA , ANALIZAR LA PROBLEMÁTICA Y ACCIONES QUE SE ESTÉN LLEVANDO A CABO CON LA FINALIDAD DE PROPONER ACCIONES QUE LLEVEN A LA CONCLUSION DE LA OBRA EN TIEMPO Y FORMA, Y SOBRE TODO LA TERMINACION CON CALIDAD EN LA MISMA.

PROGRAMACION

	INICIA	TERMINA	DIAS NATURALES
PROGRAMA DE OBRA	03-oct-16	01-dic-16	60
PROGRAMA DE OBRA DIFERIDO			
PRORROGA			
PRIMA DE OBRA REAL	03-oct-16	01-dic-16	90
	FISICO	FINANCIERO	
AVANCE PROGRAMADO %	44.00%	30.00%	
AVANCE REAL %	40.00%	30.00%	

FOTOGRAFIA (MAS SIGNIFICATIVA)

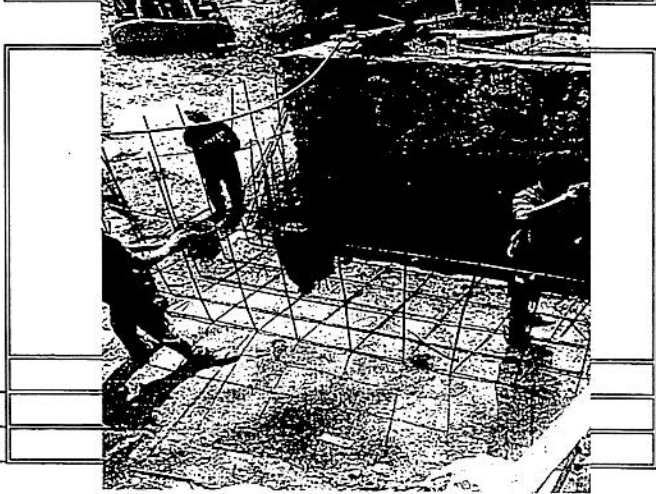

	CONTRATO	ESTIMADO	SALDO	POR ESTIMAR
IMPORTE SIN IVA	\$ 2,630,082.69	\$ -	\$ 2,630,082.69	\$ 2,630,082.69

SITUACION ACTUAL DE LA OBRA:

A LA FECHA SE TRABAJA EN HABILITADO Y ARMADO DE CARCAMO DE CONCRETO
 SE TIENE TERMINADA LA RED DE DISTRIBUCION Y TOMAS DOMICILIARIAS EN ZONA ALTA Y ZONA BAJA.

PENDIENTES POR ATENDER A LA FECHA:

INDICAR LA EMPRESA CONTRATISTA GRUPO CONSTRUCTOR DE LA REGION, S.A. DE C.V. QUE YA RECIBIÓ EL ANTICIPO Y SOLICITARÁ EL DIFERIMIENTO CORRESPONDIENTE.
 SE LICITA A LA EMPRESA CONTRATISTA PRESENTAR A LA BREVEDAD POSIBLE UN PREFINQUITO DE LA OBRA PARA VER LOS ALCANCES DE LA MISMA.

OBSERVACION:

[Handwritten Signature]
 ING. JESUS LOPEZ JIMENEZ
 ELABORO REPORTE

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

REPORTE DE AVANCE FISICO DE OBRA

07/11/2016

OBRA: RED DE DISTRIBUCION SAN MIGUEL- EL ANCON, EL CHILAR Y EL PALOMAR, MPIO. IXTLAHUACAN DEL RIO, JALISCO.

CONTRATO.: CEA-ZR-CI-064-2016

UBICACIÓN: SAN MIGUEL DE ARRIBA, SAN MIGUEL DE ABAJO, EL ANCON, EL CHILAR Y EL PALOMAR.

OBJETIVO DEL REPORTE:

CONOCER CONCRETAMENTE EL AVANCE FISICO DE LA OBRA , ANALIZAR LA PROBLEMÁTICA Y ACCIONES QUE SE ESTÉN LLEVANDO A CABO CON LA FINALIDAD DE PROPONER ACCIONES QUE LLEVEN A LA CONCLUSION DE LA OBRA EN TIEMPO Y FORMA, Y SOBRE TODO LA TERMINACION CON CALIDAD EN LA MISMA.

PROGRAMACION

	INICIA	TERMINA	DIAS NATURALES
PROGRAMA DE OBRA	29-ago-16	26-nov-16	90
PROGRAMA DE OBRA DIFERIDO			
PRORROGA			
FUERA DE OBRA REAL	29-ago-16	26-nov-16	90

	FISICO	FINANCIERO
AVANCE PROGRAMADO %	80.00%	47.00%
AVANCE REAL %	50.00%	47.00%

	CONTRATO	ESTIMADO	SALDO	POR ESTIMAR
IMPORTE SIN IVA	\$ 2,630,082.69	\$ -	\$ 2,630,082.69	\$ 2,630,082.69

FOTOGRAFIA (MAS SIGNIFICATIVA)



SITUACION ACTUAL DE LA OBRA:

A LA FECHA SE TRABAJA EN EL TRAZO, EXCAVACIÓN EN ZANJAS, INSTALACION DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DEL PALOMAR Y EL ANCON
 A LA FECHA SE TIENEN INSTALADOS 4700 M.TUBERÍA DE PVC,HIDRAULICO DE 2" DE DIAMETRO.

PENDIENTES POR ATENDER A LA FECHA:

LA EMPRESA CONTRATISTA PRESENTA SOLICITUD DE DIFERIMIENTO Y PROGRAMA DE OBRA POR ENTREGA TARDIA DE ANTICIPO
 ISENTAR FUERZA DE TRABAJO PARA LA INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS.
 CON ESTA FECHA SE DA INICIO LOS TRABAJOS EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE ABAJO.

OBSERVACION:


 ING. J. JESUS LOPEZ JIMENEZ
 ELABORO REPORTE

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

REPORTE DE AVANCE FISICO DE OBRA

07-NOV.2016


OBRA: AMPLIACION Y REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE BARCENAS, EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO DEL MERCADO, JALISCO.
 CONTRATO: CEA-ZR-CI-062-2016
 UBICACIÓN: SANTA CRUZ DE BARCENAS, MUNICIPIO DE AHUALULCO DEL MERCADO, JALISCO. 61.00

OBJETIVO DEL REPORTE:
 CONOCER CONCRETAMENTE EL AVANCE FISICO DE LA OBRA , ANALIZAR LA PROBLEMÁTICA Y ACCIONES QUE SE ESTÉN LLEVANDO A CABO CON LA FINALIDAD DE PROPONER ACCIONES QUE LLEVEN A LA CONCLUSION DE LA OBRA EN TIEMPO Y FORMA, Y SOBRE TODO LA TERMINACION CON CALIDAD EN LA MISMA.

PROGRAMACION

	INICIA	TERMINA	DIAS NATURALES
PROGRAMA DE OBRA	29-ago-16	26-nov-16	90
PROGRAMA DE OBRA DIFERIDO			
PRORROGA			
PIAMA DE OBRA REAL	29-ago-16	26-nov-16	90
	FISICO	FINANCIERO	
AVANCE PROGRAMADO %	61.00%	44.00%	
AVANCE REAL %	40.00%	19.00%	
	CONTRATO	ESTIMADO	SALDO POR ESTIMAR
IMPORTE SIN IVA	\$ 1,869,945.20	\$ -	\$ 1,869,945.20 \$ 1,869,945.20

FOTOGRAFIA (MAS SIGNIFICATIVA)

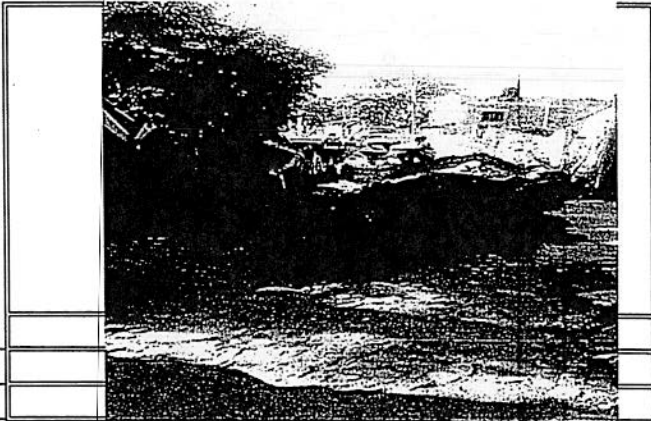

TUACION ACTUAL DE LA OBRA:

SE TRABAJA EN SUSTITUCION DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO POR TUBERIA DE FOGO DE 3" DE DIAMETRO DEL CRUCERO 34 AL CRUCERO 41.
 SEGUNDO FRENTE SE TRABAJA EN SUSTITUCION DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO POR TUBERIA DE FOGO DE 3" DE DIAMETRO DEL CRUCERO 41 AL CRUCERO 48'.

PENDIENTES POR ATENDER A LA FECHA:

INDICA LA EMPRESA CONSTRUCTORA STONE FORCE, S.A. DE C.V. QUE YA RECIBIÓ EL ANTICIPO.
 SI ALTO A LA EMPRESA CONTRATISTA PRESENTAR A LA BREVEDAD POSIBLE UN PREFINIQUITO DE LA OBRA PARA VER LOS ALCANCES DE LA MISMA.

OBSERVACION:

[Handwritten Signature]
 ING. JESUS LOPEZ JIMENEZ
 ELABORÓ REPORTE
