

Fecha Pago Anticipo	17/11/2016
Fecha Elab. Compro.	28/11/2016
N° de Oficio:	GO / C-0361 / 2016 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Nov 28 2016 1:46PM

GERENTE O DIRECTOR:	ERNESTO MARROQUIN ALVAREZ	PUESTO:	DIRECTOR DE APOYO A MUNICIPIOS
COMISIONADO:	HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES	PUESTO:	RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO: HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES - RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA STATUS :Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
22/11/2016	Méxicacán	\$ 75.00	\$ 128.00	\$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	VERIFICACIÓN DE VICIOS OCULTOS			
23/11/2016	Lagos de Moreno	\$ 100.00	\$ 170.00	\$ 100.00	Lagos de Moreno *(330.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	VERIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA			
24/11/2016	Lagos de Moreno	\$ 100.00	\$ 170.00	\$ 100.00	Lagos de Moreno *(330.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	VERIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA			
25/11/2016	Lagos de Moreno	\$ 100.00	\$ 170.00	Cañadas de Obregón \$ 73.00	Lagos de Moreno *(330.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	VERIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA			
26/11/2016	Lagos de Moreno	\$ 100.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	REGRESO A GUADALAJARA			

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**) IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	JN 61349	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	22/11/2016	VIÁTICOS \$:	2,282.00	2,449.00	0.00	\$ -167.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007	
DÍA(S) COMISIÓN:	5	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	270,114.00 Km. / 270,772.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	26/11/2016	PEAJE \$:	800.00	395.00	54.49	\$ 405.00	KM. RECORRIDO	658.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Obras	PROGRAMA:	RURAL 2016 (APARURAL S074 S075) DESARR			ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 1,000 + 0 = 1,000		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO =	370.00		
JUST. VALES EXCE:	SE REQUIEREN PARA LA COMISION						SALDO EN VALES RECORRIDO =	630.00	
						VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00		
						SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00		
						\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 3,082.00 (TRES MIL OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR	CARGO CONTABLE	\$ 2,844.00
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 3,082.00
	SALDO	\$ 238.00

Hugo Gonzalez Magallanes
COMISIONADO
HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES
RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA



AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR GERENTE



(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR GERENTE CAJA

Fecha Pago Anticipo	17/11/2016
Fecha Elab. Compro.	28/11/2016
N° de Oficio:	GO / C-0361 / 2016 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Nov 28 2016 1:46PM

GERENTE O DIRECTOR:	ERNESTO MARROQUIN ALVAREZ	PUESTO:	DIRECTOR DE APOYO A MUNICIPIOS
COMISIONADO:	HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES	PUESTO:	RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO: HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES - RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA STATUS :Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
22/11/2016	MUNICIPIO Mexxicacán \$ 75.00 GD.: (1) 0.00	Mexxicacán \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Mexxicacán \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: VERIFICACIÓN DE VICIOS OCULTOS				
23/11/2016	MUNICIPIO Lagos de Moreno \$ 100.00 GD.: (1) 0.00	Lagos de Moreno \$ 170.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Lagos de Moreno \$ 100.00	Lagos de Moreno *(330.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: VERIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA				
24/11/2016	MUNICIPIO Lagos de Moreno \$ 100.00 GD.: (1) 0.00	Lagos de Moreno \$ 170.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Lagos de Moreno \$ 100.00	Lagos de Moreno *(330.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: VERIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA				
25/11/2016	MUNICIPIO Lagos de Moreno \$ 100.00 GD.: (1) 0.00	Lagos de Moreno \$ 170.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Cañadas de Obregón \$ 73.00	Lagos de Moreno *(330.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: VERIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA				
26/11/2016	MUNICIPIO Lagos de Moreno \$ 100.00 GD.: (1) 0.00	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: REGRESO A GUADALAJARA				

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**) IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	JN 61349	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	22/11/2016	VIÁTICOS \$:	2,282.00	2,449.00	0.00	\$ -167.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007
DÍA(S) COMISIÓN:	5	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	270,114.00 Km. / 270,772.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	26/11/2016	PEAJE \$:	800.00	395.00	54.49	\$ 405.00	KM. RECORRIDO	658.00 Km.
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:	Obras	PROGRAMA:	RURAL 2016 (APARURAL S074 S075) DESARR			ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO	0 + 1,000 + 0 = 1,000	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO -	370.00	
JUST. VALES EXCE:	SE REQUIEREN PARA LA COMISION					SALDO EN VALES RECORRIDO =	630.00	
						VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
						SALDO VALES MANIOBRAS :	0.00	
						\$ VALES A REGRESAR :	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **3,082.00** (TRES MIL OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR	CARGO CONTABLE	\$ 2,844.00
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 3,082.00
	SALDO	\$ 238.00

COMISIONADO: HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES, RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN DIRECTOR GERENTE

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR GERENTE O CAJAL



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES N° OFICIO: GO / C-0361 / 2016

DEL DÍA: 22/11/2016 AL DÍA: 26/11/2016

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

22 Noviembre del 2016.

ACTIVIDADES: SE REALIZO LA VISITA A MEXTICACAN PARA VERIFICAR LOS DETALLES DE QUE SE MARCARON COMO VICIOS OCULTOS DE LOS CONTRATOS N° CEA-ZR-CI-045-2016 CONCERNIENTE Proyecto y Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales con Capacidad de 3 LPS, Incluye: Interconexión, en la Cabecera Municipal de Cañadas de Islas, Municipio de Mexticacan, Jalisco.

Y DEL CONTRATO: CEA-ZR-CI-066-2015. Electrificación, Caseta, Cerco Perimetral, Equipamiento y Línea de Conducción, Tanque y Red de Distribución, Primera Etapa, en la Localidad de Los Charcos, Municipio de Mexticacán, Jalisco.

PARA AMBOS CASOS SE TUVO EL APOYO DEL CONTRATISTA RESPECTIVO Y EL MUNICIPIO DE MEXTICACAN, Y SE REALIZARON MINUTAS DE TRABAJO Y COMPROMISO DE TRABAJO.

23 Y 24 DE NOVIEMBRE DEL 2016.



ACTIVIDADES: SE REALIZA EL RECORRIDO DEL CONTRATO: Contrato: CEA-ZR-LP-073-2016. DE LA OBRA: Construcción de Colectores Sanitarios en las Localidades de Buenavista, el Bajío, Orilla del Agua y Torrecillas, Municipio de Lagos de Moreno, Jalisco, Contrato: CEA-ZR-LP-073-2016. EN CONJUNTO CON EL CONTRATISTA Y EL MUNICIPIO PARA REALIZAR LA ENTREGA DE PARCIALIDADES DE LAS LOCALIDADES DE BUENAVISTA I, TORRECILLAS, EL LINDERO, Y SE HACÉN LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES: HAY POZOS DE VISITA CON DESPLANTE DIFENTES A LOS DE PROYECTOS (QUE VAN DESDE LOS 1.12 A 1.22 MT), POR LO CUAL SE LE INSTRUYE A LA CONTRATISTA REALIZAR LOS CAMBIOS NECESAREOS PARA AJUSTAR LAS ESTIMACIONES, POZOS CON FILTRACIONES DE AGUA, Y ALGUNOS CON REPARACIÓN DE LAS MEDIAS CAÑAS, POR LOQUE SE POSPONE LA ENTREGA DE LA OBRA AL MUNICIPIO HASTA LA PROXIMA SEMANA. Y DE CUAL SE ANEXA COPIA DE LA MINUTA.

25 NOVIEMBRE DEL 2016.

ACTIVIDADES: SE REALIZO LA VISITA A LA OBRA: Sustitución Y Ampliación De La Línea De Conducción Y Red De Agua Potable, En La Localidad De La Cueva, Municipio De Cañadas De Obregón". DEL Contrato: CEA-ZR-CI-055-2016, DONDE SE VERIFICA EL AVANCE DE LA MISMA Y SE REVISAN LOS GENERADORES DE LA ESTIMACIÓN N° 3 Y 4.

COMENTARIOS:





SE HACE LA OBSERVACIÓN QUE EL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2016, SE REPORTO QUE EL VEHICULO CON NUMERO ECONOMICO 055, Y PLACAS JN - 61349 SE DAÑO LA MARCHA, HACIENDO EL REPORTE AL SR. C. CARLOS PEREZ MACIEL. POR LO QUE EL DIA 25 DE NOVIEMBRE NO FUE POSIBLE RETORNARME A GUADALAJARA, POR SER UN HORARIO INAPROPIADO Y EN LAS CONDICIONES QUE SE ENCONTRABA EL VEHICULO, SE TOMO LA DETERMINACIÓN DE REGRESARSE Y PERNOCTAR EN LAGOS DE MORENO, JALISCO

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES N° OFICIO: GO / C-0361 / 2016

DEL DÍA: 22/11/2016 AL DÍA: 25/11/2016

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
  	<p>Leonardo Postillo Duran</p>  <p>Hugo Ríos Hernández</p>



COMISIÓN ESTATAL DE
AGUA
JALISCO

Para que sea válido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando éste ocurra, permanecer en el lugar del mismo y presentar el boleto correspondiente al tramo.
Condiciones generales en: www.redviacorta.mx/servicios/seguro

PLAZA DE COBRO: LA JOYA
TRAMO: GUADALAJARA - ZAPOTLANEJO
FOLIO = 6-0005880920 CARRIL: 6 B

01106200-36066189-4F33A6CD-5F91FCBC

EFFECTIVO
22/11/2016 07:35:13
IMPORTE: \$ 47.41 IVA: 7.59 TOTAL: 55.00

01106200-36066189-4F33A6CD-5F91FCBC



Para que sea válido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando éste ocurra, permanecer en el lugar del mismo y presentar el boleto correspondiente al tramo.
Condiciones generales en: www.redviacorta.mx/servicios/seguro

PLAZA DE COBRO TEPATITLAN
TRAMO: ZAPOTLANEJO - ENT. ARANDAS
FOLIO = 7-0006235449 CARRIL: 6 A

01606100-07867245-469F38DD-1661E8EB

EFFECTIVO
23/11/2016 07:59:14
IMPORTE: \$ 110.34 IVA: 17.66 TOTAL: 128.00

01606100-07867245-469F38DD-1661E8EB



Para que sea válido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando éste ocurra, permanecer en el lugar del mismo y presentar el boleto correspondiente al tramo.
Condiciones generales en: www.redviacorta.mx/servicios/seguro

PLAZA DE COBRO JALOSTOTITLAN
TRAMO: ARANDAS - EL DESPERDICIO
FOLIO = 3-0006475675 CARRIL: 4 A

01704100-07489305-35D2BFE9-834D375D

EFFECTIVO
23/11/2016 08:23:22
IMPORTE: \$ 130.17 IVA: 20.83 TOTAL: 151.00

01704100-07489305-35D2BFE9-834D375D



Para que sea válido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando éste ocurra, permanecer en el lugar del mismo y presentar el boleto correspondiente al tramo.
Condiciones generales en: www.redviacorta.mx/servicios/seguro

ATL/CUHT/DTGAS www.cuhtdtgac.com.mx
E.S. 11502
TRENOGAS S.A. DE C.V.
CIRCUNVALACION AGUSTIN YANEZ 1306
COL. MODERNA
GUADALAJARA, JAL. C.P. 44190
3810-0752

TRE100421EC6
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000115622

Regimen Fiscal
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Lugar de Expedicion
, JALISCO

===== COPIA =====
TICKET #290554

FOLIO : 0004179201
FECHA : 22/11/2016, 18:33 (41792010)
POSICION: 4
TERMINAL: 2

>>>> CREDITO <<<<<<
> PAGO CON TARJETA <
CLIENTE 041900004
Comision estatal del agua de Jalisco
Francia . 1726
Moderna
44190 - Guadalajara, Jalisco.
CEA070225JK4
>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	89.918	LTS	13.98	1257.05

(CLAVE PEMEX 32011)

SUBTOTAL: 1088.23
IVA: 168.82
TOTAL: 1257.05

(un mil doscientos cincuenta y siete pesos
05/100 M.N.)

TARJETA : 19000359
RUTA :
NRO.ECO.:
NRO.PAT.: *
VEHICULO: JN 61349 (Gerencia de Obra)
FORDF-150
ODOMETRO: 270127
RENDIM. : 6.33 Kms/Lts

----- (F I R M A) -----

PLAZA DE COBRO JALOSTOTITLAN
TRAMO: EL DESPERDICIO - JALOSTOTITLAN
FOLIO = 7-0000788011 CARRIL: 7 B

01707200-00824572-AE48FA4D-C8D70637

EFFECTIVO
25/11/2016 12:28:58
IMPORTE: \$ 52.59 IVA: 8.41 TOTAL: 61.00

01707200-00824572-AE48FA4D-C8D70637



Para que sea válido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando éste ocurra, permanecer en el lugar del mismo y presentar el boleto correspondiente al tramo.
Condiciones generales en: www.redviacorta.mx/servicios/seguro

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

4190 Guadalajara, Jalisco, México
(33) 3030-9200 y 01 800 087 9200
caejalisco.gob.mx



COMISIÓN ESTATAL DEL

AGUA
JALISCO

No. _____

por \$ 1140

Recibí de _____

Sr. Hugo Gonzalez

La cantidad de _____

\$ 1140

por concepto de _____

Pago de Habitación de
tres noches

HOTEL Y CENTRO DE NEGOCIOS

VARIA DOLORES PADILLA GUTIERREZ

R.F.C. PAGD 611108 Q99

a 23-24-25 de Noviembre de 2016

Jesus Ramirez N° 74-A Col. El Calv

Tel. 01(474) 746 4567

Expedida en Lagos de Moreno, Jal

ROSN

SEGURIDAD

México

Hugo Gonzalez

[Signature]

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO



Av. Francia No. 1726, Col. Moderna C.P. 44190 Guadalajara, Jalisco, México

Tels. (33) 3030-9200 y 01 800 087 9200

ceajalisco.gob.mx



COMISIÓN ESTATAL DEL

AGUA JALISCO

MINUTA DE TRABAJO No _____

FECHA: 22 NOVIEMBRE 2014.....

OBRA: Proyecto y Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales con Capacidad de 3 LPS, Incluye: Interconexión, en la Cabecera Municipal de Cañadas de Islas, Municipio de Mexxicacan, Jalisco.

CONTRATO: CEA-ZR-CI-045-2015.

EN RELACION A LA NOTA INFORMATIVA DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2014, DONDE SE INCLUYE FOTOGRAFIAS QUE MUESTRAN GRIETAS Y DESPRENDIMIENTO DE LAS LOSAS, EN LAS BANQUETAS, Y EN LOS LECHOS DE SECADO.

POR LO QUE SE LE INSTRUYO A LA CONTRATISTA REALIZAR A LA MAYOR BREVEDAD LOS ARREGLOS PERTINENTES, POR LO QUE SE LE ASIGNARON 10 DIAS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS EN COMENTO,

SE CITA PARA EL 02 DE DICIEMBRE DEL 2014 PARA REVISAR LOS TRABAJOS, A LA EMPRESA CONTRATISTA

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE CIERRA LA PRESENTE MINUTA, FIRMANDO LOS QUE AQUI APARECEN

[Firma]
FIRMA Y NOMBRE

[Firma]
SANDRA CERDA GARCIA
FIRMA Y NOMBRE
GRUPO CONSTRUCTOR DEL
MEDIO AMBIENTE

[Firma]
FIRMA Y NOMBRE
Leonardo Portillo Du
DIRECTOR DE OBRAS
PUBLICAS MUNICIPIO DE
MEXXICACAN.



.....
FIRMA Y NOMBRE

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO





MINUTA DE TRABAJO No 011

FECHA: 22 NOVIEMBRE 2014

OBRA: ELECTRIFICACIÓN, ASETA, CERCO PERIMETRAL, EQUIPAMIENTO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE Y RED DE DISTRIBUCIÓN 1ERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LOS CHAREOS MUNICIPIO DE MEXTICACAN, JALISCO

CONTRATO: CEA-ZR-CI-064-2015

EN REUNION CON PERSONAL DEL MUNICIPIO EL ASEP. LEONARDO PORTILLO EN SU CALIDAD DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, EL CONTRATISTA DE LA EMPRESA KMS CONSTRUCCIONES EL INY. FRANCISCO JAVIER PENILLA GUZALEZ, Y EL RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA EN LA LOCALIDAD DE LOS CHAREOS MUNICIPIO DE MEXTICACAN DONDE SE REVISAN LOS PUNTOS MARCADOS EN LA MINUTA N° 010 DEL 07 DE OCTUBRE 2014, DONDE SE VISUALIZARON LOS SIGUIENTES DETALLES COMO VICIOS OCULTOS.

- o BOTONERA P/ EL PARE Y ARRANQUE DE LA BOMBA.
- o PUERTAS DE INGRESO A LOS CUARTOS DE COORACION Y CUARTO ELECTRICO
- o TENSAR Y REVISAR LA MALLA CICLONICA Y ALAMBRE DE PUAS
- o EN LA CAJA ROMPEDORA DE PRESION TIRA AGUA POR EL JARRO DE AIRE, DEBIDAS LIMPIAR EN LA BASE DE LA CAJA PARA ABATIR LA PUERTA DE LA CAJA.

LA EMPRESA KMS CONSTRUCCIONES COMENTA QUE A LA BREVEDAD TOMARA CARTAS EN EL ASUNTO Y REALIZARA LAS CORRECCIONES NECESARIAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO, ADEMAS SE CALIBRARA LA VALVULA Y EL FLUOTADOR QUE SE ALOJAN EN LA CAJA ROMPEDORA DE PRESION, Y ASI SE ELIMINARA EL DESPERDICIO DE AGUA EN LA LOCALIDAD ANTES MENCIONADA.

SE LE INSTRUYE A LA CONTRATISTA QUE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS ANTERIORES CONTARA CON 10 DIAS HABILES, Y SE CONVOCAR A LOS PRESENTES EL DIA 02 DE DICIEMBRE 2014 PARA REUNION Y VERIFICACION DE LOS TRABAJOS ANTES MENCIONADOS

SE LE RECUERDA AL MUNICIPIO EL MANTENER CON AGUA TANTO EL TANQUE ELEVADO COMO LA CAJA ROMPEDORA DE PRESION.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE CIERRA LA PRESENTE MINUTA, FIRMANDO LOS QUE AQUI APARECEN.

[Firma]
Comisión Estatal
del Agua de Jalisco



[Firma]
KMS
CONSTRUCCIONES



OBRA: CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS
DOMICILIARIAS, SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EL BARRIO MUNICIPIO DE
LAGOS DE MORENO, JALISCO

CONTRATO: CEA-RE-CI-091-2014

SE REALIZO UN RECORRIDO EN COMPANIA DE LA EMPRESA
CONSTRUCTORA WENCES CONSTRUCCIONES SA DE CV, REPRESENTADO
POR EL ING. HECTOR ERNESTO DAVALOS LOPEZ, Y POR EL MUNICIPIO
DE LAGOS DE MORENO, EL C. DOMINGO MARTINEZ RAMOS EN
CALIDAD DE SUPERVISOR DE OBRA, Y POR LA COMISION ESTATAL
DEL AGUA DE JALISCO, EL RESIDENTE DE OBRA EL ING. HUGO E
GONZALEZ MAGALLANES, Y DONDE SE OBSERVA QUE DE
ACUERDO A PROYECTO CONTRA LO LEVANTADO EN CAMPO
HAY ALGO DE SINTOMA, EN RELACION A LOS DRENAJES EN
NIVELES, MAS NO ASI EN DESCARGAS SANITARIAS, YA QUE
CARECEN DE ELLAS, ADEMAS SE VISUALIZA QUE HAY DIFER-
ENTES TIPOS DE MATERIALES, POR NOTIZAR ASI EN LA
CAJUE DE TLAXCALTEAS HAY TUBERIA ADS TUBERIA CORRUGADA
Y DE LAS CUALES NO HAY DESCARGAS CONECTADAS
E INCLUSIVE ESTA LINEA SE ENCUENTRA ABSOLVADA EN
UNOS DE SUS TRAMOS INSTALADOS, POR TAL MOTIVO SE HARA
DEL CONOCIMIENTO AL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS LOS
DUNTOS O AREAS A TRABAJAR Y DEFINIR CON EL CONTRATISTA
DE ACUERDO A SU PROPUESTA DE CANTIDAD.

SE HIZO ENTREGA DEL PLANO EJECUTIVO AL CONTRATISTA
Y AL MUNICIPIO DEL MISMO EN CONFORME,


NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE CIERRA LA
PRESENTE, Y FIRMAN LOS QUE AQUI APARECEN.



Handwritten signature

Hoja 1/3



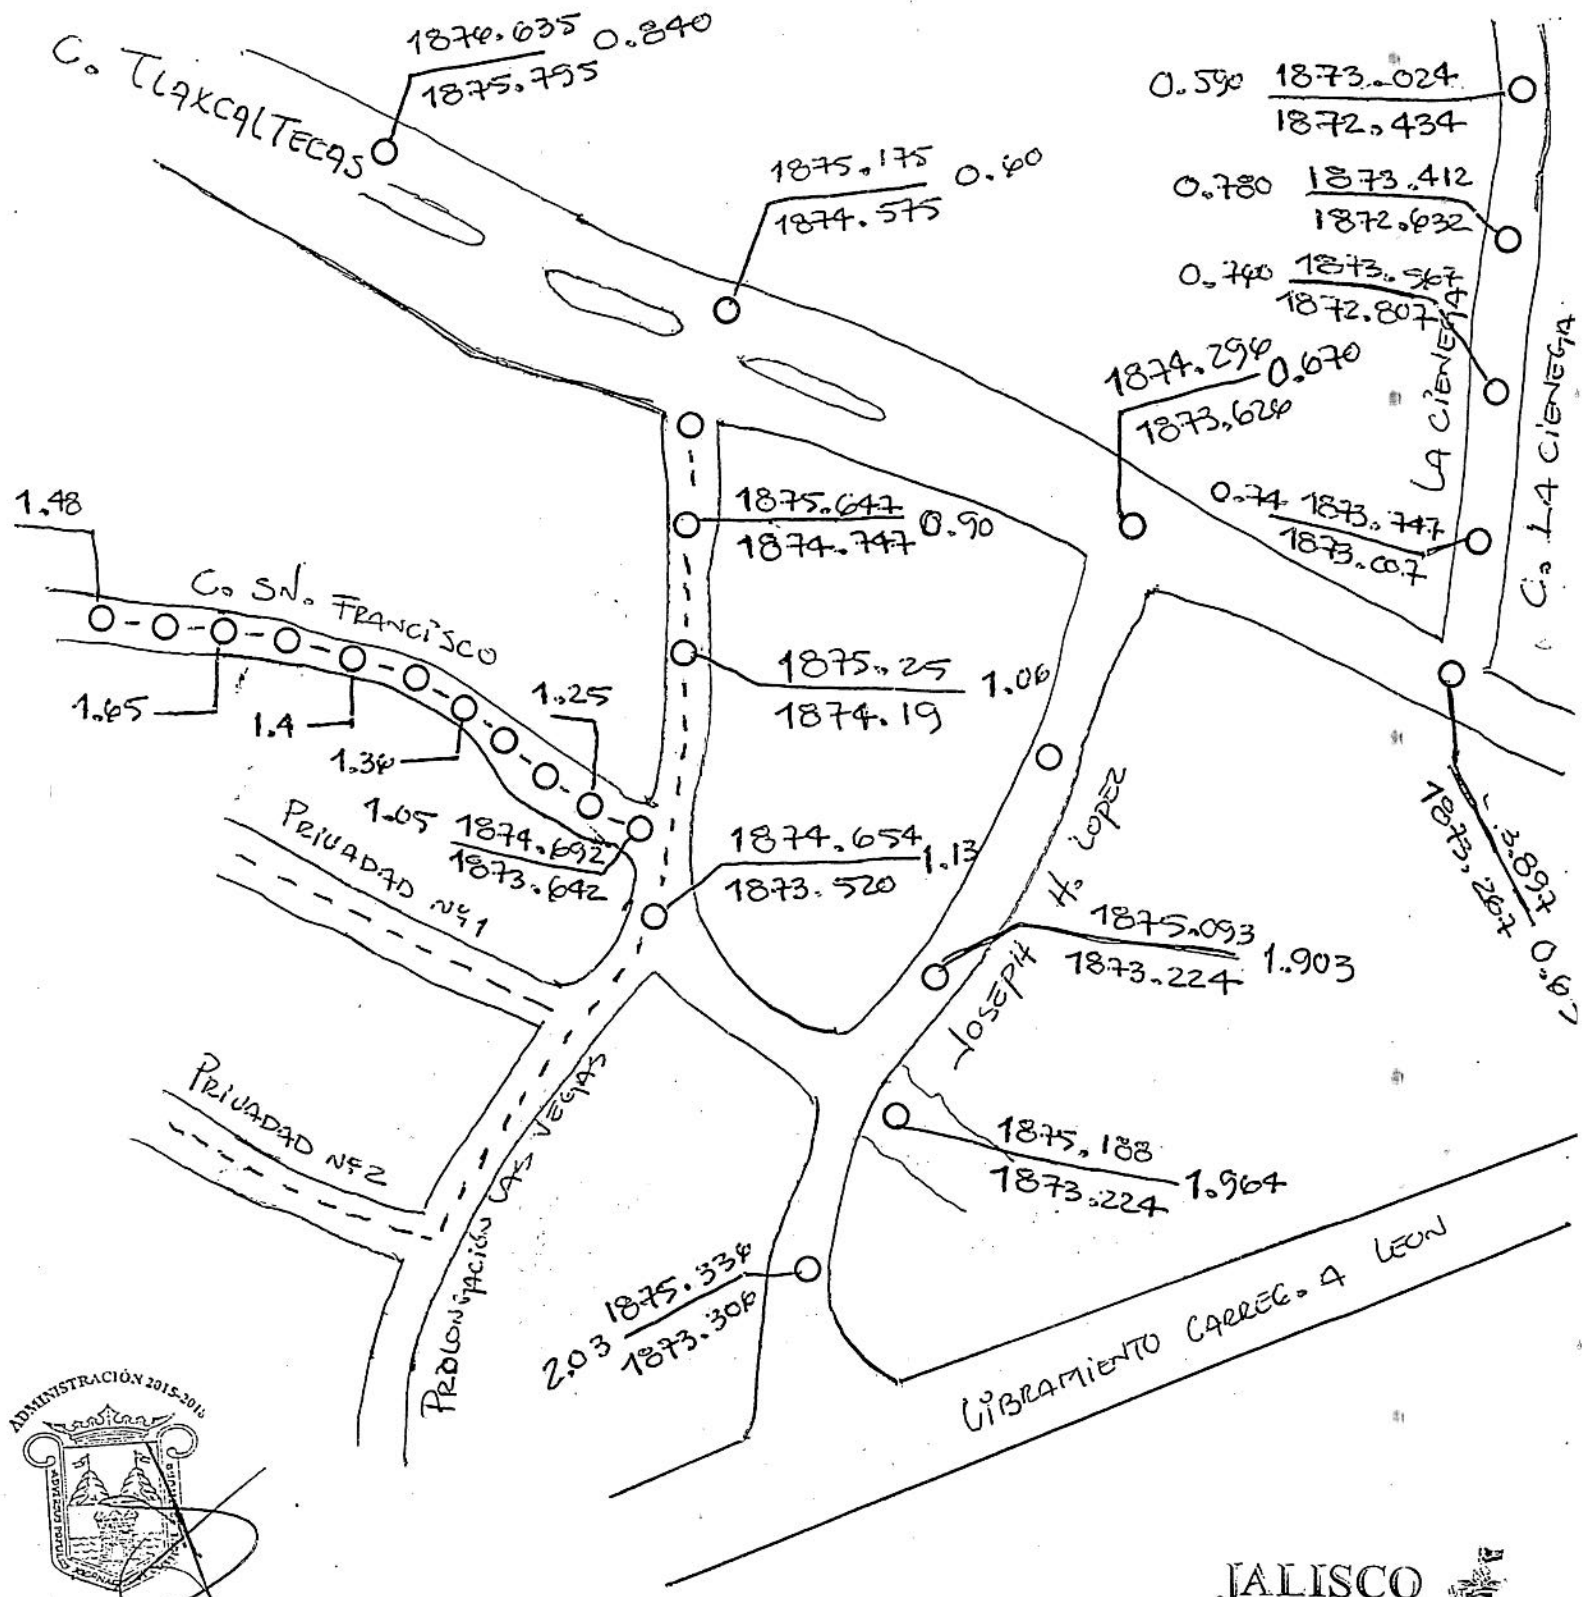


Hoja 2/3 Hkp



Sin otro asunto que tratar se cierra la presente, y firman en ella los que aquí aparecen.

C. OFELIA REYES ESTRELLA.
ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO.
WENCES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Ing. Hugo E. Gonzalez Magallanes.
Residente Supervisor de Obras.
Comisión Estatal del Agua de Jalisco.


DOMINGO MARTÍNEZ RAMOS.
DIRECCIÓN DE RECURSOS HIDRÁULICOS
LAGOS DE MORENO

MINUTA DE TRABAJO No. 009FECHA: 24 NOVIEMBRE 2014

OBRA: Construcción de Colectores Sanitarios en las Localidades de Buenavista, el Bajío, Orilla del Agua y Torrecillas, Municipio de Lagos de Moreno, Jalisco.

Contrato: CEA-ZR-LP-073-2016.


Nº 8, el cual se movió con el paso de los vehículos mismos de la contratista, se anexa foto para su cotejo de la misma. Así mismo se observa que en el pozo Nº 5, contempla una descarga domiciliar, lo cual no está permitido y mucho menos sin la entrega al municipio, por lo cual se le dio la instrucción al residente de obra cancelar dicha descarga y mucho menos instalar descargas no autorizadas por esta supervisión, al igual tendrá que realizar las correcciones pertinentes en cada uno de los pozos indicados por esta supervisión antes de entregarlos al municipio, de igual manera y no menos importante se le solicita a la empresa coordinarse con esta supervisión para realizar las pruebas hidrostáticas a la tubería como lo marca en la minuta realizada y recibida por la empresa.

Continuando con los trabajos en el colector de Torrecillas se tiene listo la excavación del pozo Nº 35 al pozo Nº 33 el cual conecta a los colectores de Orilla del Agua Sur-Norte, a la espera de materiales (tubería, ladrillo, piedra, tepalcates) y realizar los pasos con tubería de acero en los lugares donde se va requerir, previamente con la autorización del Departamento de Proyectos de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, y su solicitud por medio de la plataforma electrónica.

En la red de atarjeas de Torrecillas, los trabajos también ya se encuentran terminados, solo faltando hacer detalles en las medias cañas, y realizar con el Departamento de Generación de Estimaciones de la empresa las modificaciones los arreglos pertinentes en los números de las desplantas de acuerdo a lo revisado en campo.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE CIERRA LA PRESENTE MINUTA Y FIRMAN DE CONOCIMIENTO.


AGUA JALISCO
 GOBIERNO DEL ESTADO





OBRA: Construcción de Colectores Sanitarios en las Localidades de Buenavista, el Bajío, Orilla del Agua y Torrecillas, Municipio de Lagos de Moreno, Jalisco.

Contrato: CEA-ZR-LP-073-2016.

EN RELACION A LA REVISIÓN HECHA EN CAMPO A OBRA PARA REALIZAR LA SIGUIENTE ENTREGA PARCIAL DE LAS LOCALIDADES AL MUNICIPIO (BUENAUISTA I, TORRECILLAS, EL BAJÍO), SE OBSERVA LO SIGUIENTE:

BUENAUISTA I, FALTA LA INSTALACION DE TUBERIA EN UNA DISTANCIA DE 200.00 METROS LINEALES QUE VAN DEL POZO DE INICIO N° 1 AL POZO N° 4, ACTUALMENTE PARA CERRAR ESTE TRAMO QUE COMPRENDE DEL POZO N° 1 AL POZO N° 12, DONDE SE INCORPORA A UN COLECTOR EXISTENTE DE 8" DE DIAMETRO (200 MM), FALTA EL FORJADO DE LOS POZOS DE VISITA N° 12, 11 Y 10, ADENTAS DE ANILETAS Y TAPA DE CONCRETO, CABE MENCIONAR QUE SE ENCUENTRA CON UNA CUADRICULA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS ANTES MENCIONADOS, PERO FALTA MATERIAL Y EQUIPO, A LO CUAL EL SUPERINTENDENTE, CONFIERA QUE PARA EL MARTES 29 DE NOVIEMBRE DE AÑO EN CURSO CENTARA CON MATERIAL NECESARIO, Y SIGUIENDO CON EL RECORRIDO DE BUENAUISTA I, DEL POZO DE VISITA N° 13 AL POZO N° 23 EL CUAL ENTRENCA CON EL COLECTOR DE TORRECILLAS SE REVISAN LOS ACABADOS, LAS MEDIAS CAÑAS, ALTURAS, TAPAS Y ANILETAS, Y SE LE INSTRUYE AL SUPERINTENDENTE DE OBRA REALIZAR DETALLES EN LAS MEDIAS CAÑAS EN LOS POZOS REVISADOS, AL IGUAL PASAR LOS DATOS DE GENERACION DE POZOS A LA PERSONA INDICADA Y HACER LOS CAMBIOS RESPECTIVOS EN CUANTO A LOS DESPLANTES DE LOS POZOS LOS CUALES DEBEN TENER EN DESPLANTE DE FONDO 1.20 MT DE PROYECTO, Y FISICO FLUCTUAN ENTRE LOS 1.12 A 1.18 DE DESPLANTE,

DE LA LOCALIDAD DE TORRECILLAS, YA SE CUENTA ACTUALMENTE CON LA CONEXION AL COLECTOR EXISTENTE DE 8" DE DIAMETRO (200 MM) EN POZO EXISTENTE, MARCADO COMO POZO DE VISITA N° 11 DE PROYECTO Y A LA FECHA YA SE TIENEN FORJADOS LOS POZOS DE VISITA INICIANDO EN EL N° 1 AL POZO N° 34, DE LOS CUALES A LA FECHA SE ENCUENTRAN TERMINADOS, PERO CON EL DETALLE DE LOS DESPLANTES QUE SON VARIABLES Y NO TENER EL 1.20 MT DE PROYECTO, DE IGUAL MANERA SE OBSERVA QUE TIENEN FILTRACIONES DE LOS MANTOS FRACTICOS, PERFILAR LAS MEDIAS CAÑAS, ALGUNOS SE OBSERVAN QUE NO ESTAN RECIBIDOS LAS ANILETAS CON EL POZO DE VISITA, TAL ES EL CASO DEL POZO



Hoja
1/3





COMISIÓN ESTATAL DEL

AGUA
JALISCO

Sin otro asunto que tratar se cierra la presente, y firman en ella los que aquí aparecen.

Hugo E. González

Ing. Hugo-E. González Magallanes
Residente Supervisor de Obras.
Comisión Estatal del Agua de Jalisco.

Co. Jesús González Aguirre
GA Urbanización, S.A. de C.V.
SUPERINTENDENTE DE
OBRAS.

Co. Domingo Martínez Ramos
Municipio de Lagos de Moreno.
SUPERVISOR DE OBRAS



Hoja
3/3

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Av. Francia No. 1726, Col. Moderna C.P. 44190 Guadalajara, Jalisco, México
Tels. (33) 3030-9200 y 01 800 087 9200
ceajalisco.gob.mx

DÍA	MES	AÑO
16	11	2016
N° DE OFICIO		GO / C-0361 / 2016 F

GERENTE O DIRECTOR: ERNESTO MARROQUIN ALVAREZ	PUESTO: DIRECTOR DE APOYO A MUNICIPIOS
COMISIONADO: HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES	PUESTO: RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
ACOMPAÑA A:	PUESTO:
ELABORÓ DOCUMENTO: HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES - RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA	
STATUS: Pendiente Autorización de Anticipo por el Usuario	

DETALLE DE CONCEPTOS Y MONTOS POR DÍA					
FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE
22/11/2016	Mexticacán	\$ 75.00	\$ 128.00	\$ 73.00	\$ 330.00
ACTIVIDAD: VERIFICACION DE VICIOS OCULTOS					
23/11/2016	Lagos de Moreno	\$ 100.00	\$ 170.00	\$ 100.00	\$ 330.00
ACTIVIDAD: SUPERVISION Y VERIFICACION DE OBRA					
24/11/2016	Lagos de Moreno	\$ 100.00	\$ 170.00	\$ 100.00	\$ 330.00
ACTIVIDAD: SUPERVISION Y VERIFICACION DE OBRA					
25/11/2016	Cañadas de Obregón	\$ 75.00	\$ 128.00	\$ 73.00	NA. \$ 0.00
ACTIVIDAD: SUPERVISION Y VERIFICACION DE OBRA					

FECHA SALIDA:	22/11/2016	VIÁTICOS \$:	2,282.00	VEHÍCULO - PLACAS:	JN 61349
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	TIPO:	F-150
DÍA(S) PROBABLES(S):	4	GASOLINA \$:	0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007
FECHA PROB. REGRESO:	25/11/2016	PEAJE \$:	800.00	CILINDRAJE:	6
HORA DE REGRESO:	22:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	KILOMETRAJE INICIAL:	270,114.00
TIPO DE COMISIÓN:	Obras	PROGRAMA:	RURAL 2016 (APARURAL S074 S075) DESARROL	EFFECTIVO EN VALES:	0.00
JUST. VALES EXCE:	SE REQUIEREN PARA LA COMISION			EFE. VALES EXCEDENTE:	1,000
				EFE. VALES MANIOBRA:	0

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: \$ 3,082.00 (TRES MIL OCHENTA Y DOS PESOS 00/100)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN

COMISIONADO HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA	AUTORIZA COMISIÓN DIRECTOR Ó GERENTE
---	---
