

Fecha Pago Anticipo	17/10/2016
Fecha Elab. Compro.	24/10/2016
N° de Oficio:	GO / C-0327 / 2016 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 24 2016 11:20AM

GERENTE O DIRECTOR:	ERNESTO MARROQUIN ALVAREZ	PUESTO:	DIRECTOR DE APOYO A MUNICIPIOS
COMISIONADO:	J. JESUS LOPEZ JIMENEZ	PUESTO:	RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
ACOMPANA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO: J. JESUS LOPEZ JIMENEZ - RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA		STATUS: Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario	

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA					
FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
18/10/2016	Ahualulco de Mercado	\$ 100.00	Ahualulco de Mercado \$ 170.00	Ahualulco de Mercado \$ 100.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	REVISION DE OBRAS CHAPULIMITA Y SANTA CRUZ DE BARCENAS, MPIO. AHUALULCO DEL MERCADO			
19/10/2016	Totatiche	\$ 75.00	Totatiche \$ 128.00	Totatiche \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	PUESTA EN MARCHA POZO AGUA ZARCA, MPIO. TOTATICHÉ.			
20/10/2016	Zacoalco de Torres	\$ 75.00	Zacoalco de Torres \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	VISITA DE OBRA LAS MORAS, MPIO. ZACOALCO DE TORRES.			
21/10/2016	Ixtlahuacán del Río	\$ 75.00	Ixtlahuacán del Río \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	VISITA DE OBRA EL CHILAR Y EL PALOMAR, MPIO. IXTLAHUACAN DEL RIO			

(\*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	JN 61024	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	18/10/2016	VIÁTICOS \$:	822.00	1,052.00	0.00	\$ -230.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007	
DÍA(S) COMISIÓN:	4	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	280,660.00 Km. / 281,362.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	21/10/2016	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	702.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	<b>COMBUSTIBLE EN COMISIÓN</b>		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	RURAL 2016 (APARURAL S074 S075) DESARR				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO -	470.00	
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS :	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR :	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **822.00** (OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR	CARGO CONTABLE	\$ 1,052.00
EMPLEADO	MENOS ANTICIPO	\$ 822.00
	SALDO	\$ -230.00

COMISIONADO  
 J. JESUS LOPEZ JIMENEZ  
 RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
 DIRECTOR O GERENTE

(1) Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.



**INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:**

J. JESUS LOPEZ JIMENEZ N° OFICIO: GO / C-0327 / 2016

DEL DÍA: 18/10/2016 AL DÍA: 21/10/2016

**RESULTADO DE LA COMISIÓN:**

MARTES 18 DE OCTUBRE.- SALIDA A LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE BARCENAS CON PERSONAL DEL AREA DE PROYECTOS, PERSONAL DE MUNICIPIO Y EMPRESA CONTRATISTA PARA DEFINIR DETALLES DEL PROYECYO, SE VISITA PARA PERFORACION DE POZO CHAPULIMITA, MPIO. DE AHUALULCO DEL MERCADO.

MIERCOLES 19 DE OCTUBRE.- SALIDA AL MUNICIPIO DE TOTATICHE, PARA PUESTA EN MARCHA DE POZO AGUA ZARCA, CON AUTORIDADES MUNICIPALES, EMPRESA CONTRATISTA, COMITE SOCIAL Y CONTRALORIA SOCIAL DE LA CEA.

JUEVES 20 DE OCTUBRE.- SALIDA AL MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES, CON ING. VICENTE QUINTERO ARAIZA, PARA REVISION DE OBRA EN LA LOCALIDAD DE LAS MORAS. EN COMPAÑIA DE EMPRESA CONTRATISTA Y DELEGADO MUNICIPAL.

VIERNES 21 DE OCTUBRE.- SALIDA AL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO, EN COMPAÑIA DE ARQ. LUIS FERNANDO HORNER VALENCIA, PARA LA REVISION DE LA OBRA EL CHILAR Y EL PALOMAR, SE REALIZARON PRUEBAS HIDROSTATICAS EN TUBERIA DE PVC HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE EL CHILAR.

**COMENTARIOS:**

SE AMPLIA COMISION HASTA VIERNES 21 DE OCTUBRE 2016.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
J. JESUS LOPEZ JIMENEZ	Nº OFICIO: GO / C-0327 / 2016
DEL DÍA: 18/10/2016 AL DÍA: 20/10/2016	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	<p>Victor Camarena Virgen Delegado Mpa.</p>
	<p>Fidencio Flores</p>
  	<p>Miguel Angel Castillo Ortega Miguel Castillo</p> <p>Victor Manuel Gonzalez G. Director de Obras Publicas Ixtlahuacan del Rio</p>



**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO**  
**DIRECCION DE APOYO A MUNICIPIOS**  
**JEFATURA DE CONTROL DE OBRA**

MINUTA DE TRABAJO N° 01

FECHA: 20/10/2016

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMAS
ING. VICENTE QUINTERO	A. GERENTE OBRAS	
ING. ARMANDO VAZQUEZ	RESIDENTE EMPRESA CONTRATISTA	
ING. J. JESUS LOPEZ J.	RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA	

CON ESTA FECHA SE REALIZO RECORRIDO CON LA EMPRESA CONTRATISTA GRUPO CONSTRUCTOR DE LA REGION, S.A. DE C.V. RELATIVO A LA OBRA: AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE LAS MORAS, MUNICIPIO DE ZA COALCO DE TORRES, JALISCO.

SE UBICO CARCAJO DE BOMBEO, TANQUE DE MAMPONERIA DE 20 M3 Y TOMAS DOMICILIARIAS ZONA BAJA Y ZONA ALTA.

SE ACORDO SACAR LA LINEA DE DISTRIBUCION DE PVC HCO. DE 2" Ø POR LA CALLE, YA QUE LA MISMA SE UBICA EN LOS PREDIOS DE LAS VIVIENDAS EN ZONA ALTA.

SE LE INDICO AL RESIDENTE DE LA OBRA INICIAR EL DESPLANTE DE TANQUE DE MAMPONERIA HASTA QUE SE CUENTE CON EL DOCUMENTO DE DONACION DEL PREDIO SEÑALADO, ASI COMO ATACAR LOS TRABAJOS EN DOS FRENTES YA QUE HA LA FECHA SE TIENE UN ATRAZO DEL 55% DE ACUERDO AL PROGRAMA DE LA OBRA, NO HABIENDO OTRO ASUNTO Q' TRATAR FIRMAN LOS Q' AQUI INTERVINIERON.

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

REPORTE DE AVANCE FISICO DE OBRA

21/10/2016

OBRA: RED DE DISTRIBUCION SAN MIGUEL- EL ANCON, EL CHILAR Y EL PALOMAR, MPIO. IXTLAHUACAN DEL RIO, JALISCO.

TRATO.: CEA-ZR-CI-064-2016

UBICACIÓN: SAN MIGUELDE ARRIBA, SAN MIGUEL DE ABAJO, EL ANCON, EL CHILAR Y EL PALOMAR.

OBJETIVO DEL REPORTE:

CONOCER CONCRETAMENTE EL AVANCE FISICO DE LA OBRA , ANALIZAR LA PROBLEMÁTICA Y ACCIONES QUE SE ESTÉN LLEVANDO A CABO CON LA FINALIDAD DE PROPONER ACCIONES QUE LLEVEN A LA CONCLUSION DE LA OBRA EN TIEMPO Y FORMA, Y SOBRE TODO LA TERMINACION CON CALIDAD EN LA MISMA.

PROGRAMACION

	INICIA	TERMINA	DIAS NATURALES	
PROGRAMA DE OBRA	29-ago-16	26-nov-16	90	
PROGRAMA DE OBRA DIFERIDO				
PRORROGA				
PROGRAMA DE OBRA REAL	29-ago-16	26-nov-16	90	
	FISICO	FINANCIERO		
AVANCE PROGRAMADO %	66.00%	88.00%		
AVANCE REAL %	38.00%	25.00%		
	CONTRATO	ESTIMADO	SALDO	POR ESTIMAR
IMPORTE SIN IVA	\$ 2,630,082.69	\$ -	\$ 2,630,082.69	\$ 2,630,082.69

FOTOGRAFIA ( MAS SIGNIFICATIVA )



SITUACION ACTUAL DE LA OBRA:

A LA FECHA SE TRABAJA EN EL TRAZO, EXCAVACIÓN EN ZANJAS, INSTALACION DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DEL CHILAR Y EL PALOMAR SE TIENE A LA FECHA INSTALADOS 3900 M.TUBERÍA DE PVC,HIDRAULICO DE 2" DE DIAMETRO.

PENDIENTES POR ATENDER A LA FECHA:

LA EMPRESA CONTRATISTA PRESENTA SOLICITUD DE DIFERIMIENTO Y PROGRAMA DE OBRA POR ENTREGA TARDIA DE ANTICIPO

OBSERVACION:

ING. J. JESUS LOPEZ JIMENEZ

ELABORO REPORTE

# COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

## REPORTE DE AVANCE FISICO DE OBRA

FECHA DE REPORTE : 21-OCT. 2016

**OBRA:** AMPLIACION Y REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE BARCENAS, EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO DEL MERCADO, JALISCO.  
**CONTRATO:** CEA-ZR-CI-062-2016  
**UBICACION:** SANTA CRUZ DE BARCENAS, MUNICIPIO DE AHUALULCO DEL MERCADO, JALISCO.

**OBJETIVO DEL REPORTE:**  
 CONOCER CONCRETAMENTE EL AVANCE FISICO DE LA OBRA , ANALIZAR LA PROBLEMÁTICA Y ACCIONES QUE SE ESTÉN LLEVANDO A CABO CON LA FINALIDAD DE PROPONER ACCIONES QUE LLEVEN A LA CONCLUSION DE LA OBRA EN TIEMPO Y FORMA, Y SOBRE TODO LA TERMINACION CON CALIDAD EN LA MISMA.

### PROGRAMACION

	INICIA	TERMINA	DIAS NATURALES
PROGRAMA DE OBRA	29-ago-16	26-nov-16	90
PROGRAMA DE OBRA DIFERIDO			
PRORROGA			
PROGRAMA DE OBRA REAL	29-ago-16	26-nov-16	90
	FISICO	FINANCIERO	
AVANCE PROGRAMADO %	56.00%	56.00%	
AVANCE REAL %	25.00%	19.00%	
	CONTRATO	ESTIMADO	SALDO
IMPORTE SIN IVA	\$ 1,869,945.20	\$ -	\$ 1,869,945.20
			POR ESTIMAR
			\$ 1,869,945.20

### FOTOGRAFIA ( MAS SIGNIFICATIVA )



### SITUACION ACTUAL DE LA OBRA:


FECHA SE TRABAJA EN EL TRAZO Y EXCAVACION EN ZANJAS, SE TIENE LA INSTALACION DE 1600 M.TUBERÍA DE PVC,HIDRAULICO DE 3" DE DIAMETRO Y 2" DE DIAMETRO. 420.0 ML DE EN LOS CRUCEROS 16 A 16.7 A 8,9 A 10 11 A 12 Y 13.

### PENDIENTES POR ATENDER A LA FECHA:

INDICA LA EMPRESA CONSTRUCTORA STONE FORCE, S.A. DE C.V. QUE YA RECIBIÓ EL ANTICIPO.  
 SE SOLICITO A LA EMPRESA CONTRATISTA PRESENTAR A LA BREVEDAD POSIBLE UN PREFINQUITO DE LA OBRA PARA VER LOS ALCANCES DE LA MISMA.  
 ASI COMO LA REPROGRAMACION DE ACUERDO A LA FECHA DE ENTREGA DEL MISMO.

SE SOLICITO POR BITACORA EL DIFERIMIENTO POR ENTREGA TARDIA DE ANTICIPO.

OBSERVACION:

  
 ING. J. JESUS LOPEZ JIMENEZ  
 ELABORO REPORTE

DÍA	MES	AÑO
17	10	2016
N° DE OFICIO		GO / C-0327 / 2016 F


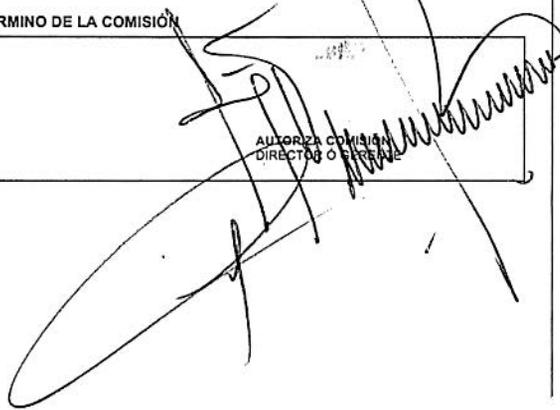
GERENTE O DIRECTOR: ERNESTO MARROQUIN ALVAREZ	PUESTO: DIRECTOR DE APOYO A MUNICIPIOS
COMISIONADO: J. JESUS LOPEZ JIMENEZ	PUESTO: RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
ACOMPAÑA A:	PUESTO:
ELABORÓ DOCUMENTO: J. JESUS LOPEZ JIMENEZ - RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA	
STATUS: Pendiente Autorización de Anticipo por el Usuario	

DETALLE DE CONCEPTOS Y MONTOS POR DÍA					
FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE
18/10/2016	Ahualulco de Mercado	\$ 100.00	Ahualulco de Mercado \$ 170.00	NA. \$ 0.00	NA. \$ 0.00
ACTIVIDAD: REVISION DE PROYECTO SANTA CRUZ DE BARCENAS, MPIO. AHUALULCO DEL MERCADO					
19/10/2016	Totatiche	\$ 75.00	Totatiche \$ 128.00	Totatiche \$ 73.00	NA. \$ 0.00
ACTIVIDAD: PUESTA EN MARCHA POZO AGUA ZARCA, TOTATICHÉ					
20/10/2016	Ixtlahuacán del Río	\$ 75.00	Ixtlahuacán del Río \$ 128.00	Ixtlahuacán del Río \$ 73.00	NA. \$ 0.00
ACTIVIDAD: SUPERVISION DE OBRA EL PALOMAR, MPIO. IXTLAHUACAN DEL RIO, JAL.					

FECHA SALIDA:	18/10/2016	VIÁTICOS \$:	822.00	VEHÍCULO - PLACAS:	JN 61024
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	TIPO:	F-150
DÍA(S) PRÓBABLES(S):	3	GASOLINA \$:	0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007
FECHA PROB. REGRESO:	20/10/2016	PEAJE \$:	0.00	CILINDRAJE:	6
HORA DE REGRESO:	19:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	KILOMETRAJE INICIAL:	280,660.00
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	RURAL 2016 (APARURAL S074 S075) DESARROLLO	EFFECTIVO EN VALES:	0.00
JUST. VALES EXCE:				EFE. VALES EXCEDENTE:	0
				EFE. VALES MANIOBRA:	0

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: \$ 822.00 ( OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 )

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN

 COMISIONADO J. JESUS LOPEZ JIMENEZ RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA	 AUTORIZA COMISIÓN DIRECTOR O EQUIVALENTE
---	--

