

Fecha Pago Anticipo	24/10/2016
Fecha Elab. Compro.	31/10/2016
N° de Oficio:	GO / C-0334 / 2016 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 31 2016 8:59AM

GERENTE O DIRECTOR:	ERNESTO MARROQUIN ALVAREZ	PUESTO:	DIRECTOR DE APOYO A MUNICIPIOS
COMISIONADO:	J. JESUS LOPEZ JIMENEZ	PUESTO:	RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	J. JESUS LOPEZ JIMENEZ - RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA	STATUS:	Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
25/10/2016	MUNICIPIO: Ixtlahuacán del Río \$ 75.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Red el Palomar Ixtlahuacan del Río	Ixtlahuacán del Río \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
26/10/2016	MUNICIPIO: Ixtlahuacán del Río \$ 75.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Reunion con la Contraloria social en el Palomar.	Ixtlahuacán del Río \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Ixtlahuacán del Río \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
27/10/2016	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: supervision de obra en el palomar, el ancon , el chilarr y san miguel de abajo.mpio. Ixtlahuacan del Río	Ixtlahuacán del Río \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Ixtlahuacán del Río \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
28/10/2016	MUNICIPIO: Ahualulco de Mercado \$ 100.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: supervision de obras en Ahualulco del Mercado (chapulimita y santa cruz de bardenas)	Ahualulco de Mercado \$ 170.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA. GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	JN 61024	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	25/10/2016	VIÁTICOS \$:	879.00	950.00	0.00	\$ -71.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007	
DÍA(S) COMISIÓN:	4	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	281,382.00 Km. / 281,748.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	28/10/2016	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	366.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	RURAL 2016 (APARURAL S074 S075) ATENCION			ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO.	0 + 0 + 0 = 0		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO	0.00		
JUST. VALES EXCE:						SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00		
						VALES MANTENIMIENTOS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00		
						SALDO VALES MANTENIMIENTOS:	0.00		
						\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **879.00** (OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MN.)


COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR	CARGO CONTABLE	\$ 950.00
EMPLEADO	MENOS ANTICIPO	\$ 879.00
	SALDO	\$ -71.00

[Signature]
COMISIONADO
J. JESUS LOPEZ JIMENEZ
RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA

[Signature]
AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR O GERENTE

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

J. JESUS LOPEZ JIMENEZ N° OFICIO: GO / C-0334 / 2016

DEL DÍA: 25/10/2016 AL DÍA: 28/10/2016

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

MARTES 25 DE OCTUBRE.- SALIDA AL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO, PARA LA REVISION DE PRUEBAS HIDROSTATICAS EN LA LOCALIDAD DEL PALOMAR.

MIERCOLES 26 DE OCTUBRE.- REUNION A LAS 14:00 HORAS CON EL COMITE Y CONTRALORIA SOCIAL EN LA LOCALIDAD DE EL PALOMAR, MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO.






JUEVES 27 SALIDA AL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO.- PARA REVISION DE NUMEROS GENERADORES DEL PALOMAR Y PRUEBAS HIDROSTATICAS DE TYUBERIAS INSTALADAS EN EL PALOMAR.

VIERNES 29 DE OCTUBRE.- SALIDA AL MUNICIPIO DE AHUALULCO DEL MERCADO.- PARA LA SUPERVISION DE OBRAS PERFORACION DE POZO EN LA LOCALIDAD DE CHAPULIMITA Y LA CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE BARCENAS.

COMENTARIOS:

SIN COMENTARIOS.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
J. JESUS LOPEZ JIMENEZ	Nº OFICIO: GO / C-0334 / 2016
DEL DÍA: 25/10/2016	AL DÍA: 28/10/2016

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
  	 Dir Agua Potable Sergio Gonzalez Orozco  Victor Camarena Virgen Delegado Mpal.

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

REPORTE DE AVANCE FISICO DE OBRA

FECHA DE REPORTE : 31- OCT. 2016

OBRA: AMPLIACION Y REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE BARCENAS, EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO DEL MERCADO, JALISCO.
CONTRATO.: CEA-ZR-CI-062-2016
UBICACION: SANTA CRUZ DE BARCENAS, MUNICIPIO DE AHUALULCO DEL MERCADO, JALISCO.

OBJETIVO DEL REPORTE:
 CONOCER CONCRETAMENTE EL AVANCE FISICO DE LA OBRA , ANALIZAR LA PROBLEMÁTICA Y ACCIONES QUE SE ESTÉN LLEVANDO A CABO CON LA FINALIDAD DE PROPONER ACCIONES QUE LLEVEN A LA CONCLUSION DE LA OBRA EN TIEMPO Y FORMA, Y SOBRE TODO LA TERMINACION CON CALIDAD EN LA MISMA.

PROGRAMACION

	INICIA	TERMINA	DIAS NATURALES
PROGRAMA DE OBRA	29-ago-16	26-nov-16	90
PROGRAMA DE OBRA DIFERIDO			
PORROGA			
PROGRAMA DE OBRA REAL	29-ago-16	26-nov-16	90
	FISICO	FINANCIERO	
AVANCE PROGRAMADO %	22.00%	44.00%	
AVANCE REAL %	35.00%	19.00%	
	CONTRATO	ESTIMADO	SALDO
IMPORTE SIN IVA	\$ 1,869,945.20	\$ -	\$ 1,869,945.20
			POR ESTIMAR
			\$ 1,869,945.20

FOTOGRAFIA (MAS SIGNIFICATIVA)



SITUACION ACTUAL DE LA OBRA:

SE TRABAJA EN SUSTITUCION DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO POR TUBERIA DE FOGO DE 3" DE DIAMETRO DEL CRUCERO 29 AL CRUCERO 41.

PEDIENTES POR ATENDER A LA FECHA:

LA EMPRESA CONSTRUCTORA STONE FORCE, S.A. DE C.V. QUE YA RECIBIÓ EL ANTICIPO.

SE SOLICITO A LA EMPRESA CONTRATISTA PRESENTAR A LA BREVEDAD POSIBLE UN PREFINIQUITO DE LA OBRA PARA VER LOS ALCANCES DE LA MISMA.

ASI COMO LA REPROGRAMACION DE ACUERDO A LA FECHA DE ENTREGA DEL MISMO.

SE SOLICITO POR BITACORA EL DIFERIMIENTO POR ENTREGA TARDIA DE ANTICIPO.

OBSERVACION:


 ING. J. JESUS LOPEZ JIMENEZ
 ELABORO REPORTE

REGISTRO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

REPORTE DE AVANCE FISICO DE OBRA

31/10/2016


OBRA: RED DE DISTRIBUCION SAN MIGUEL- EL ANCON, EL CHILAR Y EL PALOMAR, MPIO. IXTLAHUACAN DEL RIO, JALISCO.
CONTRATO.: CEA-ZR-CI-064-2016
UBICACIÓN: SAN MIGUELDE ARRIBA, SAN MIGUEL DE ABAJO, EL ANCON, EL CHILAR Y EL PALOMAR.

OBJETIVO DEL REPORTE:
 CONOCER CONCRETAMENTE EL AVANCE FISICO DE LA OBRA , ANALIZAR LA PROBLEMÁTICA Y ACCIONES QUE SE ESTÉN LLEVANDO A CABO CON LA FINALIDAD DE PROPONER ACCIONES QUE LLEVEN A LA CONCLUSION DE LA OBRA EN TIEMPO Y FORMA, Y SOBRE TODO LA TERMINACION CON CALIDAD EN LA MISMA.

PROGRAMACION

	INICIA	TERMINA	DIAS NATURALES
PROGRAMA DE OBRA	29-ago-16	26-nov-16	90
PROGRAMA DE OBRA DIFERIDO			
PRORROGA			
PROGRAMA DE OBRA REAL	29-ago-16	26-nov-16	90
	FISICO	FINANCIERO	
AVANCE PROGRAMADO %	80.00%	47.00%	
AVANCE REAL %	45.00%	47.00%	
	CONTRATO	ESTIMADO	SALDO
IMPORTE SIN IVA	\$ 2,630,082.69	\$ -	\$ 2,630,082.69
			POR ESTIMAR
			\$ 2,630,082.69

FOTOGRAFIA (MAS SIGNIFICATIVA)

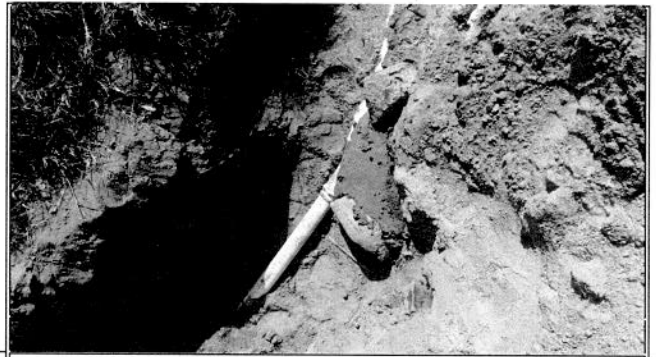

SITUACION ACTUAL DE LA OBRA:

A LA FECHA SE TRABAJA EN EL TRAZO, EXCAVACIÓN EN ZANJAS, INSTALACION DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DEL PALOMAR Y EL ANCON
 A LA FECHA SE TIENEN INSTALADOS 4100 M.TUBERÍA DE PVC,HIDRAULICO DE 2" DE DIAMETRO.

PENDIENTES POR ATENDER A LA FECHA:

LA EMPRESA CONTRATISTA PRESENTA SOLICITUD DE DIFERIMIENTO Y PROGRAMA DE OBRA POR ENTREGA TARDIA DE ANTICIPO
 INCREMENTAR FUERZA DE TRABAJO PARA LA INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS.

OBSERVACION:


 ING. J. JESUS LOPEZ JIMENEZ
 ELABORO REPORTE

000218

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

REPORTE DE AVANCE FISICO DE OBRA

FECHA DE REPORTE : 31-10-2016

OBRA: PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE CHAPULIMITA
CONTRATO.: CEA-ZR-CI-076-2016.
UBICACIÓN: AHUALULCO DEL MERCADO


OBJETIVO DEL REPORTE:

CONOCER CONCRETAMENTE EL AVANCE FISICO DE LA OBRA , ANALIZAR LA PROBLEMÁTICA Y ACCIONES QUE SE ESTÉN LLEVANDO A CABO CON LA FINALIDAD DE PROPONER ACCIONES QUE LLEVEN A LA CONCLUSION DE LA OBRA EN TIEMPO Y FORMA, Y SOBRE TODO LA TERMINACION CON CALIDAD EN LA MISMA.

PROGRAMACION

	INICIA	TERMINA	DIAS NATURALES
PROGRAMA DE OBRA	19-sep-16	17-dic-16	90
PROGRAMA DE OBRA DIFERIDO			
PRORROGA			
PROGRAMA DE OBRA REAL	19-sep-16	17-sep-16	90
	FISICO	FINANCIERO	
AVANCE PROGRAMADO %	77.00%	30.00%	
AVANCE REAL %	40.00%	30.00%	
	CONTRATO	ESTIMADO	SALDO
IMPORTE SIN IVA	\$ 2,630,082.69	\$ -	\$ 2,630,082.69
			POR ESTIMAR
			\$ 2,630,082.69

FOTOGRAFIA (MAS SIGNIFICATIVA)

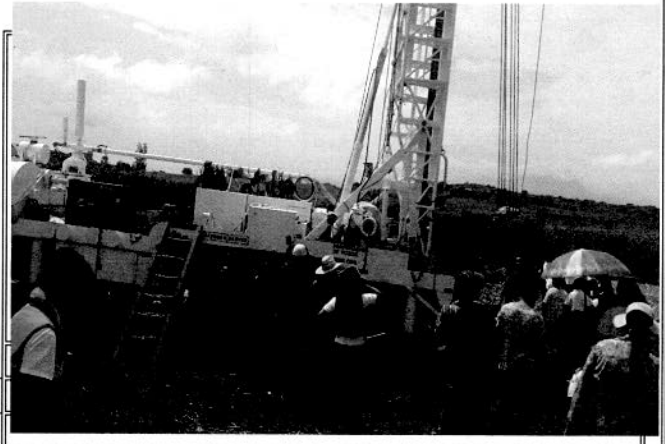

SITUACION ACTUAL DE LA OBRA:

A LA FECHA SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE PERFORACION EXPLORATORIA EN 12 1/4" DE DIAMETRO.

PENDIENTES POR ATENDER A LA FECHA:

LA EMPRESA CONTRATISTA ALCOR DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. QUE YA RECIBIÓ EL ANTICIPO Y SOLICITARÁ EL DIFERIMIENTO CORRESPONDIENTE. PARA SU ACTUALIZACION DE PROGRAMA.

OBSERVACION:

ING. J. JESUS LOPEZ JIMENEZ
ELABORÓ REPORTE

40001

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

REPORTE DE AVANCE FISICO DE OBRA

FECHA DE REPORTE : 31-OCT. 2016

OBRA: PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA, MPIO. TOTATICHE, JALISCO.
CONTRATO.: CEA-ZR-CI-056-2016
UBICACION: AGUA ZARCA, MUNICIPIO DE TOTATICHE, JALISCO.

OBJETIVO DEL REPORTE:

CONOCER CONCRETAMENTE EL AVANCE FISICO DE LA OBRA , ANALIZAR LA PROBLEMÁTICA Y ACCIONES QUE SE ESTÉN LLEVANDO A CABO CON LA FINALIDAD DE PROPONER ACCIONES QUE LLEVEN A LA CONCLUSION DE LA OBRA EN TIEMPO Y FORMA, Y SOBRE TODO LA TERMINACION CON CALIDAD EN LA MISMA.

PROGRAMACION

	INICIA	TERMINA	DIAS NATURALES
PROGRAMA DE OBRA	19-sep-16	17-dic-16	90
PROGRAMA DE OBRA DIFERIDO			
PROROGA			
PROGRAMA DE OBRA REAL	19-sep-16	17-dic-16	90
	FISICO	FINANCIERO	
AVANCE PROGRAMADO %	37.00%	30.00%	
AVANCE REAL %	20.00%	30.00%	
	CONTRATO	ESTIMADO	SALDO
IMPORTE SIN IVA	\$ 2,630,082.69	\$ -	\$ 2,630,082.69
			POR ESTIMAR
			\$ 2,630,082.69

FOTOGRAFIA (MAS SIGNIFICATIVA)




SITUACION ACTUAL DE LA OBRA:

SE CONTINUAN LOS TRABAJOS EN PERFORACION EXPLORATORIA A 12 1/4" DE DIAMETRO CON TUBERIA DE ACERO AL CARBON.

Pendientes por atender a la fecha:

LA EMPRESA CONTRATISTA ALCOR DE OCCIDENTEE, S.A. DE C.V. QUE YA RECIBIÓ EL ANTICIPO Y SOLICITARÁ EL DIFERIMIENTO CORRESPONDIENTE. A ESTA FECHA NO HA PRESENTADO SU REPROGRAMACION DE LOS TRABAJOS, POR ENTREGA TARDIA DE ANTICIPO.

OBSERVACION:


 ING. J. JESUS LOPEZ JIMENEZ
 ELABORO REPORTE

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

REPORTE DE AVANCE FISICO DE OBRA

31/10/2016

OBRA: AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE LAS MORAS

CONTRATO.: CEA-ZR-CI-078-2016

UBICACIÓN: LAS MORAS, MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES, JALISCO.

OBJETIVO DEL REPORTE:

CONOCER CONCRETAMENTE EL AVANCE FISICO DE LA OBRA , ANALIZAR LA PROBLEMÁTICA Y ACCIONES QUE SE ESTÉN LLEVANDO A CABO CON LA FINALIDAD DE PROPONER ACCIONES QUE LLEVEN A LA CONCLUSION DE LA OBRA EN TIEMPO Y FORMA, Y SOBRE TODO LA TERMINACION CON CALIDAD EN LA MISMA.

PROGRAMACION

	INICIA	TERMINA	DIAS NATURALES
PROGRAMA DE OBRA	03-oct-16	01-dic-16	60
PROGRAMA DE OBRA DIFERIDO			

PRORROGA			
----------	--	--	--

F. RAMA DE OBRA REAL	03-oct-16	01-dic-16	90
----------------------	-----------	-----------	----

	FISICO	FINANCIERO
AVANCE PROGRAMADO %	44.00%	30.00%

AVANCE REAL %	10.00%	30.00%
---------------	--------	--------

	CONTRATO	ESTIMADO	SALDO	POR ESTIMAR
IMPORTE SIN IVA	\$ 2,630,082.69	\$ -	\$ 2,630,082.69	\$ 2,630,082.69

FOTOGRAFIA (MAS SIGNIFICATIVA)



SITUACION ACTUAL DE LA OBRA:

A LA FECHA SE TRABAJA EN EL TRAZO Y EXCAVACIÓN EN ZANJAS, PARA INSTALACION DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO DE 2" DE DIAMETRO.

PENDIENTES POR ATENDER A LA FECHA:

INFORMAR A LA EMPRESA CONTRATISTA GRUPO CONSTRUCTOR DE LA REGION, S.A. DE C.V. QUE YA RECIBIÓ EL ANTICIPO Y SOLICITARÁ EL DIFERIMIENTO CORRESPONDIENTE. SE LE SOLICITO A LA EMPRESA CONTRATISTA PRESENTAR A LA BREVEDAD POSIBLE UN PREFINQUITO DE LA OBRA PARA VER LOS ALCANCES DE LA MISMA.

OBSERVACION:

ING. JESUS LOPEZ JIMENEZ
ELABORO REPORTE

00000000

DÍA	MES	AÑO
24	10	2016
N° DE OFICIO		GO / C-0334 / 2016 F

GERENTE O DIRECTOR: ERNESTO MARROQUIN ALVAREZ	PUESTO: DIRECTOR DE APOYO A MUNICIPIOS
COMISIONADO: J. JESUS LOPEZ JIMENEZ	PUESTO: RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
ACOMPAÑA A:	PUESTO:



ELABORÓ DOCUMENTO: J. JESUS LOPEZ JIMENEZ - RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA STATUS :Pendiente Autorización de Anticipo por el Usuario

DETALLE DE CONCEPTOS Y MONTOS POR DÍA					
FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE
25/10/2016	Ixtlahuacán del Río	\$ 75.00	Ixtlahuacán del Río \$ 128.00	NA. \$ 0.00	NA. \$ 0.00
ACTIVIDAD: Red el Palomar Ixtlahuacan del Río					
26/10/2016	Ixtlahuacán del Río	\$ 75.00	Ixtlahuacán del Río \$ 128.00	NA. \$ 0.00	NA. \$ 0.00
ACTIVIDAD: Ixtlahuacan del Río Potabilizadora con Notario Publico.					
27/10/2016	Ahualulco de Mercado	\$ 100.00	Ahualulco de Mercado \$ 170.00	NA. \$ 0.00	NA. \$ 0.00
ACTIVIDAD: Ahualulco del Mercado Capulmilita y Santa Cruz de Barcenas.					
28/10/2016	Zacoalco de Torres	\$ 75.00	Zacoalco de Torres \$ 128.00	NA. \$ 0.00	NA. \$ 0.00
ACTIVIDAD: Las Moras Zacoalco de Torres.					

FECHA SALIDA:	25/10/2016	VIÁTICOS \$:	879.00	VEHÍCULO - PLACAS:	JN 61024
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	TIPO:	F-150
DÍA(S) PROBABLES(S):	4	GASOLINA \$:	0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007
FECHA PROB. REGRESO:	28/10/2016	PEAJE \$:	0.00	CILINDRAJE:	6
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	KILOMETRAJE INICIAL:	281,382.00
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	RURAL 2016 (APARURAL S074 S075) ATENCION \$	EFFECTIVO EN VALES:	0.00
JUST. VALES EXCE:				EFE. VALES EXCEDENTE:	0
				EFE. VALES MANIOBRA:	0

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: \$ 879.00 (OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN

 COMISIONADO J. JESUS LOPEZ JIMENEZ RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA	 AUTORIZA COMISIÓN DIRECTOR O GERENTE
---	---

