

Fecha Pago Anticipo	08/11/2016
Fecha Elab. Compro.	14/11/2016
N° de Oficio:	GO / C-0352 / 2016 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Nov 14 2016 2:22PM

GERENTE O DIRECTOR:	ERNESTO MARROQUIN ALVAREZ	PUESTO:	DIRECTOR DE APOYO A MUNICIPIOS
COMISIONADO:	J. JESUS LOPEZ JIMENEZ	PUESTO:	RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO: J. JESUS LOPEZ JIMENEZ - RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA STATUS: Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
08/11/2016	MUNICIPIO: Ixtlahuacán del Río \$ 75.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: IXTLAHUACAN DEL RIO (CON PERSONAL DEL AREA DE PROYECTOS).EL PALOMAR, EL ANCON, SAN MIGUEL	Ixtlahuacán del Río \$ 128.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
09/11/2016	MUNICIPIO: Totatiche \$ 75.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: TOTATICHÉ (POZO AGUA ZARCA)	Totatiche \$ 128.00 JUS. EXCE. HOSP:	Totatiche \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
10/11/2016	MUNICIPIO: Ahualulco de Mercado \$ 100.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: AHUALULCO DEL MERCADO (CHAPULIMITA Y SANTA CRUZ DE BARCENAS).	Ahualulco de Mercado \$ 170.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
11/11/2016	MUNICIPIO: Zacoalco de Torres \$ 75.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: ZACOALCO DE TORRES (LAS MORAS)	Zacoalco de Torres \$ 128.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)

(\*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*) IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN						VEHÍCULO - PLACAS:	
FECHA SALIDA:	08/11/2016	VIÁTICOS \$:	676.00	952.00	0.00	\$ -276.00	JN 61024 *CON RECARGA
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND: F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.
DÍA(S) COMISIÓN:	4	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO: Ford / 2007
FECHA DE REGRESO:	11/11/2016	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL: 282,078.00 Km. / 282,923.00 Km.
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO: 845.00 Km.
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	RURAL 2016 (APARURAL S074 S075) ATENCIO			COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0
JUST. VALES EXCE:						GASOLINA POR KM RECORRIDO -	770.00
						SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00
						VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00
						SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00
						\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 676.00 ( SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR  
EMPLEADO

CARGO CONTABLE \$ 952.00  
MENOS ANTICIPO \$ 676.00  
SALDO \$ -276.00

COMISIONADO: J. JESUS LOPEZ JIMENEZ  
RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN DIRECTOR O GERENTE

(\*) Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.



**INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:**

J. JESUS LOPEZ JIMENEZ N° OFICIO: GO / C-0352 / 2016

DEL DÍA: 08/11/2016 AL DÍA: 11/11/2016

**RESULTADO DE LA COMISIÓN:**

MARTES 08 DE NOVIEMBRE.- SALIDA AL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO CON PERSONAL DEL AREA DE PROYECTOS PARA VERIFICAR EN CAMPO EL TRAZO DE CRUCE CARRETERO Y EL ANCON, CON LA EMPRESA CONTRATISTA Y PERSONAL DEL MUNICIPIO.


MIÉRCOLES 09 DE NOVIEMBRE.- SALIDA AL MUNICIPIO DE TOTATICHE, PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA DE PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN AGUA ZARCA DEL MISMO MUNICIPIO.

JUEVES 10 DE NOVIEMBRE.- SALIDA AL MUNICIPIO DE AHUALULCO DEL MERCADO, PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA DE SANTA CRUZ DE BARCENAS Y LA PERFORACION DEL POZO PROFUNDO DE CHAPULIMITA.

VIERNES 11 DE NOVIEMBRE.- SALIDA AL MUNICIPIO DE ZACOALCO.- PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA EN LA LOCALIDAD DE LAS MORAS.

**COMENTARIOS:**

SE AMPLIO ESTA COMISION CON UN DIA DE COMO SE TENIA PROGRAMADA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
J. JESUS LOPEZ JIMENEZ	Nº OFICIO: GO / C-0352 / 2016
DEL DÍA: 08/11/2016 AL DÍA: 11/11/2016	

SELLÓ(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	<p><i>[Signature]</i>                  Dirtox Agua potable.                  Sergio Gonzalez Orozco                  08/NOV/2016</p>
	<p>Fidencio Flores Correa  <i>[Signature]</i>                  09/11/2016</p>
	<p><i>[Signature]</i>                  Victor Camarena Virgen                  Delegado Municipal.                  10/NOV/16</p>

MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES, JALISCO  
 AGENCIA MUNICIPAL LAS HORAS

Miguel Castillo  
 Asente Municipal 11/11/16

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

REPORTE DE AVANCE FISICO DE OBRA

14/11/2016

RA: RED DE DISTRIBUCION SAN MIGUEL- EL ANCON, EL CHILAR Y EL PALOMAR, MPIO. IXTLAHUACAN DEL RIO, JALISCO.

CONTRATO.: CEA-ZR-CI-064-2016

UBICACIÓN: SAN MIGUELDE ARRIBA, SAN MIGUEL DE ABAJO, EL ANCON, EL CHILAR Y EL PALOMAR.

OBJETIVO DEL REPORTE:

CONOCER CONCRETAMENTE EL AVANCE FISICO DE LA OBRA , ANALIZAR LA PROBLEMÁTICA Y ACCIONES QUE SE ESTÉN LLEVANDO A CABO CON LA FINALIDAD DE PROPONER ACCIONES QUE LLEVEN A LA CONCLUSION DE LA OBRA EN TIEMPO Y FORMA, Y SOBRE TODO LA TERMINACION CON CALIDAD EN LA MISMA.

PROGRAMACION

	INICIA	TERMINA	DIAS NATURALES
PROGRAMA DE OBRA	29-ago-16	26-nov-16	90
PROGRAMA DE OBRA DIFERIDO			

PRORROGA

--	--	--	--

PROGRAMA DE OBRA REAL

29-ago-16	26-nov-16	90
-----------	-----------	----

FISICO FINANCIERO

AVANCE PROGRAMADO % 80.00% 47.00%

AVANCE REAL % 55.00% 47.00%

	CONTRATO	ESTIMADO	SALDO	POR ESTIMAR
IMPORTE SIN IVA	\$ 2,630,082.69	\$ -	\$ 2,630,082.69	\$ 2,630,082.69

FOTOGRAFIA ( MAS SIGNIFICATIVA )



SITUACION ACTUAL DE LA OBRA:

A LA FECHA SE TRABAJA EN EL TRAZO, EXCAVACIÓN EN ZANJAS, INSTALACION DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DEL PALOMAR, EL ANCON Y SAN MIGUEL DE ABAJO, A LA FECHA SE TIENEN INSTALADOS 6100 M.TUBERÍA DE PVC,HIDRAULICO DE 2" DE DIAMETRO.

PENDIENTES POR ATENDER A LA FECHA:

LA EMPRESA CONTRATISTA PRESENTA SOLICITUD DE DIFERIMIENTO Y PROGRAMA DE OBRA POR ENTREGA TARDIA DE ANTICIPO

INCREMENTAR FUERZA DE TRABAJO PARA LA INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS.

CON ESTA FECHA SE DA INICIO LOS TRABAJOS EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE ABAJO.

OBSERVACION:

ING. J. JESUS LOPEZ JIMENEZ  
ELABORO REPORTE

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

REPORTE DE AVANCE FISICO DE OBRA

FECHA DE REPORTE : 31-OCT. 2016

OBRA: PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA, MPIO. TOTATICHE, JALISCO.  
 CONTRATO.: CEA-ZR-CI-056-2016  
 UBICACIÓN: AGUA ZARCA, MUNICIPIO DE TOTATICHE, JALISCO.


OBJETIVO DEL REPORTE:

CONOCER CONCRETAMENTE EL AVANCE FISICO DE LA OBRA , ANALIZAR LA PROBLEMÁTICA Y ACCIONES QUE SE ESTÉN LLEVANDO A CABO CON LA FINALIDAD DE PROPONER ACCIONES QUE LLEVEN A LA CONCLUSION DE LA OBRA EN TIEMPO Y FORMA, Y SOBRE TODO LA TERMINACION CON CALIDAD EN LA MISMA.

PROGRAMACION

	INICIA	TERMINA	DIAS NATURALES
PROGRAMA DE OBRA	19-sep-16	17-dic-16	90
PROGRAMA DE OBRA DIFERIDO			
PRORROGA			
PROGRAMA DE OBRA REAL	19-sep-16	17-dic-16	90
	FISICO	FINANCIERO	
AVANCE PROGRAMADO %	50.00%	30.00%	
AVANCE REAL %	50.00%	30.00%	
	CONTRATO	ESTIMADO	SALDO
IMPORTE SIN IVA	\$ 2,630,082.69	\$ -	\$ 2,630,082.69
			POR ESTIMAR
			\$ 2,630,082.69

FOTOGRAFIA ( MAS SIGNIFICATIVA )

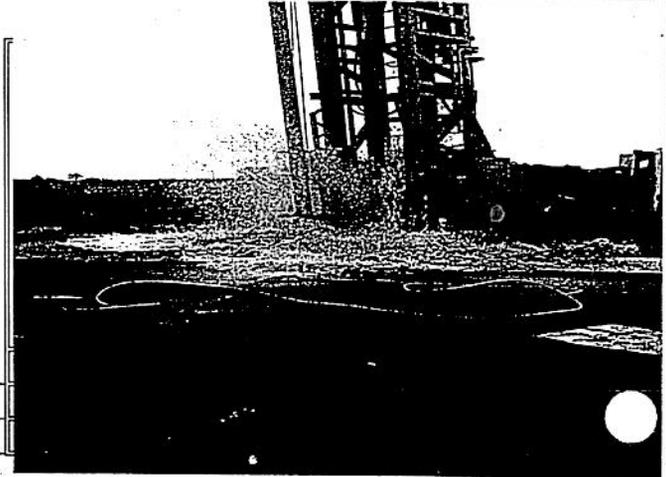


SITUACION ACTUAL DE LA OBRA:

SE TERMINA LA PERFORACION EXPLORATORIA A 250.0 MTS. PROGRAMANDO EL REGISTRO ELECTRICO PARA EL MIERCOLES 16 DE NOVIEMBRE DE 2016.

PENDIENTES POR ATENDER A LA FECHA:

INDICA LA EMPRESA CONTRATISTA ALCOR DE OCCIDENTEE, S.A. DE C.V. QUE YA RECIBIÓ EL ANTICIPO Y SOLICITARÁ EL DIFERIMIENTO CORRESPONDIENTE. A ESTA FECHA NO HA PRESENTADO SU REPROGRAMACION DE LOS TRABAJOS, POR ENTREGA TARDIA DE ANTICIPO.

OBSERVACION:

  
 ING. J JESUS LOPEZ JIMENEZ  
 ELABORO REPORTE

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

REPORTE DE AVANCE FISICO DE OBRA

14/11/2016

OBRA: AMPLIACION Y REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE BARCENAS, EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO DEL MERCADO, JALISCO.  
 CONTRATO.: CEA-ZR-CI-062-2016  
 LOCALIZACIÓN: SANTA CRUZ DE BARCENAS, MUNICIPIO DE AHUALULCO DEL MERCADO, JALISCO.

OBJETIVO DEL REPORTE:  
 CONOCER CONCRETAMENTE EL AVANCE FISICO DE LA OBRA , ANALIZAR LA PROBLEMÁTICA Y ACCIONES QUE SE ESTÉN LLEVANDO A CABO CON LA FINALIDAD DE PROPONER ACCIONES QUE LLEVEN A LA CONCLUSION DE LA OBRA EN TIEMPO Y FORMA, Y SOBRE TODO LA TERMINACION CON CALIDAD EN LA MISMA.

PROGRAMACION

	INICIA	TERMINA	DÍAS NATURALES	
PROGRAMA DE OBRA	29-ago-16	26-nov-16	90	
PROGRAMA DE OBRA DIFERIDO				
PRORROGA				
PROGRAMA DE OBRA REAL	29-ago-16	26-nov-16	90	
	FISICO	FINANCIERO		
AVANCE PROGRAMADO %	30.00%	44.00%		
AVANCE REAL %	44.00%	19.00%		
	CONTRATO	ESTIMADO	SALDO	POR ESTIMAR
IMPORTE SIN IVA	\$ 1,869,945.20	\$ -	\$ 1,869,945.20	\$ 1,869,945.20

FOTOGRAFIA ( MAS SIGNIFICATIVA )



SITUACION ACTUAL DE LA OBRA:

TRABAJA EN EXCAVACION , PLANTILLA E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC DE 2" DE DIAMETRO DEL CRUCERO 50A AL CRUCERO 64.

PENDIENTES POR ATENDER A LA FECHA:

INDICA LA EMPRESA CONSTRUCTORA STONE FORCE, S.A. DE C.V. QUE YA RECIBIÓ EL ANTICIPO. PARA QUE PRESENTE EL DIFERIMIENTO CORRESPONDIENTE Y SU REPROGRAMACION.

SE SOLICITO POR BITACORA EL DIFERIMIENTO POR ENTREGA TARDIA DE ANTICIPO. NO HAN PRESENTADO SOLICITUD DE DIFERIMIENTO POR ENTREGA TARDIA DE ANTICIPO.

OBSERVACION:

ING. J. JESUS LOPEZ JIMENEZ  
 ELABORO REPORTE

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

REPORTE DE AVANCE FISICO DE OBRA

07/11/2016

OBRA: PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE CHAPULIMITA

CONTRATO.: CEA-ZR-CI-076-2016.  
 LOCALIZACIÓN: AHUALULCO DEL MERCADO

OBJETIVO DEL REPORTE:


CONOCER CONCRETAMENTE EL AVANCE FISICO DE LA OBRA , ANALIZAR LA PROBLEMÁTICA Y ACCIONES QUE SE ESTÉN LLEVANDO A CABO CON LA FINALIDAD DE PROPONER ACCIONES QUE LLEVEN A LA CONCLUSION DE LA OBRA EN TIEMPO Y FORMA, Y SOBRE TODO LA TERMINACION CON CALIDAD EN LA MISMA.

PROGRAMACION

	INICIA	TERMINA	DIAS NATURALES
PROGRAMA DE OBRA	19-sep-16	17-dic-16	90
PROGRAMA DE OBRA DIFERIDO			
PRORROGA			
PROGRAMA DE OBRA REAL	19-sep-16	17-sep-16	90
	FISICO	FINANCIERO	
AVANCE PROGRAMADO %	77.00%	30.00%	
AVANCE REAL %	45.00%	30.00%	

	CONTRATO	ESTIMADO	SALDO	POR ESTIMAR
IMPORTE SIN IVA	\$ 2,630,082.69	\$ -	\$ 2,630,082.69	\$ 2,630,082.69

FOTOGRAFIA ( MAS SIGNIFICATIVA )

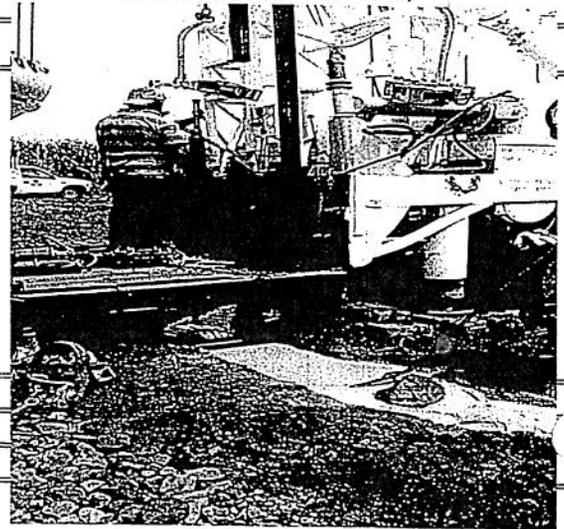

SITUACION ACTUAL DE LA OBRA:

TERMINO LA PERFORACION EXPLORATORIA A LOS 250.0 MTS. SE TIENE PROGRAMADA LA CORRIDA ELECTRICA PARA PROXIMO 15 DE NOVIEMBRE DE 2016.

PENDIENTES POR ATENDER A LA FECHA:

INDICA LA EMPRESA CONTRATISTA ALCOR DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. QUE YA RECIBIÓ EL ANTICIPO Y SOLICITARÁ EL DIFERIMIENTO CORRESPONDIENTE. PARA SU ACTUALIZACION DE PROGRAMA.

NO HAN SOLICITADO EL DIFERIMIENTO POR ENTREGA TARDIA DE ANTICIPO.

OBSERVACION:

  
 ING. J. JESUS LOPEZ JIMENEZ  
 ELABORO REPORTE

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

REPORTE DE AVANCE FISICO DE OBRA

14/11/2016


OBRA: AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE LAS MORAS  
 CRATO.: CEA-ZR-CI-078-2016  
 UBICACION: LAS MORAS, MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES, JALISCO.

OBJETIVO DEL REPORTE:  
 CONOCER CONCRETAMENTE EL AVANCE FISICO DE LA OBRA , ANALIZAR LA PROBLEMÁTICA Y ACCIONES QUE SE ESTÉN LLEVANDO A CABO CON LA FINALIDAD DE PROPONER ACCIONES QUE LLEVEN A LA CONCLUSION DE LA OBRA EN TIEMPO Y FORMA, Y SOBRE TODO LA TERMINACION CON CALIDAD EN LA MISMA.

PROGRAMACION

	INICIA	TERMINA	DIAS NATURALES
PROGRAMA DE OBRA	03-oct-16	01-dic-16	60
PROGRAMA DE OBRA DIFERIDO			
PRORROGA			
PROGRAMA DE OBRA REAL	03-oct-16	01-dic-16	90
	FISICO	FINANCIERO	
AVANCE PROGRAMADO %	44.00%	30.00%	
AVANCE REAL %	44.00%	30.00%	
	CONTRATO	ESTIMADO	SALDO
IMPORTE SIN IVA	\$ 2,630,082.69	\$ -	\$ 2,630,082.69
			POR ESTIMAR
			\$ 2,630,082.69

FOTOGRAFIA ( MAS SIGNIFICATIVA )

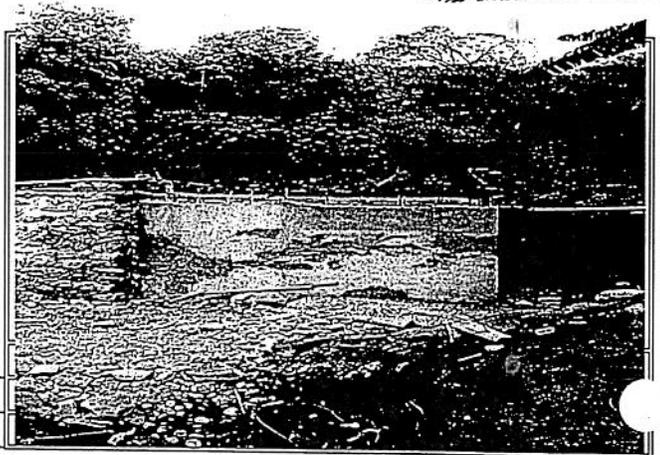

SITUACION ACTUAL DE LA OBRA:

SE TIENE COLADO EL CARCAMO DE BOMBEO Y REGISTROS DE VALVULAS EXPULSORAS DE AIRE Y DESFOGUE EN ZONA BAJA.  
 SE TIENE TERMINADA LA RED DE DISTRIBUCION Y TOMAS DOMICILIARIAS EN ZONA ALTA Y ZONA BAJA.

PENDIENTES POR ATENDER A LA FECHA:

INDICA LA EMPRESA CONTRATISTA GRUPO CONSTRUCTOR DE LA REGION, S.A. DE C.V. QUE YA RECIBIÓ EL ANTICIPO Y SOLICITARÁ EL DIFERIMIENTO CORRESPONDIENTE.  
 SE LE SOLICITO A LA EMPRESA CONTRATISTA PRESENTAR A LA BREVEDAD POSIBLE UN PREFINIQUITO DE LA OBRA PARA VER LOS ALCANCES DE LA MISMA.  
 A LA FECHA NO HAN PRESENTADO SOLICITUD DE DIFERIMIENTO POR ENTREGA TARDIA DE ANTICIPO.

OBSERVACION:

JESUS LOPEZ JIMENEZ  
 ELABORO REPORTE
