

CARLOS MANUEL PELAYO CERVERA

RFC Emisor : PECC921214N63

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle Vicente Guerrero No. Exterior 72 Colonia Centro Localidad Jocotepec
Municipio Jocotepec Estado Jalisco Mexico CP. 45800

Sucursal- :

RFC Receptor : MJJ850101KP8

MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO

Calle Palacio Municipal No. Exterior S/N Colonia Centro Municipio Jocotepec
Estado Jalisco Mexico CP. 45800

Folio Fiscal:

B178C373-F4EA-466E-955F-960C9608A1BC

No de Serie del CSD:

00001000000402088692

Lugar, Fecha y hora de emisión:

Jocotepec 2016-12-26T14:42:20

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

Régimen Fiscal:

Regimen de Incorporacion Fiscal

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	N/A	002	PAGO 2DA. ESTIMACION FINIQUITO DE OBRA DENOMINADA "REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLES MORELOS Y 20 DE NOVIEMBRE, CON REPOSICION DE EMPEDRADO" RETENCION 5 AL MILLAR PARA LA CONTRALORIA \$674.08 MONTO PARA EFECTO DE PAGO: \$155,713.37	134816.77	134816.77

Motivo del Descuento:

Moneda:

Tipo de cambio:

Forma de Pago: En una sola exhibicion

Método de Pago: No identificado

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago: Se anexa estimacion

Subtotal: \$ 134816.77

Impuestos Traslados

IVA 15.00% \$ 21570.68

TOTAL \$ 156387.45





gob.mx

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen

Verificar CFDI



RFC del Emisor	Nombre o Razón Social del Emisor	RFC del Receptor	Nombre o Razón Social del Receptor
PECC921214N63	CARLOS MANUEL PELAYO CERVERA	MJJ850101KP8	MUNICIPIO DE JOCOTEPEC IALISCO
Folio Fiscal	Fecha de Expedición	Fecha Certificación SAT	PAC que Certificó
B178C373-F4EA-466E-955F-960C9608A1BC	2016-12-26T14:42:20	2016-12-26T14:45:15	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del Comprobante	Estado CFDI	
\$156,387.45	Ingreso	Vigente	

Imprimir



CARATULA DE ESTIMACIÓN
RESUMEN DE LOS CONCEPTOS E IMPORTES QUE CONSTITUYEN LA ESTIMACIÓN



ESTIMACIÓN (100%) FINIQUITO

CONTRATISTA		OBRA	
NOMBRE:	CARLOS MANUEL PELAYO CERVERA	NOMBRE:	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLES MORELOS Y 20 DE NOVIEMBRE, CON REPOSICION DE EMPEDRADO.
DOMICILIO:	VICENTE GUERRERO #72 OTE	LOCALIDAD:	ZAPOTTAN DE HIDALGO
COLONIA:	CENTRO	CONTRATO:	GMJ 004C OP/2016
TELEFONO:	33 3128 5922	PERIODO CONTRATADO:	DEL 15 DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016
PERIODO DE ESTIMACIÓN:	29 DE AGOSTO AL 28 DE NOVIEMBRE 2016	PERIODO DE PRORROGA:	SIN PRORROGA
		PROGRAMA:	RAMO 33
		FECHA DE ESTIMACIÓN:	29 DE NOVIEMBRE 2016
			ANTICIPO

PRESUPUESTO	AVANCE FINANCIERO	IMPORTES DE ESTIMACIÓN
PRESUPUESTO (SIN IVA): \$ 298,849.83	PRESUPUESTO: 100.00%	MONTO DE ESTIMACIÓN: \$ 134,816.77
AMPLIACIÓN PRESUPUESTO:	AMPLIACIÓN PRESUPUESTO: 0.00%	RETENCIÓN 5 AL MILLAR: \$ 674.08
ACUMULADO ANTERIOR: \$ 164,033.06	ACUMULADO ANTERIOR: 54.80%	I.V.A. (16%): \$ 21,570.68
ESTA ESTIMACIÓN: \$ 134,816.77	ESTA ESTIMACIÓN: 45.20%	IMPORTE DE ESTIMACIÓN: \$ 156,387.45
ACUMULADO: \$ 298,849.83	ACUMULADO: 100.00%	AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: \$ -
POR EJERCER: \$ -	POR EJERCER: 0.00%	TOTAL A PAGAR: \$ 156,387.45
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO	AVANCE FÍSICO	
ANTICIPO: \$ -	OBRA: 100.00%	
ACUMULADO ANTERIOR: \$ -	ACUMULADO ANTERIOR: 54.80%	
ESTA ESTIMACIÓN: \$ -	ESTA ESTIMACIÓN: 45.20%	
ACUMULADO: \$ -	ACUMULADO: 100.00%	
POR EJERCER: \$ -	POR EJERCER: 0.00%	

NO SE ENCUENTRAN DATOS EN ANTICIPO YA QUE NO HUBO

AUTORIZO	AUTORIZO	CONTRATISTA
SUPERVISOR	DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	CONTRATISTA
LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUIN	ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO	LIC. CARLOS MANUEL PELAYO CERVERA

DESGLASE DE ESTIMACION

PROYECTO: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLES MORELOS Y 20 DE NOVIEMBRE, CON REPOSICION DE EMPEDRADO.
LOCALIDAD: ZAPOTTAN DE HIDALGO
CONTRATISTA: CARLOS MANUEL PELAYO CERVERA
No. DE CTO: GMJ 004C OP/2016
ESTIMACION: 2 (DOS) FINIQUITO
PERIODO DE EJECUCION: DEL 22 AL 29 DE AGOSTO DE 2016



No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	ACOMULADO ANTERIOR		ESTA ESTIMACION		IMPORTE
				ESTIMADA	POR ESTIMAR	CANTIDAD	P.U.	
DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES								
01	EXCAVACION DE ZANJA DE HASTA 2.00M DE PROFUNDIDAD POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO "B"	M3	193.21	193.21	-	-	\$ 27.27	\$ -
02	AFINE DE FONDO DE ZANJA EN EXCAVACIONES HECHAS A MAQUINA INCLUYE EXTRAER EL MATERIAL FUERA DE LA ZANJA	M2	137.77	137.77	-	-	\$ 7.23	\$ -
03	ACARRIO DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES EN CAMION DE VOLTEO DE 6M3 A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 1.00 KM FUERA DE LA OBRA.	M3	251.17	251.17	-	-	\$ 62.35	\$ -
CONFORMACION DE BASES Y SUB BASES								
04	TRAZO Y NIVELACION DE SUPERFICIE UTILIZANDO EQUIPO TOPOGRAFICO Y DEJANDO BANCOS DE NIVEL PARA CHECAR NIVELES DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA	M2	469.30	469.30	-	-	\$ 7.57	\$ -
05	PLANTILLA DE 10CM ESPESOR PROMEDIO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR, INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION	M2	137.77	137.77	-	-	\$ 36.62	\$ -
06	ACOSTILLADO DE TUBERIA DE 20 CM DE ESPESOR MINIMO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR, INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION	ML	196.81	196.81	-	-	\$ 63.24	\$ -
07	RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MAXIMO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR, INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION	M3	151.88	151.88	-	-	\$ 325.12	\$ -
INSTALACION DE TUBERIA								
08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE DE PVC DE 3" DE DIAMETRO INCLUYE HERRAMIENTA MATERIALES Y MANO DE OBRA	ML	196.81	196.81	-	-	\$ 92.60	\$ -
09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 3" INC. HERRAMIENTA MATERIALES Y MANO DE OBRA	PIEZA	4.00	4.00	-	-	\$ 3,019.15	\$ -
10	CONSTRUCCION DE CALA DE VALVULAS TIPO 5 DE 130 X 90X97 CM (MEDIDAS INTERIORES) INC. HERRAMIENTA MATERIALES Y MANO DE OBRA	PIEZA	4.00	4.00	-	-	\$ 3,216.72	\$ -
11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MARCO Y TAPA DE FcFo PARA CALA DE VALVULAS INC. HERRAMIENTA MATERIALES Y MANO DE OBRA	PIEZA	4.00	4.00	-	-	\$ 2,164.60	\$ -
12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOMA DOMICILIARIA DE 1/2" DE DIAMETRO INCLUYE HERRAMIENTA MATERIALES Y MANO DE OBRA	PIEZA	22.00	22.00	-	-	\$ 552.31	\$ -

DESGLÓSE DE ESTIMACION



PROYECTO: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLES MORELOS Y 20 DE NOVIEMBRE, CON REPOSICION DE EMPEDRADO.
LOCALIDAD: ZAPOTTITAN DE HIDALGO
CONTRATISTA: CARLOS MANUEL PELAYO CERVERERA
No. DE CTO: GMJ 004C OP/2016
ESTIMACION: 2 (DOS) FINIQUITO
PERIODO DE EJECUCION: DEL 22 AL 29 DE AGOSTO DE 2016



No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	ACOMULADO ANTERIOR		ESTA ESTIMACION		IMPORTE
				ESTIMADA	POR ESTIMAR	CANTIDAD	P.U.	
REPOSICION DE EMPEDRADO								
13	RETIRO DE EMPEDRADO EXISTENTE UTILIZANDO RETROEXCAVADORA Y DEPOSITANDOLA MANUALMENTE EN AMBOS LADOS PARA SU POSTERIOR UTILIZACION! INCLUYE MAQUINARIA Y MANO DE OBRA	M2	469.30	469.30	-	-	\$ 10.44	\$ -
14	COMPACTACION DE SUPERFICIE POR MEDIOS MECANICOS COMPACTADO AL 90% PROCTOR. INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION	M2	469.30	-	469.30	469.30	\$ 10.42	\$ 4,890.64
15	FORMACION DE BASE HIDRAULICA DE 20 CM DE ESPESOR CON MATERIALES PETREOS DE 3/4" A FINOS COMPACTADO AL 95% PROCTOR. INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION	M2	469.30	-	469.30	469.30	\$ 82.13	\$ 38,542.69
16	REEMPEDRADO C/PIEDRA BRAZA Y MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO PROP 1:4 INCLUYE MATERIALES HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCION	M2	469.30	-	469.30	469.30	\$ 194.72	\$ 91,383.44
COMPLEMENTARIOS								
17	LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA	M2	469.00	-	469.00	-	\$ 5.98	\$ -
				TOTAL ESTIMADO		\$		134,816.77

SUPERVISOR LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUIN	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO	CONTRATISTA LIC. CARLOS MANUEL PELAYO CERVERERA
--	--	--

CARLOS MANUEL PELAYO CERVERA



NUMEROS GENERADORES

OBRA REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 16 CONTRATO N° 2 (DOS) FINQUITO
 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLES MORELOS Y 20 DE NOVIEMBRE, CON REPOSICION DE EMPEDRADO.

LOCALIDAD ZAPOTTAN DE HIDALGO PERIODO DEL 22 AL 29 DE AGOSTO DE 2016
 MUNICIPIO JOCOTEPEC, JALISCO

CVE	CONCEPTO	LOCALIZACION	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	ABUNDAMIENTO	VOLUMEN	UNTD.	TOTAL
DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES										
01	EXCAVACION DE ZANJA DE HASTA 2.00M DE PROFUNDIDAD POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO 'B'	ENTRE RED PPAL MORELOS Y 20 DE NOVIEMBRE TOMAS	196.8100	0.7000	1.0000	0.00		0.00	M3	0.00
02	AFINE DE FONDO DE ZANJA EN EXCAVACIONES HECHAS A MAQUINA INCLUYE EXTRAER EL MATERIAL FUERA DE LA ZANJA	ENTRE MORELOS Y 20 DE NOVIEMBRE	196.8100	0.7000	1.0000	0.00		0.00	M2	0.00
03	ACABRERO DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES EN CAMION DE VOLTEO DE 6M3 A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 100 KM FUERA DE LA OBRA.	ENTRE RED PPAL MORELOS Y 20 DE NOVIEMBRE TOMAS	196.8100	0.7000	1.0000	0.00	1.3	0.00	M3	0.00
CONFORMACION DE BASES Y SUB BASES										
04	TRAZO Y NIVELACION DE SUPERFICIE UTILIZANDO EQUIPO TOPOGRAFICO Y DEJANDO BANCOS DE NIVEL PARA CHEGAR NIVELES DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA	ENTRE MORELOS Y 20 DE NOVIEMBRE	323.6550	1.4500	0.0000	0.00		0.00	M2	0.00
05	PLANTILLA DE 10CM ESPESOR PROMEDIO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR. INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION	ENTRE MORELOS Y 20 DE NOVIEMBRE	196.8100	0.7000	1.0000	0.00		0.00	M2	0.00
06	ACOSTILLADO DE TUBERIA DE 20CM DE ESPESOR MINIMO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR. INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION	ENTRE MORELOS Y 20 DE NOVIEMBRE	196.8100	1.0000	1.0000	0.00		0.00	ML	0.00

SUPERVISOR LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUIN	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO
CONTRATISTA LIC. CARLOS MANUEL PELAYO CERVERA	

CARLOS MANUEL PELAYO CERVERA



NUMEROS GENERADORES

OBRA: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 16 CONTRATO N°: 2 (DOS) FINIQUITO
 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLES MORELOS Y 20 DE NOVIEMBRE, CON REPOSICION DE EMPEDRADO.
 LOCALIDAD: ZAPOTITAN DE HIDALGO PERIODO: DEL 22 AL 29 DE AGOSTO DE 2016
 MUNICIPIO: JOCOOTEPEC, JALISCO

CVE.	CONCEPTO	LOCALIZACION	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	ABUNDAMIENTO	VOLUMEN	UNTD.	TOTAL
07	RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MAXIMO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVIZION	ENTRE XOCHITL Y PLAYAS DE LA LAGUNA TOMAS	196.8100	0.7000	0.7000	0.00		0.00	M3	0.00

INSTALACION DE TUBERIA

08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE DE PVC DE 3" DE DIAMETRO INCLUYE HERRAMIENTAS MATERIALES Y MANO DE OBRA	ENTRE XOCHITL Y PLAYAS DE LA LAGUNA	196.8100	1.0000	1.0000	0.00		0.00	ML	0.00
09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUESTA DE 3" INC. HERRAMIENTAS MATERIALES Y MANO DE OBRA	ENTRE XOCHITL Y PLAYAS DE LA LAGUNA	1.0000	1.0000	1.0000	0.00		0.00	PZA	0.00
10	CONSTRUCCION DE CAYA DE VALVULAS TIPO 5 DE 130 X 90X97 CM (MEDIDAS INTERIORES) INC. HERRAMIENTAS MATERIALES Y MANO DE OBRA	ENTRE XOCHITL Y PLAYAS DE LA LAGUNA	1.0000	1.0000	1.0000	0.00		0.00	PZA	0.00
11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MARCO Y TAPA DE FIERRO PARA CAYA DE VALVULAS INC. HERRAMIENTAS MATERIALES Y MANO DE OBRA	ENTRE XOCHITL Y PLAYAS DE LA LAGUNA	1.0000	1.0000	1.0000	0.00		0.00	PZA	0.00

SUPERVISOR LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUIN	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO	CONTRATISTA LIC. CARLOS MANUEL PELAYO CERVERA
--	--	--



CARLOS MANUEL PELAYO CERVERA

NUMEROS GENERADORES

2 (DOS) FINQUITO

OBRA: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 16
 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLES MORELOS Y 20 DE NOVIEMBRE, CON REPOSICION DE EMPEDRADO.
 LOCALIDAD: ZAPOTITAN DE HIDALGO
 MUNICIPIO: JOCOOTEPEC, JALISCO
 CONTRATO N°:
 PERIODO: DEL 22 AL 29 DE AGOSTO DE 2016

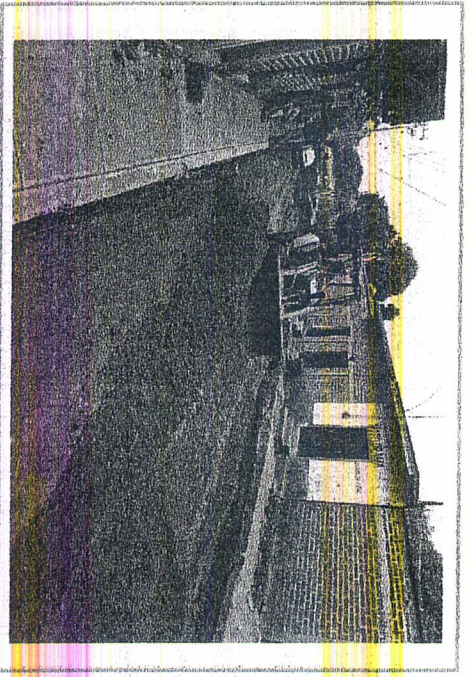
CVE.	CONCEPTO	LOCALIZACION	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	ABUNDAMIENTO	VOLUMEN	UNID.	TOTAL
12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOMA DOMICILIARIA DE 1/2" DE DIAMETRO INCLUYE HERRAMIENTAS MATERIALES Y MANO DE OBRA	ENTRE MORELOS Y 20 DE NOVIEMBRE	1.0000	1.0000	1.0000	0.00		0.00	PZA	0.00
REPOSICION DE EMPEDRADO										
13	RETIRIO DE EMPEDRADO EXISTENTE UTILIZANDO RETROEXCAVADORA Y DEPOSITANDOLA MANUALMENTE EN AMBOS LADOS PARA SU POSTERIOR UTILIZACION. INCLUYE MAQUINARIA Y MANO DE OBRA	ENTRE MORELOS Y 20 DE NOVIEMBRE	0.0000	0.0000	0.0000	0.00		0.00	M2	0.00
14	COMPACTACION DE SUPERFICIE POR MEDIOS MECANICOS COMPACTADO AL 90% PROCTOR. INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION	ENTRE MORELOS Y 20 DE NOVIEMBRE	73.33	6.40	0.0000	1.00		469.30	M2	469.30
15	FORMACION DE BASE HIDRAULICA DE 20 CM DE ESPESOR CON MATERIALES PETREOS DE 3/4" A FINOS COMPACTADO AL 95% PROCTOR. INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION	ENTRE MORELOS Y 20 DE NOVIEMBRE	73.33	6.40	0.0000	1.00		469.30	M2	469.30
16	REEMPEDRADO C/PIEDRA BRAZA Y MORTERO CEMENTO-ARENA DE RTO PROP 1:4 INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCION	ENTRE MORELOS Y 20 DE NOVIEMBRE	73.33	6.40	0.0000	1.00		469.30	M2	469.30
COMPLEMENTARIOS										
17	LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA	ENTRE MORELOS Y 20 DE NOVIEMBRE	0.0000	0.0000	0.0000	0.00		0.00	M2	0.00

<p>SUPERVISOR</p>  LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUIN	<p>DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS</p>  ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO
<p>CONTRATISTA</p>  LIC. CARLOS MANUEL PELAYO CERVERA	

ARCHIVO FOTOGRÁFICO DE OBRA






OBRA	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLES MORELOS Y 20 DE NOVIEMBRE, CON REPOSICION DE EMPEDRADO.		
HUMERO	GMJ 004C OP/2016		
PROGRAMA	RAMO 33		
CONTRATISTA	CARLOS MANUEL PELAYO CERVERA	ESTIMACION	2 (DOS) FINIQUITO
FECHA	29 DE NOVIEMBRE 2016		



COMPACTACION DE SUPERFICIE POR MEDIOS MECANICOS COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION

FORMACION DE BASE HIDRAULICA DE 20 CM DE ESPESOR CON MATERIALES PETREOS DE 3/4" A FINOS COMPACTADO AL 95% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION

REVISOR	SUPERVISOR DE OBRA	CONTRATISTA	CONTRATISTA
			
	L.C. SALVADOR CONTRERAS OLGUIN		L.C. CARLOS MANUEL PELAYO CERVERA

01/12/2016
