

CARLOS MANUEL PELAYO CERVERA

RFC Emisor : PECC921214N63

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle Vicente Guerrero No. Exterior 72 Colonia Centro Localidad Jocotepec
Municipio Jocotepec Estado Jalisco Mexico CP. 45800

Sucursal- :

RFC Receptor : MJJ850101KP8

MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO

Calle Palacio Municipal No. Exterior S/N Colonia Centro Municipio Jocotepec
Estado Jalisco Mexico CP. 45800

Folio Fiscal:

CE7690BB-955D-4216-BF44-8C8C7041BDC0

No de Serie del CSD:

00001000000402088692

Lugar, Fecha y hora de emisión:

Jocotepec 2016-10-24T12:53:36

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

Régimen Fiscal:

Regimen de Incorporacion Fiscal

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	N/A	003	PAGO 3RA. ESTIMACION FINIQUITO DE OBRA DENOMINADA "REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLES MORELOS Y 20 DE NOVIEMBRE, CON REPOSICION DE EMPEDRADO" RETENCION 5 AL MILLAR PARA LA CONTRALORIA \$800.14 MONTO PARA EFECTO DE PAGO: \$184,832.56.	160028.19	160028.19

Motivo del Descuento:

Moneda:

Tipo de cambio:

Forma de Pago: En una sola exhibición

Método de Pago: No identificado

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Subtotal: \$ 160028.19

Impuestos
Trasladados

IVA 16.00% \$ 25604.51

TOTAL \$ 185632.70



**DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS**

CARLOS MANUEL PELAYO CERVERA

RFC Emisor : PECC921214N63

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle Vicente Guerrero No. Exterior 72 Colonia Centro Localidad Jocotepec
Municipio Jocotepec Estado Jalisco Mexico CP. 45800

Sucursal - :

RFC Receptor : MJJ850101KP8

MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO

Calle Palacio Municipal No. Exterior S/N Colonia Centro Municipio Jocotepec
Estado Jalisco Mexico CP. 45800

Folio Fiscal:

CE7690BB-955D-4216-BF44-8C8C7041BDC0

No de Serie del CSD:

00001000000402088692

Lugar, Fecha y hora de emisión:

Jocotepec 2016-10-24T12:53:36

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

Régimen Fiscal:

Regimen de Incorporacion Fiscal

Total con letra:

CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS, 70/100 MN

Sello digital del CFDI:

E57vCJ9IHmtpPpFRN5u.16xNhiOyih7rSqFKs2lz
+PgAZsLjCoGexcfjGAWF0rD9Pwib2YvqNz3epxxzCWHpfsnRsiBahtyuJJuTE26kGKHkMwMw9Uq1LPd782Gax84GNW1gZJ6SbcPK0eG1ODCyC7Pedipl6p6a7QBhvGDydWSueL/IR6
MRkab2Ke4Ny2SM0I44yK8m176llr+C+UrdzkUhfV57KH7hLJdezPTyFu
+i7obOnggGdQI6RkNPcY1rqu/nwNOAZJ1ZQebeZRvwQ0W09MGyQuzdL109GV50I2ohiCkpJ5ZZ6wq15BzGyW6W0nu3ik7I6kWbaulg==

Sello del SAT:

laicLLRseW3M5KBBYdTL0Ujybyq0L7jpl3lEFrvj16x/HBrVkJUPKMVYbxeX7LyaCvHysHI6lhmIDPYY3kcQM0dzkeD
+YRllvlda65d0Z99guyvOIEZYw7zBQRtugrSMI7JW1kxW0rT6GfUwPgzz7wDSxaTjCQkKNBCXmh60z1Y8bLz5RjyDZkoZPE8xzGZre3zvjNzTTFm1H3ROLcnDd9IGx/OFxn9tzoRzy2O
DCY3atVwJB9tozIEGDheMzwOuDwyZ172EMkd46ZBIaNDN+C8D1cQfJISmW01R0q9EJoiZY9W51O6kORn4bdzfpafQMjKQhEgUqaiVPx2IO==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|CE7690BB-955D-4216-BF44-8C8C7041BDC0|2016-10-24T12:56:10|E57vCJ9IHmtpPpFRN5u.16xNhiOyih7rSqFKs2lz
+PgAZsLjCoGexcfjGAWF0rD9Pwib2YvqNz3epxxzCWHpfsnRsiBahtyuJJuTE26kGKHkMwMw9Uq1LPd782Gax84GNW1gZJ6SbcPK0eG1ODCy
C7Pedipl6p6a7QBhvGDydWSueL/IR6MRkab2Ke4Ny2SM0I44yK8m176llr+C+UrdzkUhfV57KH7hLJdezPTyFu
+i7obOnggGdQI6RkNPcY1rqu/nwNOAZJ1ZQebeZRvwQ0W09MGyQuzdL109GV50I2ohiCkpJ5ZZ6wq15BzGyW6W0nu3ik7I6kWbaulg=|
00001000000403258748||



No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000403258748

Fecha y hora de certificación:

2016-10-24T12:56:10



CARATULA DE ESTIMACION
RESUMEN DE LOS CONCEPTOS E IMPORTES QUE CONSTITUYEN LA ESTIMACION
C. REMEDIACION
INGENIERIA

NOMBRE: CARLOS MANUEL PELAYO CERVERA
 NOMBRE: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE 14 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLES MORELOS Y 29 DE NOVIEMBRE, CON REPOSICION DE EMPEDRADO.

DOMICILIO: VICENTE GUERRERO #22 OTE
 COLONIA: CENTRO
 TELEFONO: 33 3128 5922
 LOCALIDAD: ZAPOTITAN DE HIDALGO
 CONTRATO: GMJ 005C OP/2015
 PERIODO CONTRATADO: GMJ 005C OP/2015
 PERIODO DE PROROGA: SIN PROROGA
 RAMO 33 2015

PERIODO DE ESTIMACION: 07 DE AL 15 DE OCTUBRE
 FECHA DE ESTIMACION: 17 DE OCTUBRE DE 2015

PRESUPUESTO (SIN IVA)	\$	353,679.35	PRESUPUESTO	100.00%	MONTO DE ESTIMACION:	\$	160,029.19
AMPLIACION PRESUPUESTO			AMPLIACION PRESUPUESTO	0.00%			
ACUMULADO ANTERIOR	\$	193,651.16	ACUMULADO ANTERIOR	54.63%	RETENCION 5 AL MILLAR:	\$	800.14
ESTA ESTIMACION	\$	160,029.19	ESTA ESTIMACION	45.37%			
ACUMULADO	\$	353,679.35	ACUMULADO	100.00%	I.V.A. (16%):	\$	25,604.51
FOR EJERCER	\$	0.00	FOR EJERCER	0.00%			

ANTICIPO	\$		OBRA	100.00%	IMPORTE DE ESTIMACION:	\$	184,832.56
ACUMULADO ANTERIOR	\$		ACUMULADO ANTERIOR	54.63%	ANORTIZACION DE ANTICIPO:	\$	
ESTA ESTIMACION	\$		ESTA ESTIMACION	45.37%			
ACUMULADO	\$		ACUMULADO	100.00%	TOTAL A PAGAR:	\$	185,632.70
FOR EJERCER	\$		FOR EJERCER	0.00%			

NO SE ENCUENTRAN DATOS EN ANTICIPO YA QUE NO HUBO

SUPERVISOR:  LIC. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS: 
 CONTRAYENTA:  LIC. CARLOS MANUEL PELAYO CERVERA



CARATULA DE ESTIMACIÓN
RESUMEN DE LOS CONCEPTOS E IMPORTES QUE CONSTITUYEN LA ESTIMACIÓN



CONTRATISTA		OBRA	
NOMBRE:	CARLOS MANUEL PELAYO CERVERA	NOMBRE:	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLES MORELOS Y 20 DE NOVIEMBRE, CON REPOSICION DE EMPEDRADO.
DOMICILIO:	VICENTE GUERRERO #72 OTE	LOCALIDAD:	ZAPOTTITAN DE HIDALGO
COLONIA:	CENTRO	CONTRATO:	GMJ 005C OP/2016
TELÉFONO:	33 3128 5922	PERIODO CONTRATADO:	GMJ 005C OP/2016
PERIODO DE ESTIMACIÓN:	07 DE AL 15 DE OCTUBRE	PERIODO DE PRORROGA:	SIN PRORROGA
		FECHA DE ESTIMACIÓN:	17 DE OCTUBRE DE 2016
			ANTICIPO: \$
			RAMO 33-2016

PREPUESTO	AVANCE FINANCIERO	IMPORTE DE ESTIMACIÓN
PRESUPUESTO (SIN IVA): \$ 353,679.35	PRESUPUESTO: 100.00%	MONTO DE ESTIMACIÓN: \$ 160,028.19
AMPLIACIÓN PRESUPUESTO:	AMPLIACIÓN PRESUPUESTO: 0.00%	RETENCIÓN 5 AL MILLAR: \$ 800.14
ACUMULADO ANTERIOR: \$ 193,651.16	ACUMULADO ANTERIOR: 54.63%	I.V.A. (16%): \$ 25,604.51
ESTA ESTIMACIÓN: \$ 160,028.19	ESTA ESTIMACIÓN: 45.37%	IMPORTE DE ESTIMACIÓN: \$ 184,832.56
ACUMULADO: \$ 353,679.35	ACUMULADO: 100.00%	AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: \$ -
POR EJERCER: \$ 0.00	POR EJERCER: 0.00%	TOTAL A PAGAR: \$ 185,632.70
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO		
ANTICIPO: \$ -	OBRA: 100.00%	
ACUMULADO ANTERIOR: \$ -	ACUMULADO ANTERIOR: 54.63%	
ESTA ESTIMACIÓN: \$ -	ESTA ESTIMACIÓN: 45.37%	
ACUMULADO: \$ -	ACUMULADO: 100.00%	
POR EJERCER: \$ -	POR EJERCER: 0.00%	

NO SE ENCUENTRAN DATOS EN ANTICIPO YA QUE NO HUBO

SUPERVISOR	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATISTA
LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUIN	ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO	LIC. CARLOS MANUEL PELAYO CERVERA



10 de octubre
2015-2016

DESGLASE DE ESTIMACION

PROYECTO: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLES MORELOS Y 20 DE NOVIEMBRE, CON REPOSICION DE EMPEDRADO.
LOCALIDAD: ZAPOTTAN DE HIDALGO
CONTRATISTA: CARLOS MANUEL PELAYO CERVERA
No. DE CTO: GMJ 005C OP/2016
ESTIMACION: 3 (TRES) FINIQUITO
PERIODO DE EJECUCION: DEL 7 AL 15 DE OCTUBRE



No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	ACOMULADO ANTERIOR		ESTA ESTIMACION	
				ESTIMADA	POR ESTIMAR	CANTIDAD	P.U.
IMPORTE							
DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES							
01	EXCAVACION DE ZANJA DE HASTA 2.00M DE PROFUNDIDAD POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO "B"	M3	243.14	243.14	-	-	\$ 27.27
02	AFINE DE FONDO DE ZANJA EN EXCAVACIONES HECHAS A MAQUINA INCLUYE EXTRAER EL MATERIAL FUERA DE LA ZANJA	M2	137.28	137.28	-	-	\$ 7.23
03	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES EN CAMION DE VOLTEO DE 6M3 A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 1.00 KM FUERA DE LA OBRA.	M3	316.08	316.08	-	-	\$ 62.35
CONFORMACION DE BASES Y SUB BASES							
04	TRAZO Y NIVELACION DE REDES DE AGUA Y DRENAJE UTILIZANDO EQUIPO TOPOGRAFICO Y DELANDO BANCOS DE NIVEL PARA CHECAR NIVELES DURANTE EL TRANSURSO DE LA OBRA	ML	547.27	547.27	-	-	\$ 7.57
05	PLANTILLA DE 10CM ESPESOR PROMEDIO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR, INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION	M2	137.28	137.28	-	-	\$ 36.62
06	ACOSTILLADO DE TUBERIA DE 50 CM DE ESPESOR EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MAXIMO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR, INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION	ML	196.11	196.11	-	-	\$ 99.57
07	RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MAXIMO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR, INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION	M3	184.29	184.29	-	-	\$ 325.12
INSTALACION DE TUBERIA							
08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE DE PVC S-25 DE 10" DE DIAMETRO INCLUYE HERRAMIENTA MATERIALES Y MANO DE OBRA	ML	196.11	196.11	-	-	\$ 184.58
09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESCARGA DOMICILIARIA DE 4" DE DIAMETRO INCLUYE HERRAMIENTA MATERIALES Y MANO DE OBRA	PIEZA	22.00	22.00	-	-	\$ 634.01
10	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA DE HASTA H-180 CM INC. HERRAMIENTA MATERIALES Y MANO DE OBRA	PIEZA	6.00	6.00	-	-	\$ 3,564.22
REPOSICION DE EMPEDRADO							
11	RETIRO DE EMPEDRADO EXISTENTE UTILIZANDO RETROEXCAVADORA Y DEPOSITANDO LA MANUALMENTE EN AMBOS LADOS PARA SU POSTERIOR UTILIZACION, INCLUYE MAQUINARIA Y MANO DE OBRA	M2	547.27	547.27	-	-	\$ 10.44

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



[Handwritten signature]




Hidalgo de
2015-2018

DESGLASE DE ESTIMACION

PROYECTO: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLES MORELOS Y 20 DE NOVIEMBRE, CON REPOSICION DE EMPEDRADO.
LOCALIDAD: ZAPOTTAN DE HIDALGO
CONTRATISTA: CARLOS MANUEL PELAYO CERVERA
No. DE CTO: GMJ 005C OP/2016
ESTIMACION: 3 (TRES) FINIQUITO
PERIODO DE EJECUCION: DEL 7 AL 15 DE OCTUBRE



No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR		ESTA ESTIMACION		IMPORTE
				ESTIMADA	POR ESTIMAR	CANTIDAD	P.U.	
12	COMPACTACION DE SUPERFICIE POR MEDIOS MECANICOS COMPACTADO AL 90% PROCTOR. INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVION	M2	547.27	-	547.27	547.27	\$ 10.42	\$ 5,703.84
13	FORMACION DE BASE HIDRAULICA DE 20 CM DE ESPESOR CON MATERIALES PETREOS DE 3/4" A FINOS COMPACTADO AL 95% PROCTOR. INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVION	M2	547.27	-	547.27	547.27	\$ 82.13	\$ 44,946.66
14	REEMPEDRADO C/PIEDRA BRAZA Y MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO PROP 1:4 INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCION	M2	547.27	-	547.27	547.27	\$ 194.72	\$ 106,566.09
COMPLEMENTARIOS								
15	LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA	M2	547.27	-	547.27	547.27	\$ 5.14	\$ 2,811.60
TOTAL ESTIMADO \$								160,028.19

SUPERVISOR

LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUIN

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

INGEN. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO

CONTRATISTA

LIC. CARLOS MANUEL PELAYO CERVERA



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



CARLOS MANUEL PELAYO CERVERA



OBRA REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLES MORELOS Y 20 DE NOVIEMBRE, CON REPOSICION DE EMPEDRADO. ESTIMACION N° 3 (TRES)

NUMEROS GENERADORES CONTRATO N° GMJ 005C OP/2016

LOCALIDAD ZAPOTTAN DE HIDALGO

MUNICIPIO JOCOTEPEC, JALISCO PERIODO DEL 7 AL 15 DE OCTUBRE

CVE	CONCEPTO	LOCALIZACION	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	ABUNDAMIENTO	VOLUMEN	UNID.	TOTAL
01	EXCAVACION DE ZANJA DE HASTA 2.00M DE PROFUNDIDAD POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO "B"	ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE LIBERTAD	0.0000	0.0000	0.0000	0.00		0.00	M3	0.00
02	ATINE DE FONDO DE ZANJA EN EXCAVACIONES HECHAS A MAQUINA INCLUYE EXTRAER EL MATERIAL FUERA DE LA ZANJA	ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE LIBERTAD	0.0000	0.0000	0.0000	0.00		0.00	M2	0.00
03	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES EN CAMION DE VOLTEO DE 6M3 A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 100 KM FUERA DE LA OBRA.	ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE LIBERTAD	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	0	0.00	M3	0.00
04	TRAZO Y NIVELACION DE REDES DE AGUA Y DRENAJE UTILIZANDO EQUIPO TOPOGRAFICO Y DEJANDO BANCOS DE NIVEL PARA CHECAR NIVELES DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA	ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE LIBERTAD	0.0000	0.0000	0.0000	0.00		0.00	M2	0.00
05	PLANTILLA DE 10CM ESPESOR PROMEDIO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR. INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION	ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE LIBERTAD	0.0000	0.0000	0.0000	0.00		0.00	M2	0.00
06	ACOSTILLADO DE TUBERIA DE 30 CM DE ESPESOR EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MAXIMO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR. INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION	ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE LIBERTAD	0.0000	0.0000	0.0000	0.00		0.00	ML	0.00

SUPERVISOR
LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUIN

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO

CONTRATISTA
LIC. CARLOS MANUEL PELAYO CERVERA



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



CARLOS MANUEL PELAYO CERVERA



OBRA REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLES MORELOS Y 20 DE NOVIEMBRE, CON REPOSICION DE EMPEDRADO. ESTIMACION N° 3 (TRES)

NUMEROS GENERADORES CONTRATO N° GMJ 005C OP/2016

LOCALIDAD ZAPOTTAN DE HIDALGO PERIODO DEL 7 AL 15 DE OCTUBRE

MUNICIPIO JOCOTEPEC, JALISCO

CVE.	CONCEPTO	LOCALIZACION	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	ABUNDAMIENTO	VOLUMEN	UNID.	TOTAL
07	RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MAXIMO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR. INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVIZION	ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE LIBERTAD TOMAS	0.0000	0.0000	0.0000	0.00		0.00	M3	0.00
08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE DE PVC S 25 DE 10" DE DIAMETRO INCLUYE HERRAMIENTA MATERIALES Y MANO DE OBRA	ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE LIBERTAD	0.0000	0.0000	0.0000	0.00		0.00	ML	0.00
09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESCARGA DOMICILIARIA DE 4" DE DIAMETRO INCLUYE HERRAMIENTA MATERIALES Y MANO DE OBRA	ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE LIBERTAD	0.0000	0.0000	0.0000	0.00		0.00	PIEZA	0.00
10	CONSTRUCCION DE POZO DE VISTA DE HASTA H=180 CM INC. HERRAMIENTA MATERIALES Y MANO DE OBRA	ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE LIBERTAD	0.0000	0.0000	0.0000	0.00		0.00	M2	0.00

SUPERVISOR
LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUIN

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO

CONTRATISTA
LIC. CARLOS MANUEL PELAYO CERVERA



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



ARCHIVO FOTOGRÁFICO DE OBRA



OBRA:	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLES MORELOS Y 20 DE NOVIEMBRE, CON REPOSICION DE EMPEDRADO.	
NUMERO PROGRAMA:	GMJ 005C OP/2016	RAMO 33
CONTRATISTA:	CARLOS MANUEL PELAYO CERVERA	
FECHA:	17 DE OCTUBRE DE 2016	
ESTIMACION:	3 (TRES) FINIQUITO	

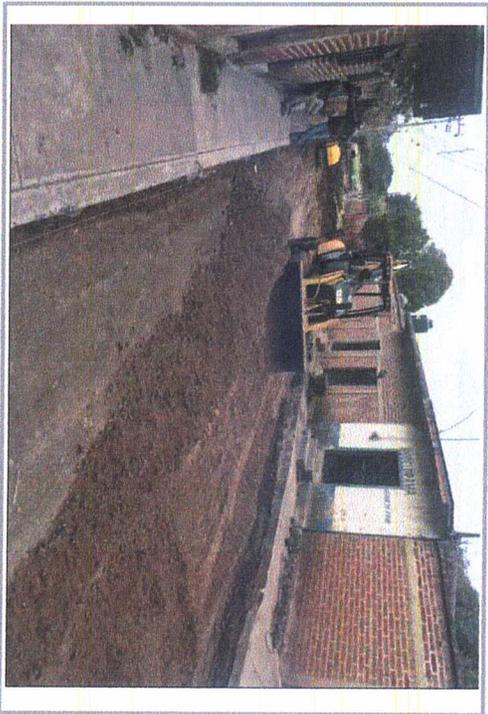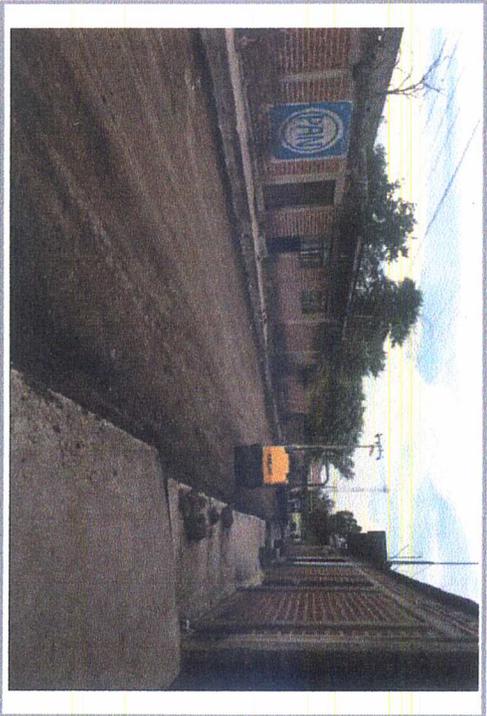

COMPACTACION DE SUPERFICIE POR MEDIOS MECANICOS COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION

FORMACION DE BASE HIDRAULICA DE 20 CM DE ESPESOR CON MATERIALES PETREOS DE 3/4" A FINOS COMPACTADO AL 95% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION

REVISO	CONTRATISTA
SUPERVISOR DE OBRA	CONTRATISTA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUIN	LIC. CARLOS MANUEL PELAYO CERVERA



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



CROQUIS DE AVANCE



OBRA:	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLES MORELOS Y 20 DE NOVIEMBRE, CON REPOSICION DE EMPEDRADO.	CONTRATISTA:	CARLOS MANUEL PELAYO CERVERA	ESTIMACION:	3 (TRES) FINIQUITO
NUMERO PROGRAMA:	GMJ 005C OP/2016 RAMO 33	FECHA:	17 DE OCTUBRE DE 2016		



REVISOR	SUPERVISOR DE OBRA
CONTRATISTA	CONTRATISTA
	LIC. CARLOS MANUEL PELAYO CERVERA
	LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUIN



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
