

1463/2015

ENERGIAS RENOVABLES DE LA RIVERA SA DE CV
ERR110523534
Domicilio Fiscal
Hidalgo 297 A
Col. Centro 45900
Chapala Jalisco México
Tel. 3767653680

Factura No: 67
FOLIO FISCAL (UUID):
58A1F46B-A6FA-4CCD-921D-CC66983FBFAE
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000203495276
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000303925019
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2016-12-23T13:36:28
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2016-12-23T13:31:28

CLIENTE: Municipio de Jocotepec Jalisco
RFC: MJJ850101KP8
Colonia Centro C.P. 45800
Jocotepec Jalisco
Mexico

Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición: Chapala, Jalisco
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 02-Cheque nominativo

Fecha de Expedición: 23 diciembre 2016
Clave de Moneda: MXN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	N/A	FINIQUITO DEL CONTRATO NO. GMJ-14C-OP/2016 CORRESPONDIENTE A LA OBRA "ELECTRIFICACION DE MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CALLE BERNARDO QUINTANA DE ZAPOTITAN DE HIDALGO", EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. RETENCION 5 AL MILLAR DE SUPERVISION: \$471.21 CANTIDAD NETA A PAGAR:\$108,848.55	\$ 94,241.17	\$ 94,241.17

IMPORTE CON LETRA: CIENTO NUEVE MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS, 76/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 94,241.17
IVA(IVA 16.00%): \$ 15,078.59
TOTAL: \$ 109,319.76

SELLO DIGITAL DEL CFDI


Rrgae+KlpF2avla5l1eeE+DL1RyXSxPLVH7Mmhe6rLz8JzNAIj25DEDJKAD26zFYp23r4RjOaQi294gZGrqWnV03bINOZlqWcTDy0kM8JPBxPnozrgcxVdGGRQpkqNT9dnf+16off+eMKDQ4GbfCzmgznzFNVkSZQSALYw=

SELLO DIGITAL DEL SAT

rAa2c88vMKP0gAV6b4gqfsgAeek8IDDxGEIBIQrcIEKRw1UcP5zKdM0eOmre9qHh8o6mRRLgqFDkaTRTMVHUSH52bxCXl1AQPZvs11zoKaITyRcOhVcRv+cvWWM3Ma3nsEIIUWJ3FOM8SgHZIBEOwWlbpmp42uEtrOS9N8=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT


||1.0|58A1F46B-A6FA-4CCD-921D-CC66983FBFAE|2016-12-23T13:36:28|Krgae+KlpF2avla5l1eeE+DL1RyXSxPLVH7Mmhe6rLz8JzNAIj25DEDJKAD26zFYp23r4RjOaQi294gZGrqWnV03bINOZlqWcTDy0kM8JPBxPnozrgcxVdGGRQpkqNT9dnf+16off+eMKDQ4GbfCzmgznzFNVkSZQSALYw|00001000000203495276|



Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal

 Limpiar UUID

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen 

Verificar CFDI

RFC del Emisor	Nombre o Razón Social del Emisor	RFC del Receptor	Nombre o Razón Social Receptor
ERR110523534	ENERGIAS RENOVABLES DE LA RIVERA SA DE CV	MJJ850101KP8	Municipio de Jocotepec Jal

Folio Fiscal

Fecha de Expedición

Fecha Certificación SAT

PAC que Certificó

58A1F46B-A6FA-4CCD-92ID-CC66983FBFAE

2016-12-23T13:31:28

2016-12-23T13:36:28

FMD100203JS7

Total del CFDI


Estado CFDI

\$109,319.76

ingreso

Vigente

Imprimir



DIVISION JALISCO
SUBGERENCIA DE DISTRIBUCIÓN
CHAPALA

Asunto: Aprobación de Proyecto

JOCOTEPEC, JALISCO a 28 de Diciembre de 2016

Jose Valentin Zarate Rivera
Energias Renovables de la Rivera S.A. DE C.V.
Hidalgo # 297-A

En atención a su solicitud DX07102322052016, de fecha 28 de Diciembre de 2016, con la cual solicita la revisión y aprobación del proyecto para la construcción de la obra eléctrica a H AYUNTAMIENTO JOCOTEPEC JALISCO, ubicada(o) en BERNARDO QUINTANA, JOCOTEPEC, JALISCO.

En vista de que cumple con la normatividad vigente, otorgamos nuestra aprobación al proyecto, para que se construya dentro de lo especificado en las normas y especificaciones aplicables.

Esta aprobación tiene vigencia de doce meses a partir de la fecha en que haga efectivo el pago por los conceptos abajo descritos, que ascienden a la cantidad de \$13169.3524 (trece mil ciento sesenta y nueve pesos con treinta y seis centavos)

Revisión de proyecto:	1,322.00
Supervisión de Obra:	2,385.45
Maniobras y conexión:	7,645.44
Pruebas por puestas en operación:	0.00
Subtotal:	11,352.89
I.V.A.:	1,816.46
Total:	13,169.35

El presente presupuesto tiene vigencia de dos meses, contados a partir de la fecha en que haya sido entregado al solicitante para su revisión y aceptación, por lo que de no haberse cubierto la aportación en el plazo señalado quedará sin efecto.



El pago de ésta cantidad no implica que éste servicio se pueda contratar, sin antes haber realizado la entrega de las instalaciones requeridas por Comisión Federal de Electricidad, de lo cual el Depto. de Distribución o Planeación-Construcción dará aviso.

Es responsabilidad del titular del proyecto gestionar las autorizaciones por derechos de servidumbre de paso, cruzamiento con vías de comunicación (ferrocarriles, carreteras, etc.), estudios y acciones relativas al impacto ambiental que le sean aplicables al proyecto, debiendo presentar el original (cotejar y devolver) y copia de la autorización respectiva para ejecutar los trabajos a favor de Comisión Federal de Electricidad

Atentamente



CARLOS DANIEL FAJARDO VAZQUEZ
JEFE DEPTO PLANEACION ZONA CHAPALA

 Comisión Federal de Electricidad		FICHA DE DEPOSITO		DIVISION: JALISCO ZONA: CHAPALA FECHA: 28 DE DICIEMBRE DE 2016	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DIVERSAS					
BANCO SANTANDER			CONVENIO: 4753		
CLABE INTERBANCARIA: 014320655007874318			REFERENCIA: 49830610048630348262		
FECHA LIMITE DE PAGO:		28 DE FEBRERO DE 2017			
CONCEPTO DE PAGO:		REVISION DE PROYECTO, SUPERVISION DE OBRA, MANIOBRAS Y CONEXION DE LA SOLICITUD DX07102322052016.			
TIPO DE DEPOSITO					
<input type="checkbox"/> EFECTIVO		I.V.A.: \$		1,816.46	
<input type="checkbox"/> CHEQUES		SUBTOTAL: \$		11,352.89	
TOTAL: \$				13,169.35	
 49830610048630348262					

La aportación podrá ser liquidada por transferencia electrónica con el número de referencia y la Clabe interbancaria N°014320655007874318. En caso de requerir factura, favor de enviar en un plazo no mayor a 5 días hábiles, después de realizado su pago, al correo claudia.duran@cfе.gob.mx, iliana.rosas@cfе.gob.mx, jessica.sanchez@cfе.gob.mx, con los siguientes datos: 1.- Cedula de identificación Fiscal, 2.- R.F.C (cédula emitida por SAT), 3.- Comprobante de pago.

BERNARDO QUINTANA

2017/01/19

Scotiabank Inverlat S.A.

Página 1

16:51:24

Scotia en Línea

Impresión de Comprobante de Traspasos en Otros Bancos

ORDENANTE

Nombre

ENERGIAS RENOVABLES DE LA RIVERA SA DE

Cuenta de Cargo

CHQ-MXN-GUADALAJAR-01002828340-

Importe

13,169.35

I.V.A.

1,816.46

Moneda

MXN - PESOS

Tipo de envío

1-MISMO DÍA (SPEI)

Fecha de Aplicación

2017/01/19

Instrucción de Pago

1-SPEI

R.F.C.

ERR110523534

Concepto

49830610048630348262

Referencia (Numérica)

1901171

BENEFICIARIO

Cuenta de Abono

014320655007874318

Banco

SANTANDER

Tipo de Persona

2. PERSONA MORAL

R.F.C.

CSS160330-CP7

Nombre Beneficiario/Razón Social

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASI

Comisión

5.00

I.V.A. Comisión

0.80

Costo de Transmisión

0.00

Saldo Cuenta de Cargo

[REDACTED]

Estado de Operación

APLICADO

Folio

22020545352

Clave de Rastreo

3573064679

Mensaje

SU TRANSACCIÓN SE REALIZÓ EXITOSAMENTE.

Transacción aceptada, en proceso de verificación

Si deseas dar seguimiento al estatus de tu operación, favor de comunicarte a los teléfonos 5728-1262/5728-1205 ó 01-800-705-4000 eligiendo la opción correspondiente del Sistema de Audio respuesta Automática, mediante el uso del folio que fue generado por el sistema, podrás conocer el estatus de la misma.

Comprobante de carácter informativo, no tiene validez fiscal.

Centro atención telefónica CONDUSEF 5340-0999 ó 01 800 999-8080 . Sitio Web para consulta de comisiones en: www.scotiabank.com.mx
Para aclaraciones llamar al 5728-1262 ó 01 800 705-4000. Centro de atención telefónica 5728 1262 ó 01 800 705 4000.

ENERGIAS RENOVABLES DE LA RIVERA
[001] JORGE ALBERTO FRANCO CHAVEZ



SIN-941202-514



CONTROL DE ESTIMACIONES

CONSTRUYE: ENERGIAS RENOVABLES DE LA RIVERA SA DE CV ESTIMACION No.: 3 (FINIQUITO) FECHA: 22/12/2016

DESCRIPCION DE LA OBRA: INSTALACION ELECTRICA CALLE BERNARDO QUINTANA PERIODO DEL: 10/12/2016 A 22/12/2016

OBRA No.: GMJ14C OP/2016 **MONTO A PAGAR:** \$108,848.55

PARTIDA	IMPORTE PRESUPUESTADO	IMPORTE ESTA ESTIMACION	IMPORTE ANTERIOR	IMPORTE ACUMULADO	SALDO	ESTIMACION	
Suministro e instalación de poste PC 12-750 incluye retenida RSA Y REA, estructura VR2N Y VS2N. Tendido y tensión de conductor AC SR 1/0 AWG	\$103,487.92	\$0.00	\$103,487.92	\$103,487.92	\$0.00		\$94,241.17
Suministro e instalación de poste PC 09-450 incluye estructura 3R Y 3P BAJA TENSION, 38.5 metros de cable AL 2+1 1/0-2. Conectores en cada poste de baja tensión.	\$116,316.66	\$0.00	\$116,316.66	\$116,316.66	\$0.00	I.V.A. 16%	\$15,078.59
Suministro e instalación de transformador bajo norma "K", D1-37.5 -22860-220/420V, incluye montaje de estructura 1CCF20 (contactricutos fusible), pruebas y puesta en servicio de transformador. Trámites de proyecto ante CFE, planos, diagramas unifilares y verificación de alumbrado público por medio de una unidad UVIE	\$94,241.17	\$94,241.17	\$0.00	\$94,241.17	\$94,241.17	SUMA	\$109,319.76
						DEDUCCIONES	
						AMORTIZACION	\$0.00
						I.V.A. AMORTIZADO	\$0.00
						SUMA	\$0.00
SUMA	\$314,045.75	\$94,241.17	\$219,804.58	\$314,045.75	\$94,241.17	5 AL MILLAR VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL DE OBRA	\$471.21
INDIRECTOS							
SUMA TOTAL	\$314,045.75	\$94,241.17	\$219,804.58	\$314,045.75	\$94,241.17	IMPORTE	\$108,848.55
IMPORTE DEL PRESUPUESTO	\$314,045.75					IMPORTE	\$108,848.55
ESTIMACION ANTERIOR	\$219,804.58					I.V.A.	\$0.00
ESTA ESTIMACION	\$94,241.17						\$0.00
ACUMULADO	\$314,045.75						\$0.00
SALDO	\$0.00						\$0.00

Contratista

Ing. Jose Valentin Zarate Rivera
ENERGIAS RENOVABLES DE LA RIVERA SA DE CV

Director de Obras Públicas

Ing. Juan Manuel Garcia Escoto



NUMEROS GENERADORES

OBRA: **INSTALACION ELECTRICA CALLE BERNARDI DEPENDENCIA: JOCOTEPEC** ESTIMACION No: **3 (FINIQUITO)**
 PLANO: PARTIDA: NIVEL:
 FECHA: **22/12/2016** PERIODO **10/12/2016** A **22/12/2016** OBRA NO: **GMJ14C OP/2016**

NÚMERO	3	CONCEPTO	EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	UNIDAD	SUBTOTAL	REFERENCIA
		Suministro e instalación de transformador bajo norma "K", D1-37.5 - 22860-220/120V, incluye montaje de estructura 1CCF20 (cortacircuitos fusible), pruebas y puesta en servicio de transformador. Trámites de proyecto ante CFE, planos, diagramas unifilares y verificación de alumbrado público por medio de una unidad UVIE						1.00	PZA	1.00	
										TOTAL	1.00

Contratista

Director de Obras Públicas

Ing. José Valentín Zárate Rivera
 ENERGIAS RENOVABLES DE LA RIVERA SA DE CV

Ing. Juan Manuel García Escoto

SOLARHOUSE



CIA. CONTRATISTA: ENERGIAS RENOVABLES DE LA RIVERA SA DE CV FECHA: 22/12/2016
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: INSTALACION ELECTRICA CALLE BERNARDO QUINTANA OBRA No.: GMJ14C OP/2016
DEPENDENCIA: JOCOTEPEC 10/12/2016 A 22/12/2016

No.	Concepto	CANTIDAD ESTIMADA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	Suministro e instalación de transformador bajo norma "K", D1-37.5 -22860-220/120V, incluye montaje de estructura 1CCF20 (cortacircuitos fusible), pruebas y puesta en servicio de transformador. Tramites de proyecto ante CFE, planos, diagramas unifilares y verificación de alumbrado público por medio de una unidad UVIE	1.0	\$ 94,241.17	\$ 94,241.17
TOTAL				\$ 94,241.17



Director de Obras Públicas
[Signature]
Ingr. Juan Manuel García Escoto

Contratista
[Signature]
Ing. José Valentín Zárate Rivera
ENERGIAS RENOVABLES DE LA RIVERA SA DE CV


SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



CROQUIS

OBRA:	INSTALACION ELECTRICA CALLE BERNARDO QUINTANA	DEPENDENCIA:	JOCOTEPEC	ESTIMACION No:	3 (FINIQUITO)
PLANO:		PARTIDA:	0	NIVEL:	
FECHA:	22/12/2016	PERIODO	10/12/2016 A 22/12/2016	OBRA NO:	GMJ14C OP/2016

No. CONCEPTO	3	CROQUIS
--------------	---	---------

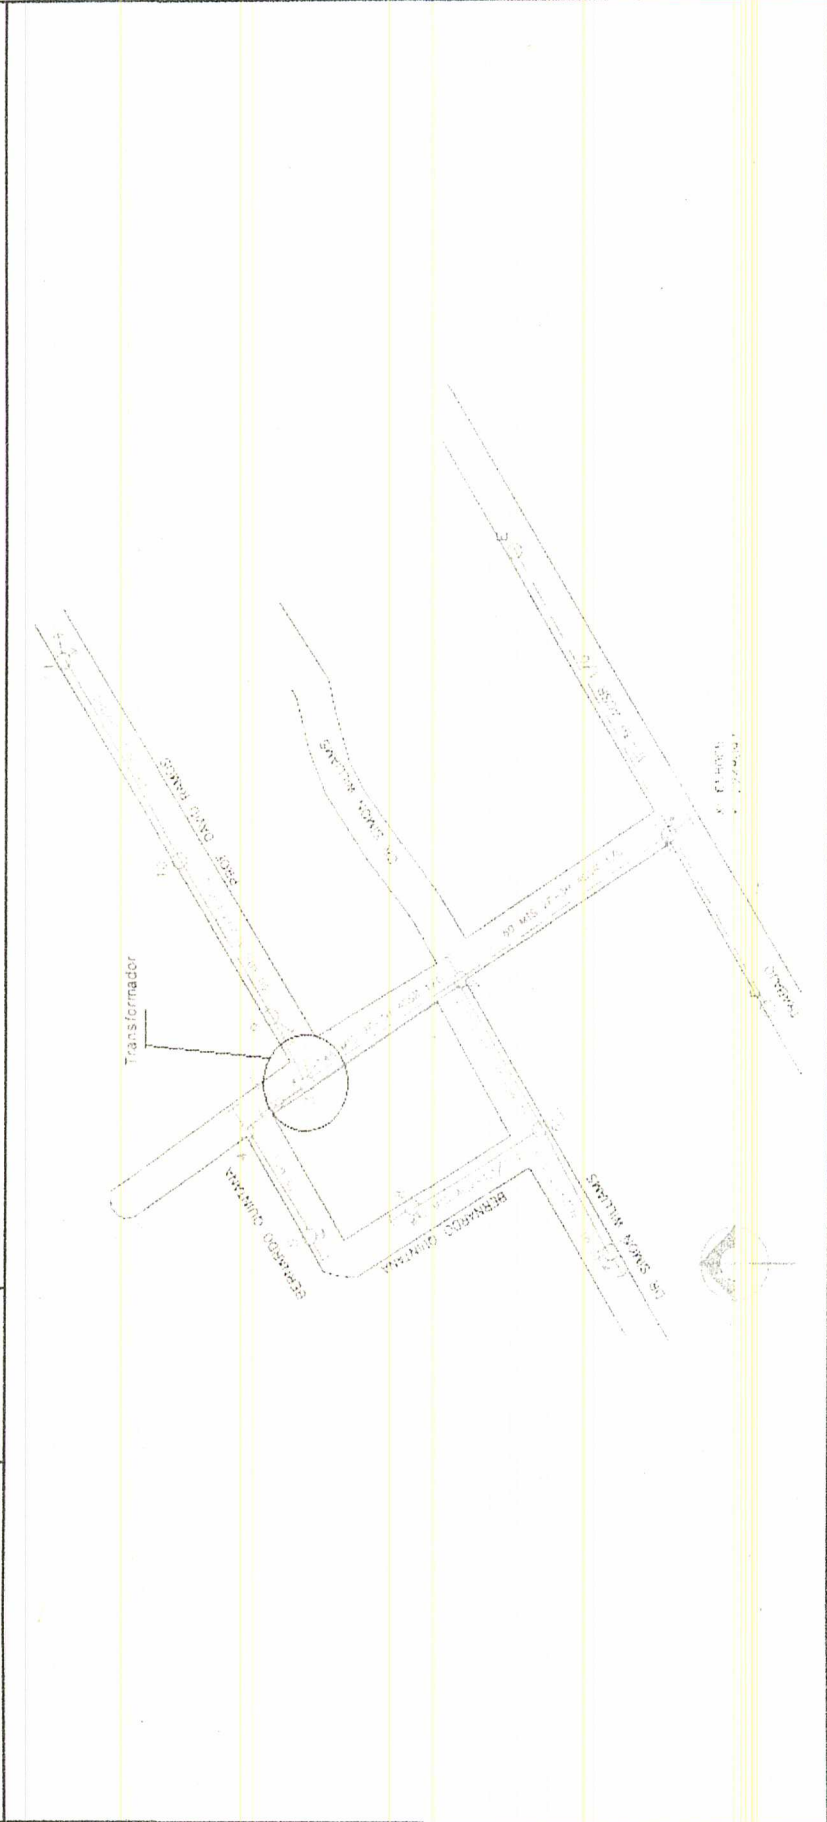

Contratista

 Ing. José Valentín Zárate Rivera
 ENERGIAS RENOVABLES DE LA RIVERA SA DE CV

Director de Obras Públicas



 Ing. Juan Manuel García Escoto

REPORTE FOTOGRAFICO



OBRA:	INSTALACION ELECTRICA CALLE BERNARDO QUINTANA		DEPENDENCIA:	JOCOTEPEC	ESTIMACION No:	3 (FINIQUITO)	
PLANO:		PARTIDA:			NIVEL:		
FECHA:	22/12/2016	PERIODO	10/12/2016	A	22/12/2016	OBRA NO:	GMJ14C OP/2016

No. CONCEPTO	3	FOTOGRAFÍAS	OBSERVACIONES
--------------	---	-------------	---------------

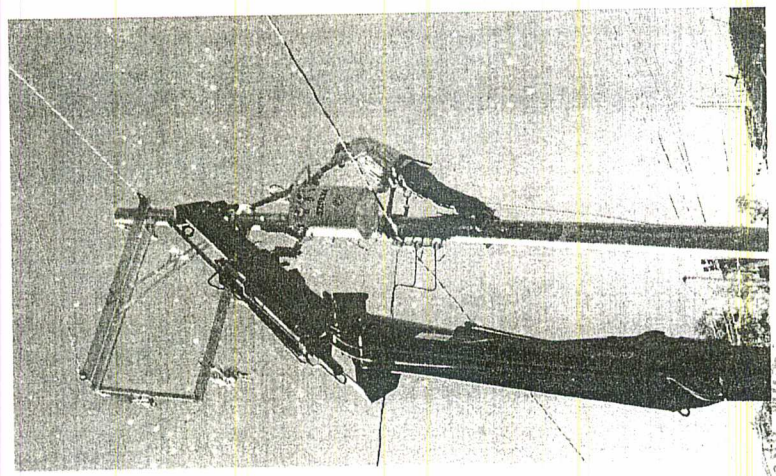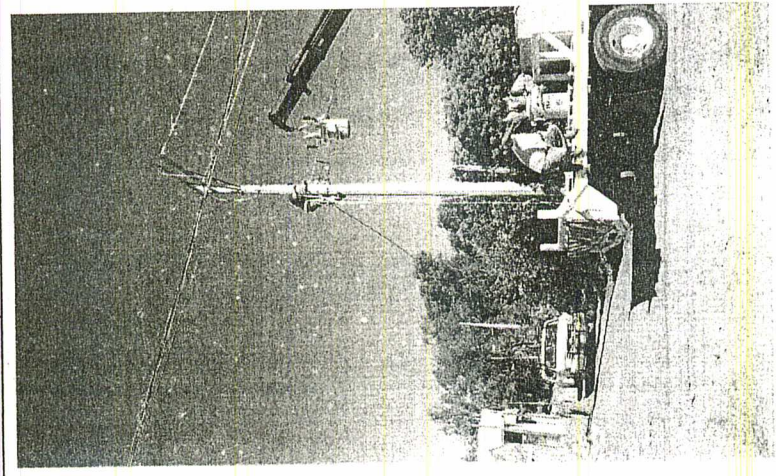

Contratista

[Signature]

Ing. José Valentín Zárate Rivera
ENERGIAS RENOVABLES DE LA RIVERA SA DE CV



Director de Obras Públicas
[Signature]
Ing. Juan Manuel García Escoto

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
