

A & G URBANIZADORA SA DE CV

AUR100826KX0

R.F.C.

Régimen General de Ley

Régimen Fiscal

ESCOBEDO 244 COL. CENTRO Lugar de Expedición
ETZATLAN, JALISCO, C.P. 46500

CLIENTE:
Nombre: MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO

Folio Administrativo: 000560

Dirección: HIDALGO SUR 6 COL. CENTRO C.P. 45800
JOCOTEPEC, JALISCO

Teléfono:

Número de certificado: 00001000000300588337

Fecha y Hora de Emisión: 28-12-2016T12:24:48

Folio del SAT: 7548E40C-3677-4167-98D4-5BDFB1FF6C10

R.F.C.: MJJ850101KP8

E-mail: jqn73@yahoo.com.mx

Numero de Certificado del SAT: 00001000000403155917

Fecha y Hora de Timbrado: 28-12-2016T12:26:25

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago: 03 Transferencia electrónica de fondos

No. Cuenta: 9337

Referencia:

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio U.	Importe
1.00	NO APLICA	ESTIMACION No. 5 (FIIQUITO) DEL CONTRATO No. GMJ-12C-OP/2016, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE VICENTE GUERRERO.	161,967.44	161,967.44

RETENCION 5 AL MILLAR DE SUPERVISION: \$ 1,079.78
CANTIDAD NETA A PAGAR: \$186,802.45

Importe con Letra:

CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 23/100 MN

Observaciones:



Subtotal: 161,967.44

I.V.A.: 25,914.79

Total: 187,882.23

Sello Digital del Emisor:

XUYa++TzX5gemb1k780KT2R+5qwDylnxe7EDeppkEE9nZHgz+PJGnwWW4vBR2U'BkKsJXTIccassRyIHbwcZ6scrJy7k0VJ91bZ2UvM2hL21sUPziTz7W1y5J0XqJW8arWxkRAIsTEqxP2e05TrBEga19Wkh0rkRoTA=

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



Sello Digital del SAT:

M9y1P3SXTTtXNjmuZtdXMyLHwcb6q+Q30ILwA3eHRvcubjMP9rH93644msF6N9hCJ7FDgEYdHEK48XUk7g1OPoS0u9UVQhSklPnoic6i4fPrqG638TbM7yVtSTkgcOP91PzaWmmrdzY9VkJKMuy+ejSqI+RlJDDQ0ZehwC7h0uNqHoLb+PhWn4Rj9FIOYQhjq1bRefmJFIUMomUyxn7J98mtcDJ27vV4AMM1+9d1b6R1o7Kbwgibc9qQM7k98I72HgKYRlI0AixC4ra8cWBCA8vAZWzP3nzoEzLD7AdulUzb7GwRNaVSlvPUjShv7JwwAP23bWz2apuXA==

Cadena Original:

11.017548E40C-3677-4167-98D4-5BDFB1FF6C10|2016-12-28T12:26:25|XUYa++TzX5gemb1k780KT2R+5qwDylnxe7EDeppkEE9nZHgz+PJGnwWW4vBR2U'BkKsJXTIccassRyIHbwcZ6scrJy7k0VJ91bZ2UvM2hL21sUPziTz7W1y5J0XqJW8arWxkRAIsTEqxP2e05TrBEga19Wkh0rkRoTA=100001000000403155917|

I. AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC, JALISCO.		3. DE CONTRATO: GMJ-12C-OP/2016		DE RELACION HOJA No. 1 DE 1	
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES		CONTRATISTA: A&G URBANIZADORA S.A. DE C.V.		ESTIMACION No. CINCO (FINIQUITO)	
		OBRA: Construcción de losa de concreto hidraulico y rehabilitación de puente vehicular en la calle Vicente Guerrero.		PERIODO DE TRABAJO:	
		UBICACION: CABECERA MUNICIPAL, JOCOTEPEC, JALISCO.		DEL: 08 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2016	
				FECHA: 15 DE DICIEMBRE DE 2016	

RESUMEN DE LOS CONCEPTOS E IMPORTES QUE CONSTITUYEN LA ESTIMACION

HOJA No.	PARTIDAS	IMPORTES	
1	PAVIMENTACION DE CONCRETO	\$	\$ -
2	REFORZAMIENTO DE PUENTE VEHICULAR	\$	\$ 215,956.59

ESTADO CONTABLE	IMPORTE	I. V. A.	TOTAL
ASIGNACION	\$ 3,388,562.56	\$ 542,170.01	\$ 3,930,732.57
IMPORTE DE ESTIMACION	\$ 215,956.59	\$ 34,553.05	\$ 250,509.64
ACUMULADO ANTERIOR	\$ 3,172,605.95	\$ 507,616.95	\$ 3,680,222.90
ACUMULADO A LA FECHA	\$ 3,388,562.54	\$ 542,170.01	\$ 3,930,732.55
SALDO POR EJERCER	\$ -	\$ -	\$ -

AMORTIZACION DEL ANTICIPO	
ANTICIPO %	\$ 847,140.64 \$ 135,542.50 \$ 982,683.14
AMORTIZACION	\$ 53,989.15 \$ 8,638.26 \$ 62,627.41
AMORTIZACION ACUM. ANT.	\$ 793,151.50 \$ 126,904.24 \$ 920,055.74
AMORTIZACION A LA FECHA	\$ 847,140.65 \$ 135,542.50 \$ 982,683.15
FALTANTE POR AMORTIZAR	\$ - \$ - \$ -

MONTO DE ESTIMACION \$ 215,956.59
 MENOS AMORTIZACION ANTICIPO % \$ 53,989.15
 SUBTOTAL \$ 161,967.44
 I. V. A. 16% \$ 25,914.79
 SUMA \$ 187,882.23
 MENOS 2 AL MILLAR (CMIC) \$ -
 MENOS 5 AL MILLAR (R.I.V. SEFUPU) \$ 1,079.78
 NETO A PAGAR \$ 186,802.45

EL REPRESENTANTE LEGAL

ING. JOAQUIN RAMIREZ GALLARDO
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

C. HECTOR MANUEL HARO PEREZ
EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ
ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE JOCOTEPEC, JALISCO.

ESTIMACIÓN No. 5 CINCO (QUINTO)

PERÍODO: DEL 08 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2016

OBRA : Construcción de losa de concreto hidráulico y rehabilitación de puente vehicular en la calle Vicente Guerrero.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

UBICACIÓN : CABECERA MUNICIPAL, JOCOTEPEC, JALISCO.

CONTRATISTA : A&C URBANIZADORA S.A. DE C.V.

FECHA: 15 DE DICIEMBRE DE 2016


ESTIMACIÓN DE OBRA EJECUTADA


No.	CONCEPTO	u	CANTIDADES			PRECIO UNITARIO	IMPORTE				
			PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA		SALDO	PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA	SALDO
16	Zapata de cimentación corrida de 80 cm. de ancho x 10 a 20 cm. de peralte, fabricada con concreto fc=300 kg/cm2, r.n. agreg.max. 20 mm. (3/4"), incluye: plantilla de concreto h.o. fc=100 kg/cm2 de 5 cm. de espesor, cimbra, descimbra, habilitado de 65 kg de acero de refuerzo de 1/2" x m3. de concreto, materiales, mano de obra y equipo.	m2	48.4000	45.3273692	48.4000000	\$4,058.76	\$	196,443.98	\$	196,443.98	\$
17	Plantilla de 10 cm. de concreto F'c=150 kg/cm2, acabado común, incluye: materiales, acarreos, preparación de la superficie, nivelación, cimbrado, colado, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	110.0000	110.0000	110.0000	\$290.76	\$	31,983.60	\$	31,983.60	\$
SUBTOTAL ESTA ESTIMACION REFORZAMIENTO DE PUENTE VEHICULAR							\$	215,956.59	\$	215,956.59	\$
TOTAL							\$	3,388,562.56	\$	3,388,562.55	\$

ING. JOAQUIN RAMIREZ GALLARDO
REPRESENTANTE LEGAL


ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ
SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



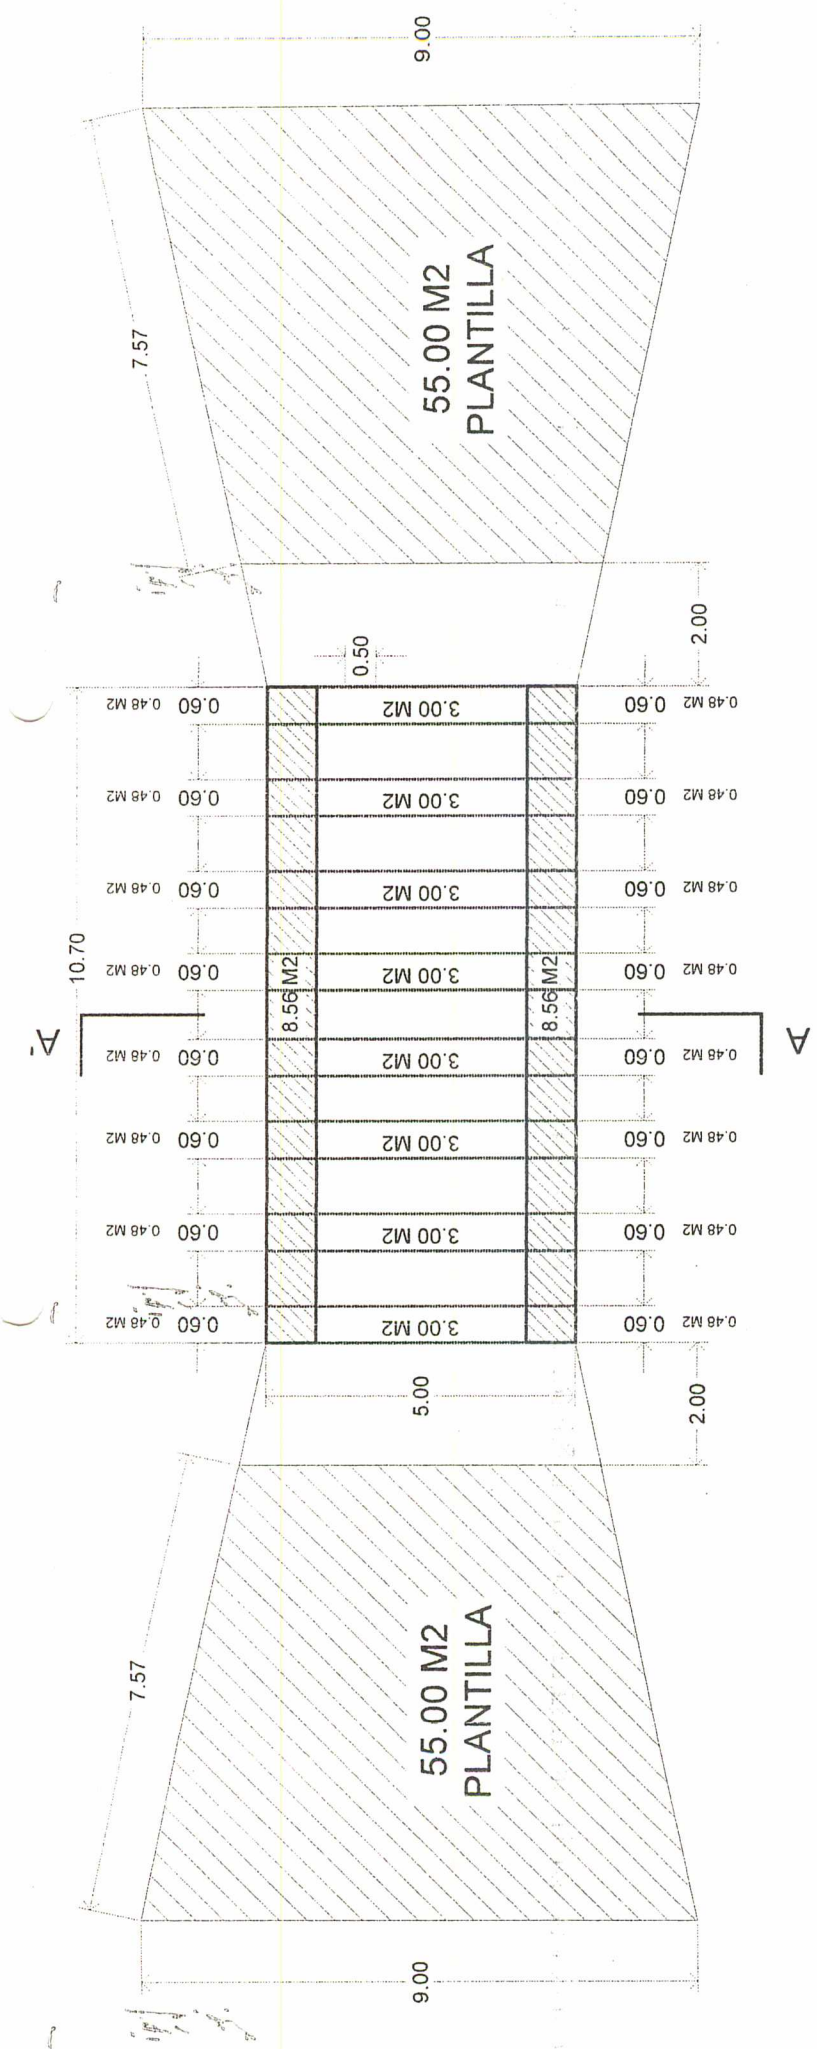

PLATA
REFORZAMIENTO DE PUENTE VEHICULAR

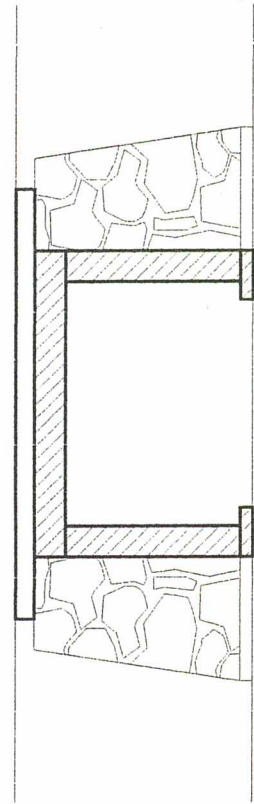




SECCIÓN A, A'
REFORZAMIENTO DE PUENTE VEHICULAR








COMISIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

[Handwritten signature]

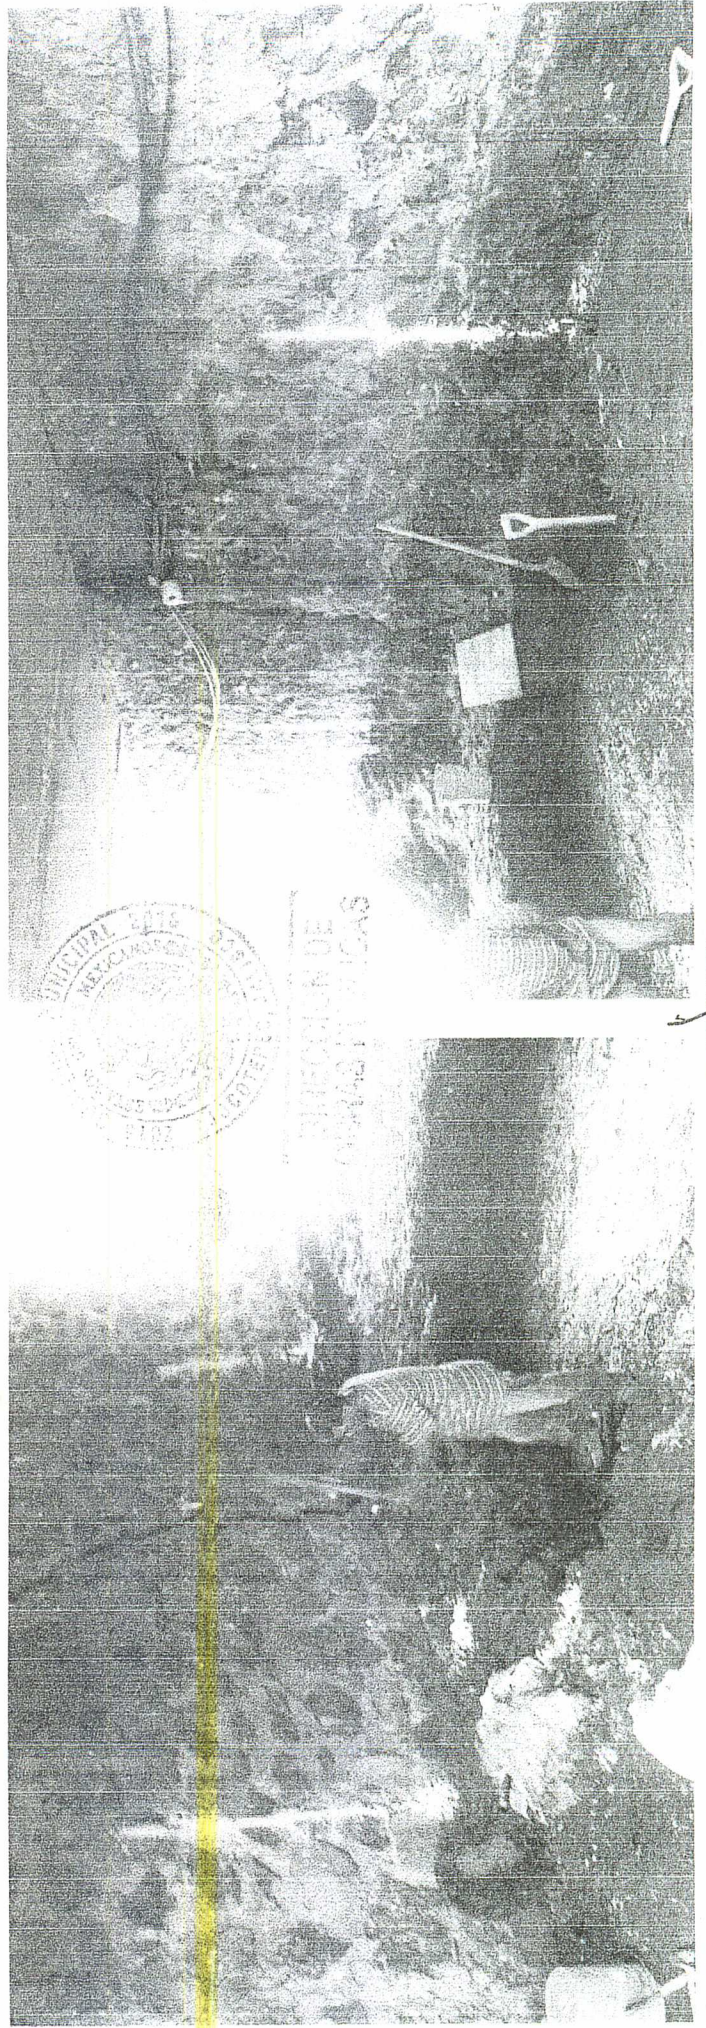

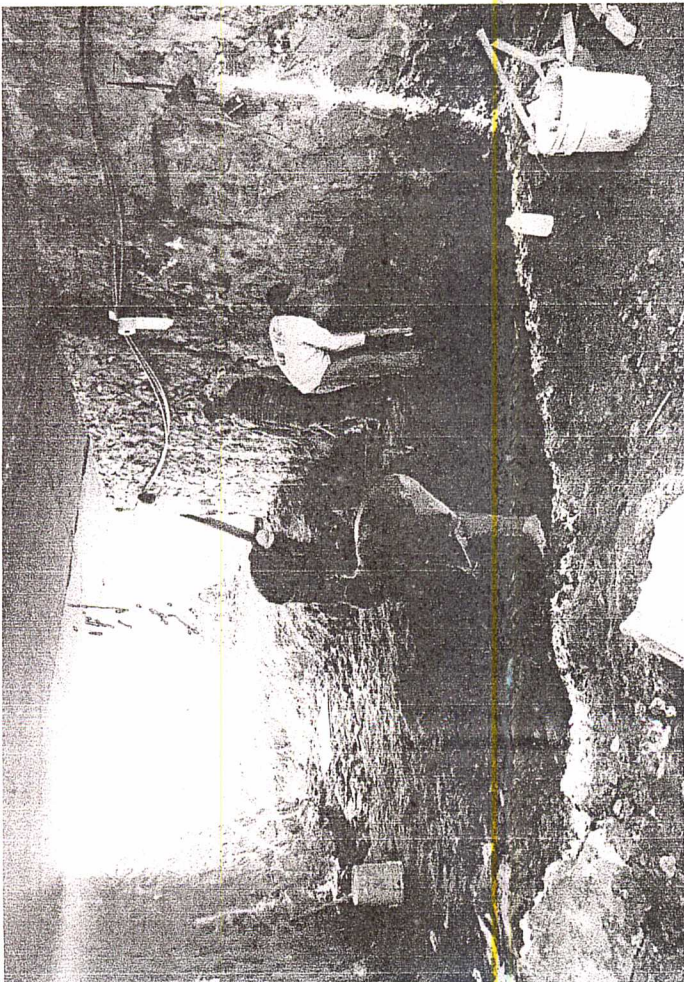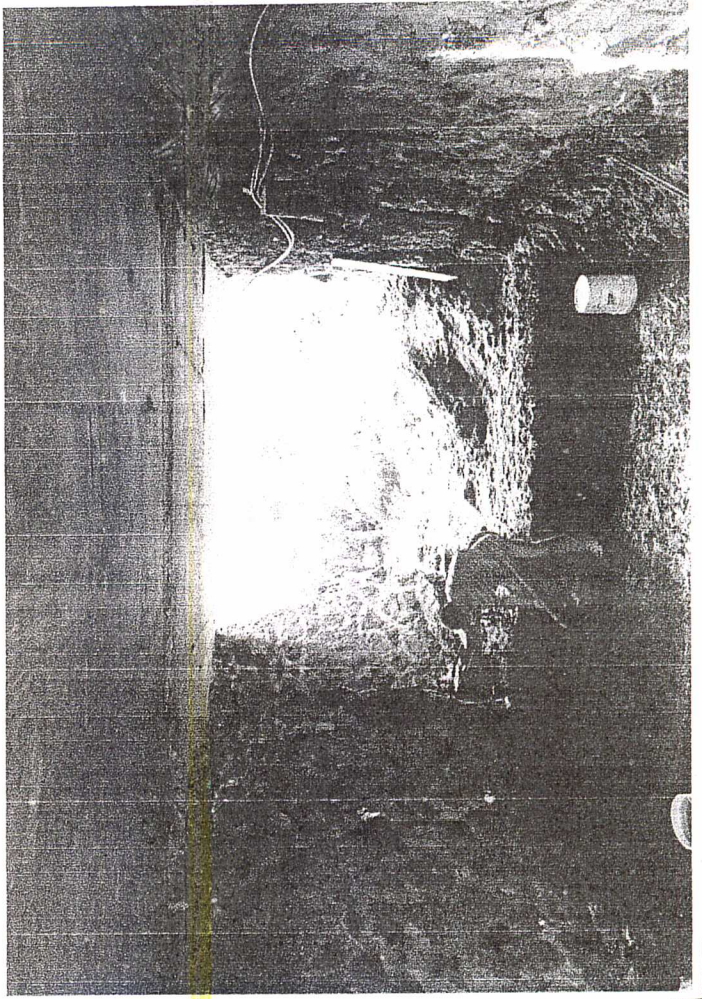

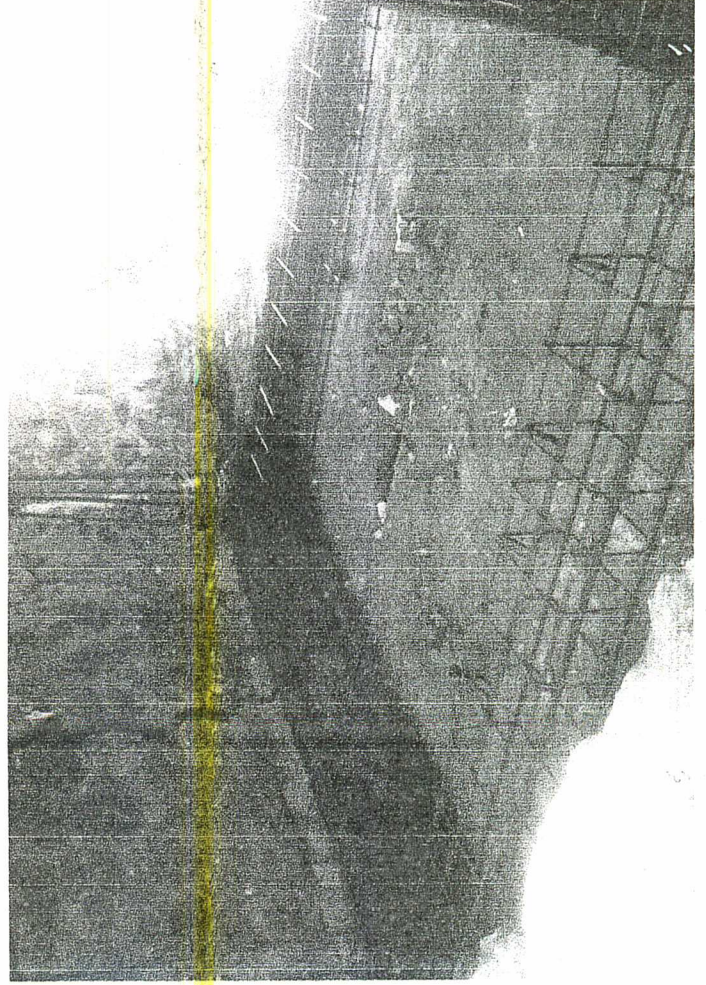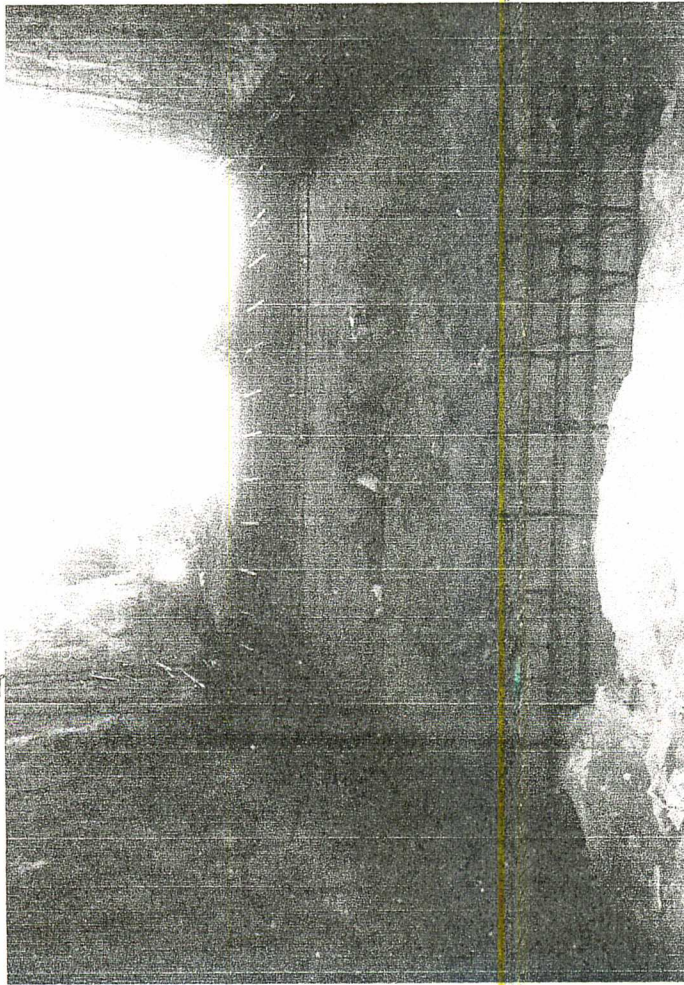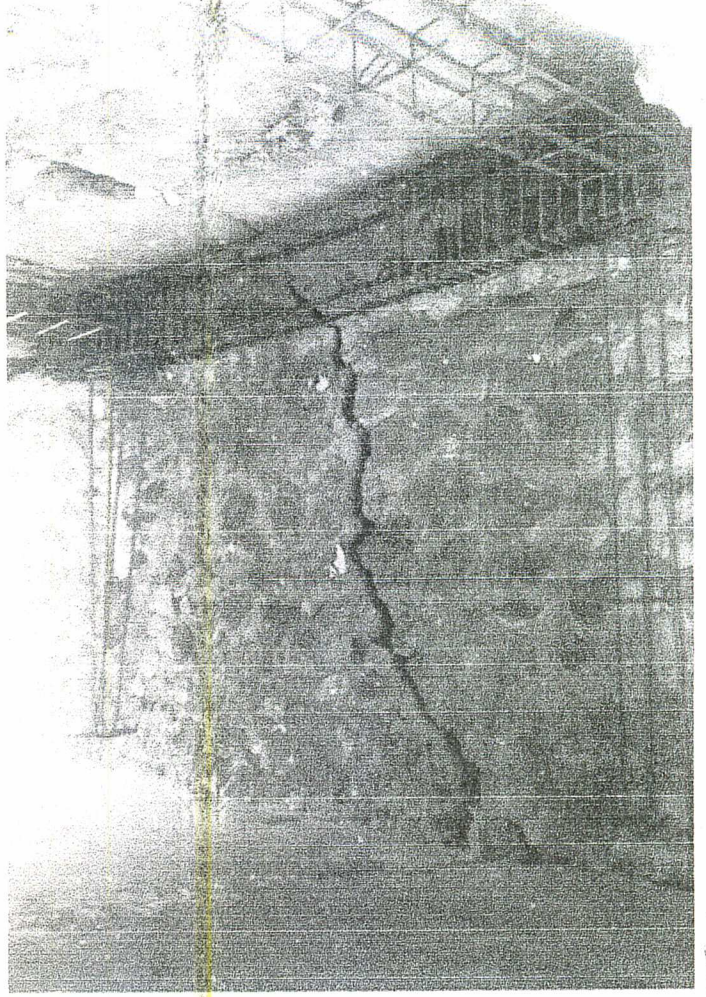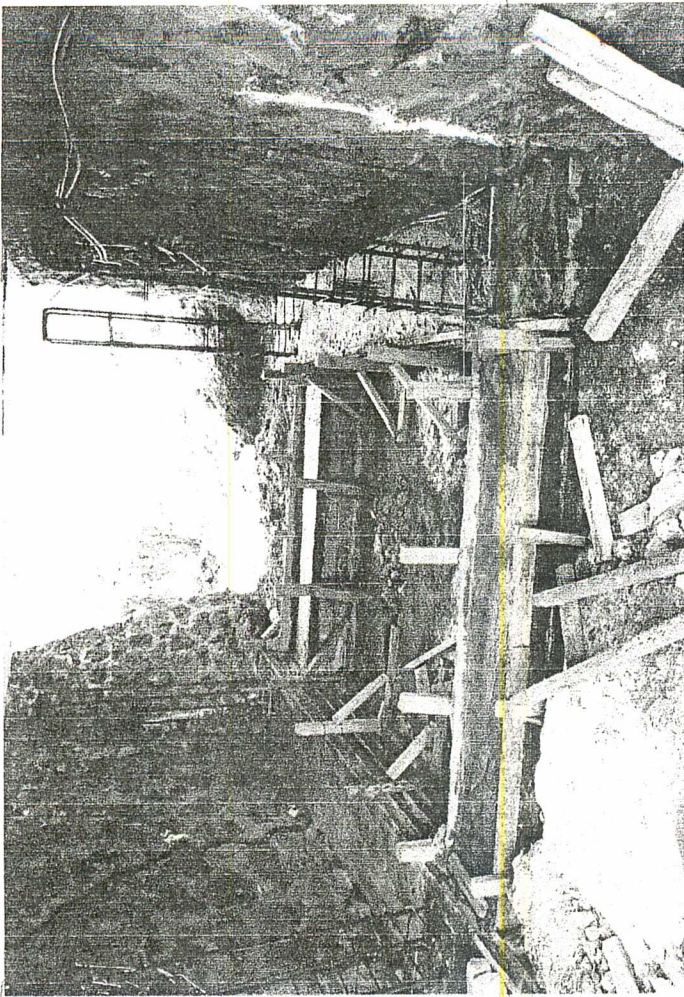

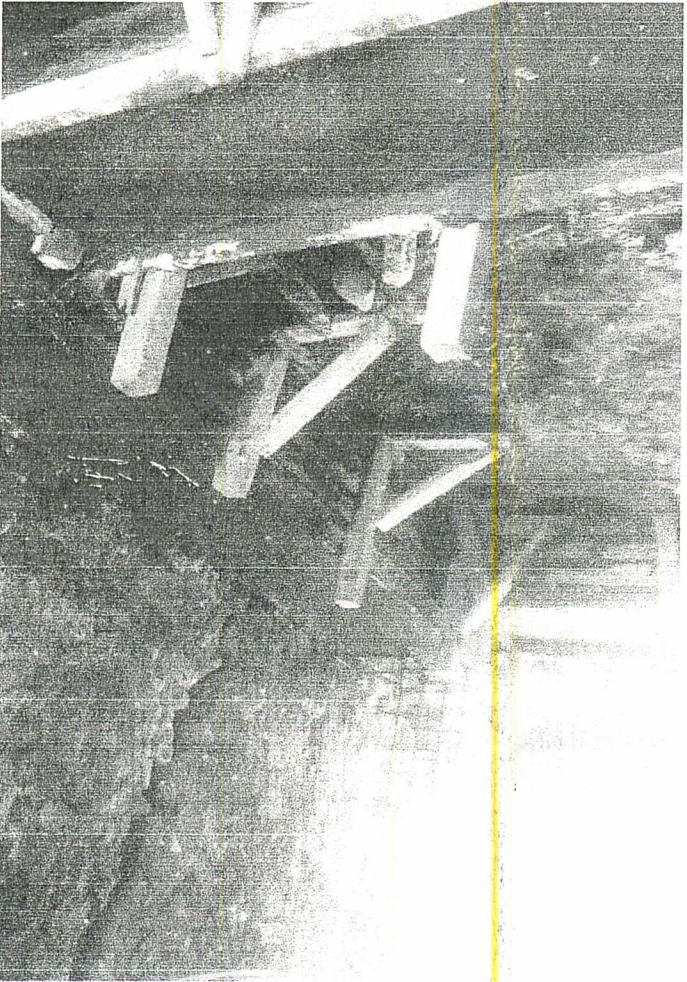



MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
 RAMIREZ
 GALLARDO,
 JOAQUIN
 DOMICILIO
 C BENITO JUAREZ 405
 COL 5 DE MAYO 46730
 AHUALULCO DE MERCADO, JAL.
 CLAVE DE ELECTOR RMLJQ73070914H600
 CURP RAGJ730709HJCMLQ04 AÑO DE REGISTRO 1991 02
 ESTADO 14 MUNICIPIO 003 SECCIÓN 0027
 LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2016 VIGENCIA 2026

FECHA DE NACIMIENTO
 09/07/1973
 SEXO H



Joaquin Ramirez Gallardo

EDMUNDO JACOBO MOLINA
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL
 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1474158422<<0027053366368
 7307096H2612317MEX<02<<06751<4
 RAMIREZ<GALLARDO<<JOAQUIN<<<<<
