

INFORMES MENSUAL DICIEMBRE 2018

PROYECTO

“Adaptación y equipamiento de la Línea 1 del Sistema del Tren Eléctrico Urbano (SITEUR), para Mejorar la Accesibilidad de las Personas con Discapacidad, FOTRADIS 2018”

CONTRATO GCONS/O.P./037/2018

“Adaptación y remodelación de los ingresos a las estaciones de túnel de la línea uno del Tren Eléctrico Urbano para mejorar la accesibilidad de las personas con discapacidad”

TABLA AVANCE DE OBRA

INFORME MENSUAL DICIEMBRE 2018 (CORTE 27 DE DICIEMBRE DE 2018)*

OBRA PUBLICA: Adaptación y remodelación de los ingresos a las estaciones de tunel de la línea 1 del tren eléctrico urbano para mejorar la accesibilidad de las personas con discapacidad

No. DE CONTRATO: GCONS/O.P./037/2018 y convenio modificatorio GCONS/CONV/MOD/40-BIS/2018

PROVEEDOR: Constructora Fontes y Asociados S.A. de C.V.

MONTO TOTAL (CON IVA): \$ 31,799,590.90

PLAZO DE EJECUCIÓN: 125 días naturales incluye prórroga autorizada con convenio modificatorio

INICIO: miércoles, 29 de agosto de 2018

FIN: lunes, 31 de diciembre de 2018

PORCENTAJE DE AVANCE FISICO

No.	ESTACION	PRELIMINARES ELEVADORES	ESTRUCTURA PARA ELEVADOR	ELEVADOR	TOTEM		PLACAS BRAILLE	SERVOESCALERAS	OBRA ELECTRICA ELEVADORES	GUÍAS PODOTÁCTILES	RAMPAS ELEVADORES	RAMPAS SERVOESCALERAS	OBRA ELECTRICA SERVOESCALERAS	REDUC GALIBO DE ANDI
					OBRA CIVIL	EQUIPO								
1	DIVISION DEL NORTE	0.62%	3.21%	4.37%	0.37%	1.02%	0.02%	6.02%	1.56%	1.71%	1.09%	0.56%	1.05%	0.
2	AVILA CAMACHO	0.62%	3.21%	3.93%	0.37%	1.02%	0.02%	4.51%	1.56%	1.20%	1.07%	0.06%	1.05%	0.
3	MEZQUITAN	0.62%	3.21%	3.50%	0.37%	1.02%	0.02%	4.51%	1.56%	1.20%	1.07%	0.06%	1.05%	0.
4	REFUGIO	0.62%	3.21%	3.93%	0.37%	1.02%	0.02%	4.51%	1.56%	1.20%	1.07%	0.06%	1.05%	0.
5	JUAREZ 1	0.62%	3.21%	3.93%	0.37%	1.02%	0.02%	4.51%	1.56%	1.20%	1.07%	0.06%	1.05%	0.
6	MEXICALTZINGO	0.62%	3.21%	3.93%	0.37%	1.02%	0.02%	4.51%	1.56%	1.20%	1.07%	0.06%	1.05%	0.
7	WASHINGTON	0.62%	3.21%	3.93%	0.37%	1.02%	0.02%	4.51%	1.56%	1.20%	1.07%	0.06%	1.05%	0.
8	PERIFERICO NORTE	0.62%	3.21%	3.93%	0.37%	1.02%	0.02%	4.51%	1.56%	1.20%	1.07%	0.06%	1.05%	0.
9	DERMATOLÓGICO	0.62%	3.21%	3.93%	0.37%	1.02%	0.02%	4.51%	1.56%	1.20%	1.07%	0.06%	1.05%	0.
10	ATEMAJAC	0.62%	3.21%	3.93%	0.37%	1.02%	0.02%	4.51%	1.56%	1.20%	1.07%	0.06%	1.05%	0.
11	SANTA FLORENTINA	0.62%	3.21%	3.93%	0.37%	1.02%	0.02%	4.51%	1.56%	1.20%	1.07%	0.06%	1.05%	0.
12	UNIDAD DEPORTIVA	0.62%	3.21%	3.93%	0.37%	1.02%	0.02%	4.51%	1.56%	1.20%	1.07%	0.06%	1.05%	0.
13	URDANETA	0.62%	3.21%	3.93%	0.37%	1.02%	0.02%	4.51%	1.56%	1.20%	1.07%	0.06%	1.05%	0.
14	18 DE MARZO	0.62%	3.21%	3.93%	0.37%	1.02%	0.02%	4.51%	1.56%	1.20%	1.07%	0.06%	1.05%	0.
15	ISLA RAZA	0.62%	3.21%	3.93%	0.37%	1.02%	0.02%	4.51%	1.56%	1.20%	1.07%	0.06%	1.05%	0.
16	PATRIA	0.62%	3.21%	3.93%	0.37%	1.02%	0.02%	4.51%	1.56%	1.20%	1.07%	0.06%	1.05%	0.
17	ESPAÑA	0.62%	3.21%	3.93%	0.37%	1.02%	0.02%	4.51%	1.56%	1.20%	1.07%	0.06%	1.05%	0.
18	SANTUARIO MCR	0.62%	3.21%	3.93%	0.37%	1.02%	0.02%	4.51%	1.56%	1.20%	1.07%	0.06%	1.05%	0.
		2.46%	12.82%	15.29%	2.92%	8.15%	0.18%	18.05%	6.24%	8.37%	4.27%	0.22%	4.19%	2.
% TOTAL DE AVANCE REAL (PRORRATEO POR EST.)														
% TOTAL DE AVANCE PROGRA														

NOTAS:

En proceso de instalación y puesta en operación de los elevadores; se están recibiendo las guías podotáctiles y rampas servoescaleras para su instalación. Placas braille y rampas de andén

* Informe preliminar de diciembre 2018 en espera de terminación de obra y recepción de la misma para integrar reporte final




Estación Mexicaltzingo

Instalación de pasamanos para rampa en interior de estación
DICIEMBRE



Estación Washington

Instalación de conducción eléctrica para iluminación de Tótem
DICIEMBRE

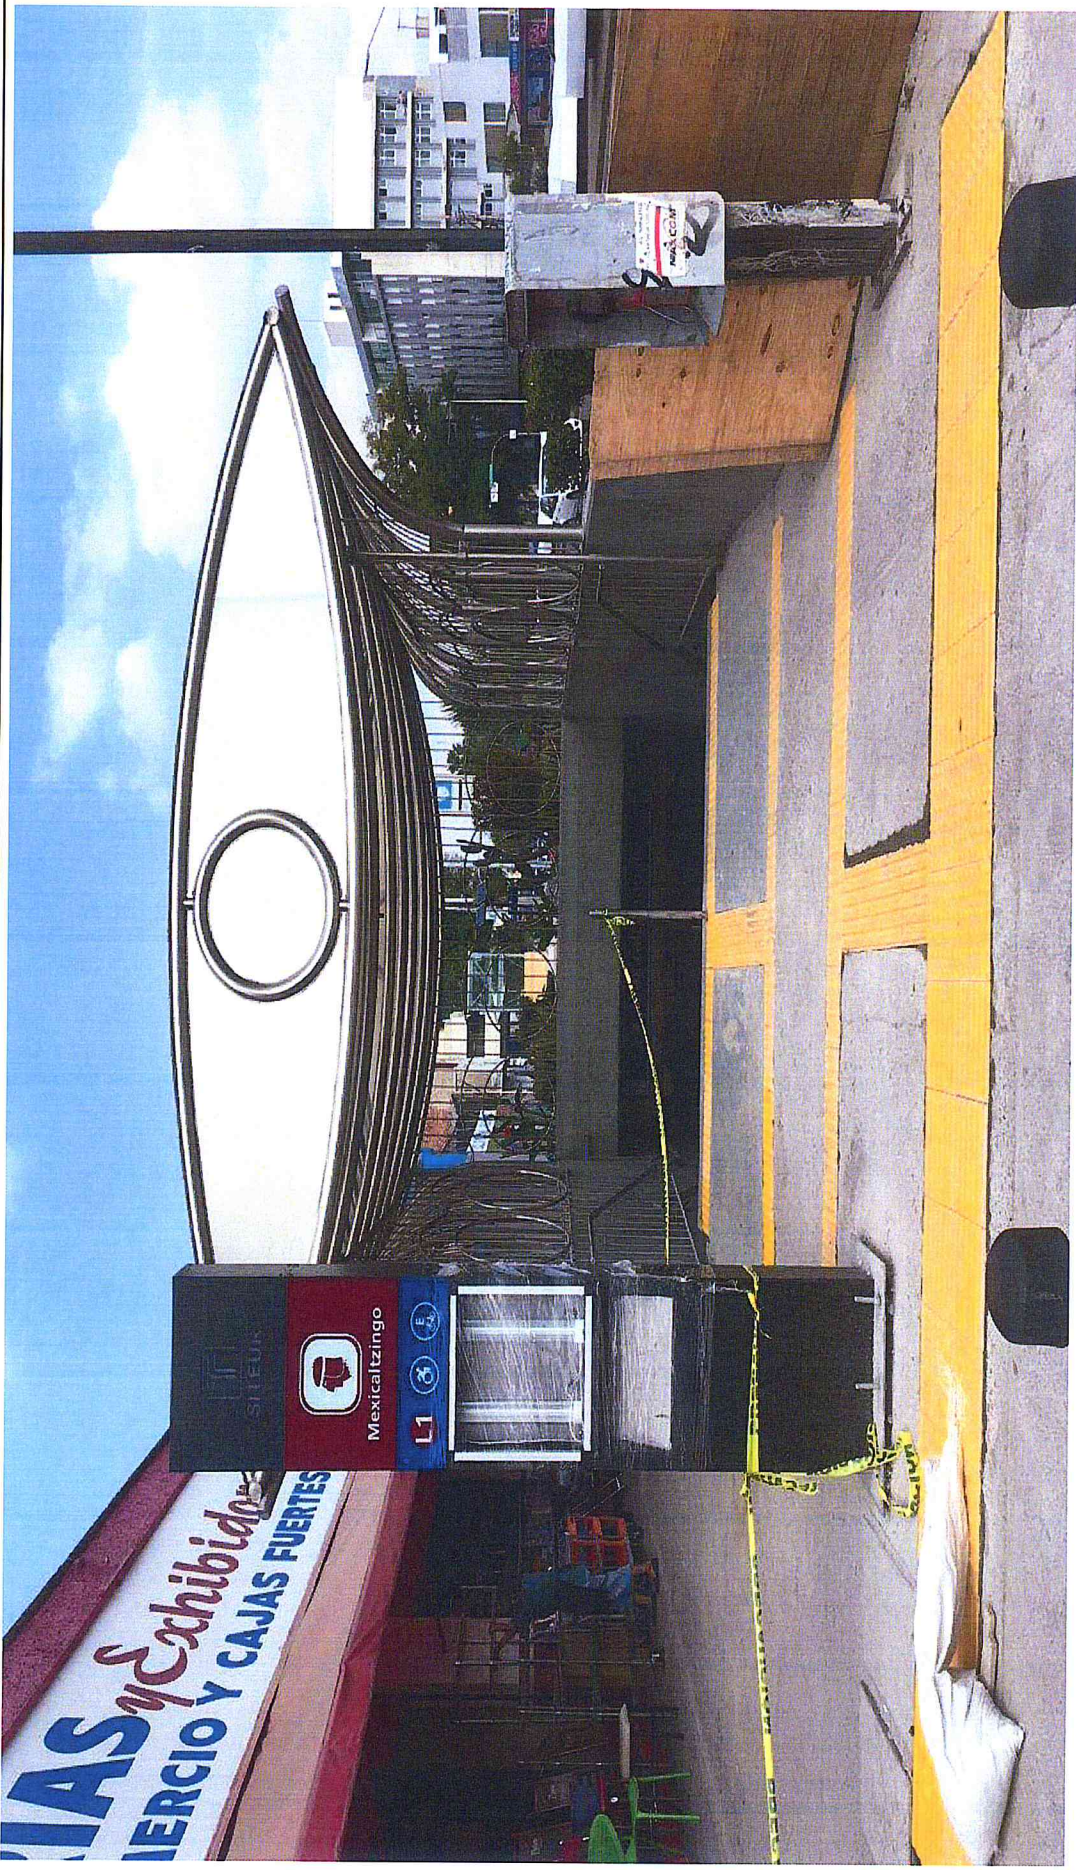

Estación Mexicaltzingo
Instalación de Guía Podotáctil
DICIEMBRE



Estación Mexicaltzingo

Detallado general y limpieza final de la obra


DICIEMBRE



Estación Periférico Norte
Instalación Tótem informativo
DICIEMBRE



Estación Washington
Suministro de Reductor de Gálbo
DICIEMBRE

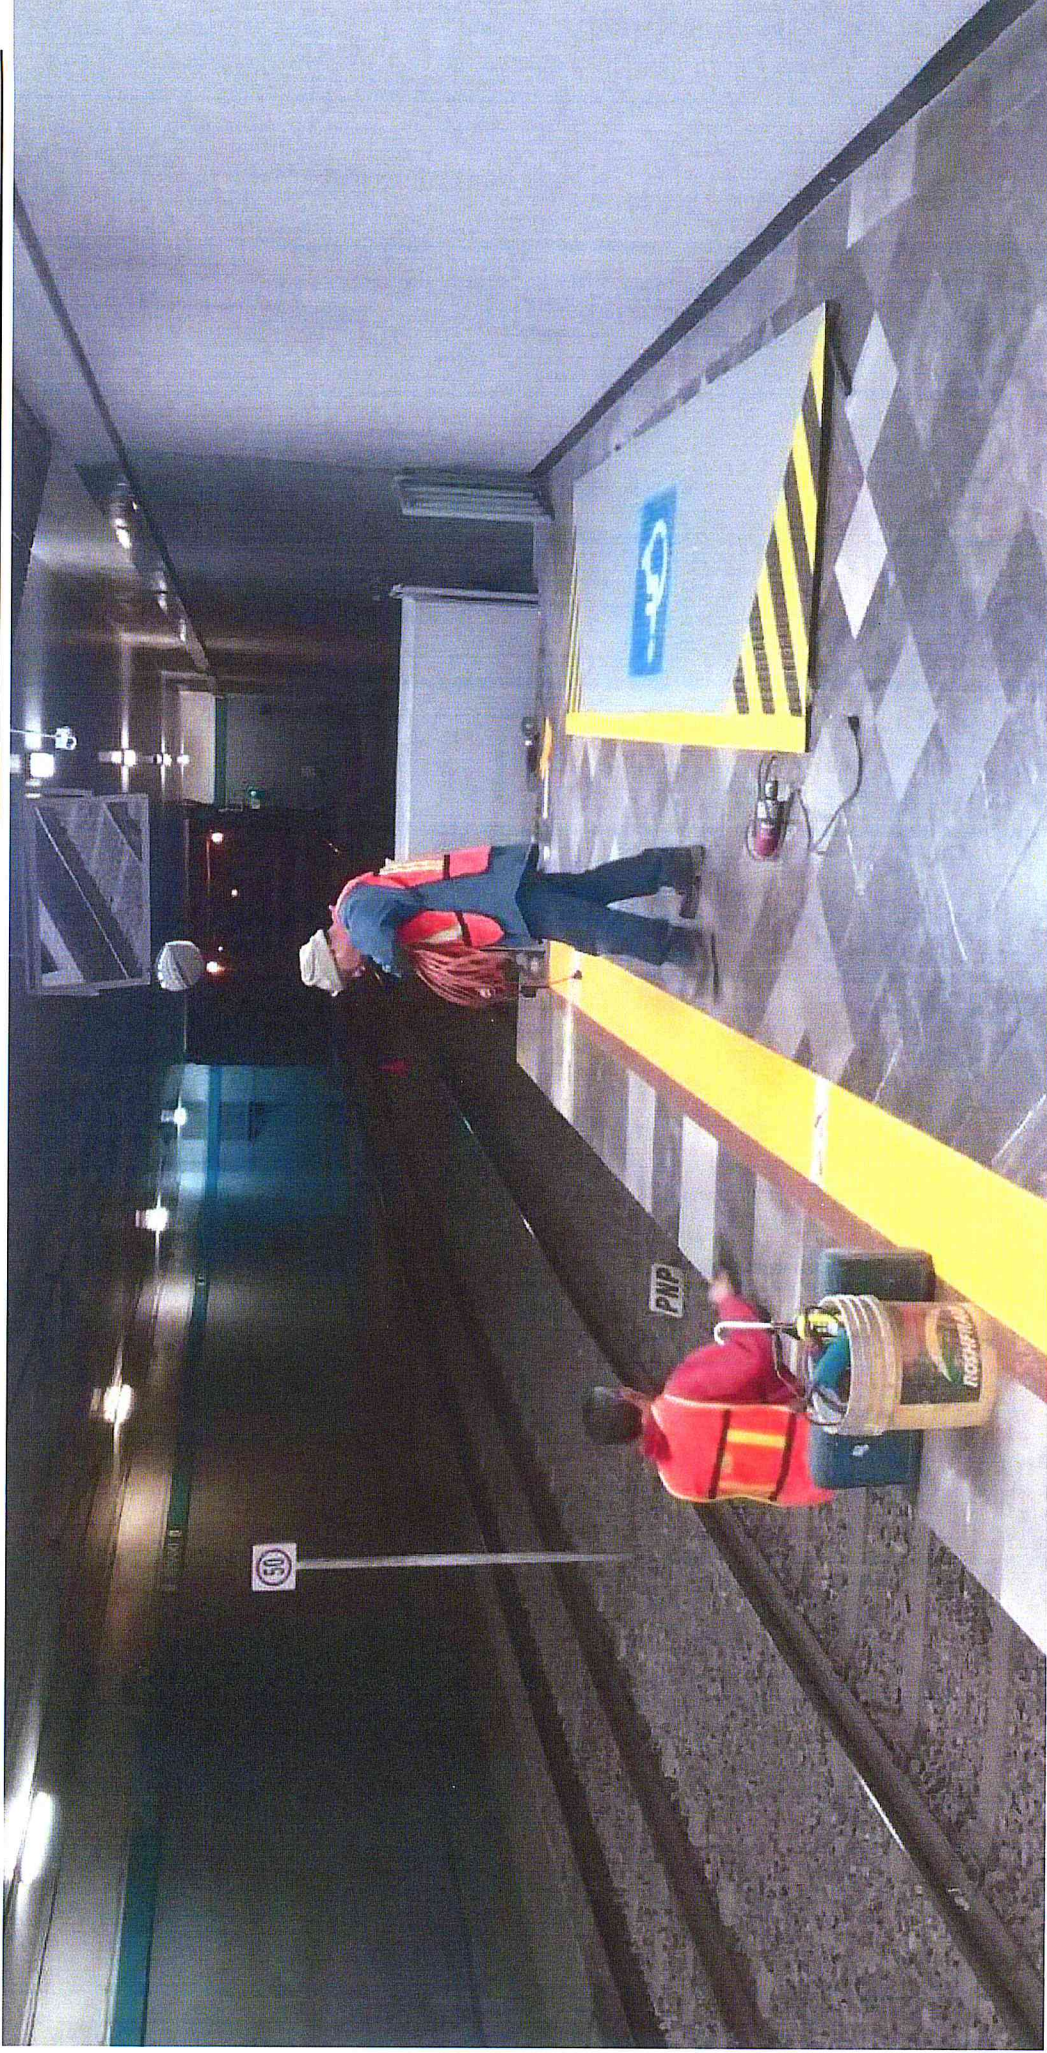

Estación Refugio
Instalación de Reductor de Gálbo
DICIEMBRE



Estación División del Norte

Suministro de Reductor de Gálibo
DICIEMBRE
