

**ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO
DEL CONTRATO NÚMERO CEA-UEAS-RP-AD-042-2018**

**ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO
DEL CONTRATO NÚMERO CEA-UEAS-RP-AD-042-2018, SUSCRITOS ENTRE LA
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y EL CONTRATISTA [REDACTED] 1
[REDACTED] PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS CONSISTENTES
EN "ESTUDIO AMBIENTAL PARA LA AMPLIACIÓN DE LA PTAR EL AHOGADO".**

I. LUGAR, HORA Y FECHA. - LA PRESENTE ACTA SE CELEBRA EN LAS OFICINAS DE CEA DE
AV. BRASILIA NO. 2970, SIENDO LAS **17:00 HRS** HORAS DEL 06 DE OCTUBRE DE 2018. -----

II. PARTICIPANTES. -EN ESTE ACTO SE REUNIERON POR PARTE DE LA COMISIÓN
ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO EL RESIDENTE AMBIENTAL Y SUPERVISOR DE OBRA, EL
BIÓL. ALFREDO FRÍAS CASTRO; POR PARTE DE LA CONTRATISTA EL [REDACTED] 1
[REDACTED] EL C. BIÓL. [REDACTED] PARA LLEVAR A 1
CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA. -----

III. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS. –

*SE REALIZÓ EL ESTUDIO AMBIENTAL PARA LA AMPLIACIÓN DE LA PTAR EL AHOGADO, EL
CUAL PRESENTA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:*

1ER INFORME PARCIAL:

Análisis documental:

Revisión de autorización en Material de Impacto Ambiental Vigente.

Revisión de información condición actual del proyecto.

Revisión de Actualización Socioeconómica Ampliación PTAR El Ahogado.

Revisión de Legislación aplicable.

0000001

2DO INFORME PARCIAL:

Con base en la legislación vigente, se llevó a cabo la Integración del documento (Producto)
para realizar la gestión en Materia Ambiental, ante la SEMARNAT, para la incorporación de un
nuevo módulo de saneamiento por 750 litros por segundo (lps).


ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DEL CONTRATO NÚMERO CEA-UEAS-RP-AD-042-2018

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS MUNICIPALES "EL AHOGADO"		
Construcción de 3 módulos en primera etapa		
Construcción de un 4to módulo en la segunda etapa (después del año 2010)		
Capacidad por modulo de 380 lps.		
La construcción de esta planta, implica las obras y actividades que a continuación		
OBRAS Y ACTIVIDADES	CANTIDAD	CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Cárcamo de bombeo de agua cruda	1 unidad	Capacidad de almacenamiento 675 m3
Construcción de canales de cribado	2 unidades	Rejillas automáticas
Instalación de desarenadores	4 unidades	Centrifugo tipo vortex
Construcción de zanjas de oxidación	8 unidades	Largo: 105.6 m Ancho: 33.6 m Profundidad: 5 m Gasto: 190 lps
Instalación de sedimentador	2 unidades	Geometría: Circular. Diámetro: 42 m Gasto: 380 lps
Construcción de filtros	24 unidades	Medio filtrante: arena - antracita. Profundidad 6 m Ancho: 4.2 m Largo: 7.5 m
Construcción de digestor de lodos	2 unidades	Largo: 17 m Ancho: 17 m Profundidad 5m Gasto: 182 lps.
Instalación de espesador de lodos	2 unidades	Geometría: circular. Volumen: 175 m Diámetro 9m
Construcción de caseta para deshidratación de lodos	1 unidad	Superficie 340 m2
Unidad de desinfección	2 unidades	Tipo con cloro en forma de Hipoclorito de Sodio Gasto: 380 lps
Instalación de filtros prensa	4 unidades	Capacidad de carga por equipo 90-680 Kg/hr-m
Construcción de edificio de servicios	1 unidad	Superficie: 130 m2
Construcción de laboratorio	1 unidad	Superficie 118 m2
Construcción de caseta de vigilancia	1 unidad	Superficie: 17 m2
Construcción de vialidades internas	10,606 m2	Empedrado en seco : 3,360 m2. Pavimento o banquetas de Concreto: 7,246 m2
Instalación de cerca perimetral	4,000 m	Malla galvanizada con tubo galvanizado y alambre de púas
Despalme y desmonte	10.5 ha	
Subestación eléctrica	1 unidad	5,000 KVA


0000002

**ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO
DEL CONTRATO NÚMERO CEA-UEAS-RP-AD-042-2018**

PROYECTO ACTUAL PTAR EL AHOGADO

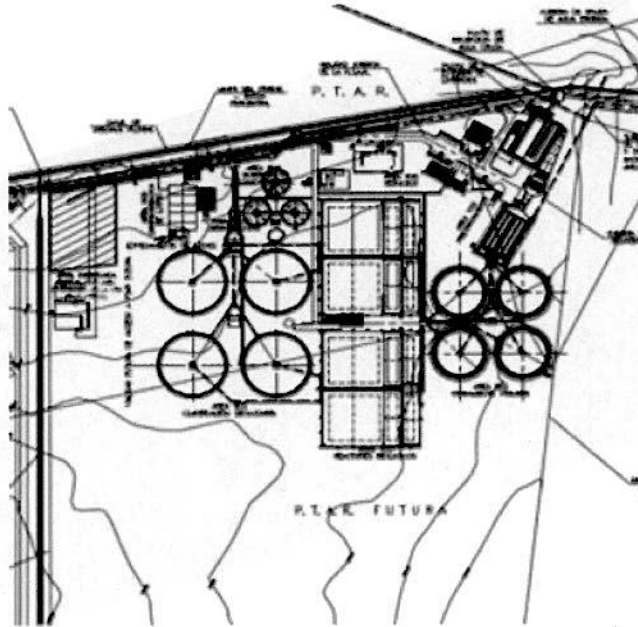

AMPLIACIÓN PTAR EL AHOGADO

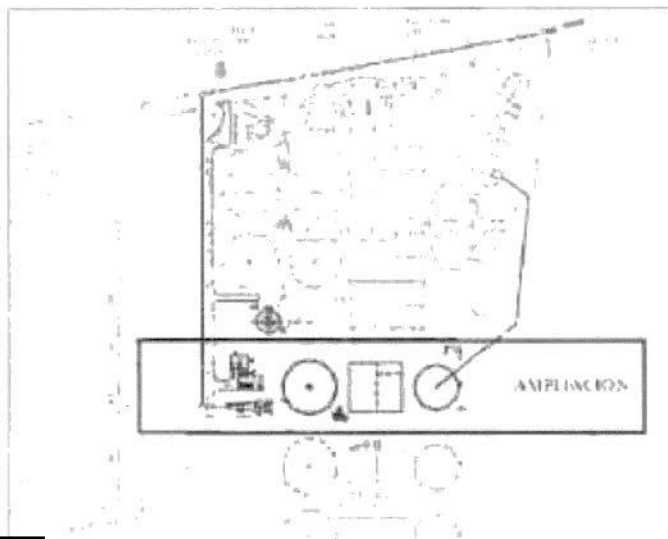

0000003

**ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO
DEL CONTRATO NÚMERO CEA-UEAS-RP-AD-042-2018**

IV. IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DE LOS TRABAJOS. -MONTO CONTRATADO: \$258,340.61 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 61/100 M.N.), MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE \$41,334.50 (CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 50/100 M.N.), QUEDANDO UN IMPORTE POR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS LA CANTIDAD DE \$299,675.11(DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 11/100 M.N.).

V. PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.-EN LA CLÁUSULA TERCERA, SE ESTIPULÓ UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 90 DÍAS NATURALES, SEÑALANDO COMO FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS EL DÍA 09 DE JULIO DEL 2018 Y COMO FECHA DE TERMINACIÓN EL DÍA 06 DE OCTUBRE DE 2018.-

VI. RELACIÓN DE ESTIMACIONES. -DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE TRAMITARON 2 DOS ESTIMACIONES 1 FINIQUITO, LAS CUALES SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

No. DE ESTIMACIÓN	PERIODO		IMPORTE	IMPORTE CON LETRA
	DE	A		
Anticipo			\$74,918.78	SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS 78/100 M.N.
1	09-Jul-2018	08-Ago-2017	\$50,714.25	CIENCUENTA MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS 25/100 M.N.
2	09-Ago-2018	19-Sep-2018	\$ 87,597.34	OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 34/100 M.N.
3	20-Sep-2018	28-Sep-2018	\$ 49,561.66	CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS 66/100 M.N.
*4 (Finiquito)	29-Sep-2018	06-Oct-2018	\$36,883.08	TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 08/100 M.N.
	TOTAL EJERCIDO		\$299,675.11	DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y

**ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO
DEL CONTRATO NÚMERO CEA-UEAS-RP-AD-042-2018**

			CINCO PESOS 11/100 M.N.
	SALDO POR CANCELAR	\$0.00	CERO PESOS 00/100 M.N.

NOTA. - LOS IMPORTES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

**ESTIMACIÓN EN TRÁMITE DE COBRO*

VII. LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN LA APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES O DEL SOBRECOSTO. -----

VIII. DATOS DE LA ESTIMACIÓN FINAL. (DATOS GENERALES DE LA CARÁTULA DE ESTIMACIÓN). MONTO DE LA ESTIMACIÓN: \$42,394.35CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 35/100 M.M. NO INCLUYE IVA.;MONTO AMORTIZACIÓN: \$10,598.59DIEZ MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 59/100 M.N.SALDO: \$31,795.76TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS78/100 M.N. I.V.A.\$5,087.32CINCO MIL OCHENTA Y SIETE PESOS 32/100 M.N.NETOTOTAL \$36,883.08TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 08/100 M.N

IX. VICIOS OCULTOS. -PARA GARANTIZAR LOS SERVICIOS EJECUTADOS POR DEFECTOS O VICIOS OCULTOS DERIVADOS DE LOS TRABAJOS, Y EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 53 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, EL CONTRATISTA ENTREGÓ GARANTÍA CONSISTENTE EN UNA FIANZA EXPEDIDA POR AFIANZADORA ASERTA, S.A. de C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA CON NÚMERO DE FIANZA 3502-11980-5PARA GARANTIZAR POR 12 (DOCE) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ACTA, DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES CONTRACTUALES Y LA LEGISLACIÓN APLICABLE.-----

X.-MANIFESTACIONES DE LAS PARTES.- LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, POR CONDUCTO DE LA UNIDAD EJECUTORA DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE LA ZONA CONURBADA DE GUADALAJARA DE LA DIRECCION GENERAL, LEVANTA LA PRESENTE ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO DE REFERENCIA DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE.-----

0000005

**ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO
DEL CONTRATO NÚMERO CEA-UEAS-RP-AD-042-2018**

XI.-CIERRE DEL ACTA.- NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL EVENTO SIENDO LAS 17:00HORAS DEL DÍA 06 DE OCTUBRE DE 2018.-----

XII.-NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO:

**POR LA COMISION ESTATAL DEL
AGUA DE JALISCO**


**BIÓL. ALFREDO FRÍAS CASTRO
RESIDENTE SUPERVISOR DE
OBRA**

POR LA CONTRATISTA




**ADMINISTRADOR GENERAL
UNICO**

TESTIGO



CONSULTOR.

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DEL CONTRATO CEA-UEAS-RP-AD-042-2018CELEBRADO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS CONSISTENTES EN"ESTUDIO AMBIENTAL PARA LA AMPLIACIÓN DE LA PTAR EL AHOAGADO", ENTRE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y EL CONTRATISTA 

0000006

Fecha de clasificación: 11 de Noviembre de 2021

Clasificación de Información Confidencial

Confidencial: Se eliminó: Nombre₁, Firma₂ y Rúbrica₃ de los particulares que aparecen en el presente documento.

Fundamento legal: Artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación con el Artículo 116° de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por tratarse de información confidencial.

This image shows a full page of a document template designed for handwriting practice. It features a series of evenly spaced, horizontal dashed lines across the entire width of the page. The background is plain white, and there are no margins, text, or other markings present.
