

CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

**Ixtlahuacán de los
Membrillos**

Juanacatlán

**Tlajomulco de
Zúñiga**

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

**XIX SESIÓN ORDINARIA
DEL
COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN E
INVERSIÓN DEL “FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE GUADALAJARA”**

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a las 11:00 horas del 01 de Junio de 2011, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Desarrollo Urbano, se llevó a cabo la Sesión Ordinaria XVIII, con los siguientes participantes: **L.C.P. M. Eréndira Ruíz Machuca**, Directora General de Egresos de la Secretaría de Finanzas y Presidente del Comité Técnico de Evaluación de Proyectos; **Lic. Gilda Vanessa López Mena**, Directora Jurídica y de Gestoría Municipal de la Dirección General de Desarrollo Municipal de la Secretaría General de Gobierno y suplente ante el Comité Técnico; **Arq. Alfonso Javier Sámano Sevilla**, Director General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo Institucional de la Secretaría de Desarrollo Urbano y suplente ante el Comité Técnico; **Arq. Héctor Pérez Camarena**, Director General de Planeación Urbana y Territorial de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Secretario Técnico Suplente del C.Z.M.G. y suplente ante el Comité Técnico; **Lic. Carlos Leal**, Director de Área de Vinculación y Seguimiento de la Secretaría de Planeación y suplente ante el Comité Técnico; **Ing. Enrique León Zepeda**, Director de Planeación Urbana Metropolitana de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vocal Ejecutivo del C.Z.M.G. y suplente ante el Comité Técnico; **Ing. Jorge Gastón González Alcerreca**, Director General de Verificación y Control de la Obra de Contraloría del Estado y titular ante el Comité Técnico; **Lic. María Guadalupe Pichardo Goby**, Directora de Evaluación Institucional y Sectorial de la COPLADE y suplente ante el Comité Técnico; **Lic. María Luisa Gabriela Ramírez Oliva**, Delegada Estatal de Banobras y titular ante el Comité Técnico; **Biol. Isidro de Jesús Lucio Virrueta**, Subdelegado de Gestión de la Delegación Federal en Jalisco de la SEMARNAT; **Lic. Laura Eliezer Alcantar Díaz**, Jefa de la Unidad de Desarrollo Urbano de la Secretaría de Desarrollo Urbano; bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. Bienvenida
2. Autorización de los Avances Físicos – Financieros 2008
3. Autorización de los Avances Físicos – Financieros 2009
4. Autorización de los Avances Físicos – Financieros 2010
5. Reporte Fotográfico
6. Autorización del informe del estado financiero BANOBRAS
7. Asuntos Varios
 - Solicitud al titular de la Unidad Programática de Control Presupuestal de la Subsecretaría de Egresos de la SHCP, de los recursos financieros 2011 del Fondo Metropolitano
 - Comunicado a C. Presidente Municipal de Guadalajara
 - Reglas de Operación vigentes
 - Determinación de los estados financieros del fideicomiso

PUNTO 1. Bienvenida


La L.C.P. M. Eréndira Ruíz Machuca, Directora General de Egresos dio la bienvenida a los asistentes y cedió la palabra al Arq. Héctor Pérez Camarena, Director General de Planeación Urbana y Territorial de la SEDEUR, quien procedió a desahogar el orden del día.

En cumplimiento a lo anterior, el Ing. Enrique León Zepeda, comunica a nombre de las instancias responsables de la operación y de los reportes:

Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel. 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-02

Tel: 38-19-23-07
38-19-23-06
Ext. 7568
Fax: 38-19-23-06
Ext. 7581



CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

Ixtlahuacán de los
Membrillos

Juanacatlán

Tlajomulco de
Zúñiga

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

PUNTO 2. Reporte de Avances Físicos – Financieros 2008

El Ing. Enrique León Zepeda, informa los Avances Financieros correspondientes a las acciones 2008, contenidos en el siguiente cuadro:


NOMBRE DE LA OBRA	INVERSIÓN TOTAL								SALDO POR CONTRATAR	EJERCIDO	SALDO DE OBRAS EN PROCESO	SALDO DE OBRAS FINICIONADAS	AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO
	1	2	3	4	5	6	7	8							
SISTEMA ANILLO PERIFÉRICO Y VIALIDADES ALIMENTADORAS	\$80,356,353.31	\$32,770,051.40	\$5,488,123.91	\$92,286,857.49	\$39,277,800.96	\$4,374,944.40	98%	94%							
Ejecución de Infraestructura Vial y Peatonal															
Regulación, Adquisición de Suelo y Pago de Adelantos en el Anillo Periférico, desde Av. 8 de Julio hasta Camino a Colimilla, incluyendo la modernización.	\$37,941,790.57	\$37,941,790.57	\$0.00	\$37,288,946.08	\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$642,844.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	98.31%	100.00%
Continuación de la construcción de terracerías, obras complementarias, pavimentación y señalamientos en el Periférico Oriente, tramo San Martín de las Flores - El Verde a Carretera Libre a Zapopan, en los municipios de El Salto y Tlaquepaque	\$187,705,613.80	\$187,705,613.80	\$0.00	\$187,189,871.63	\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$522,042.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	99.72%	100.00%
Conclusión de Grapa Sur del Nudo tunelar - Periférico, en el Sistema Anillo Periférico, en el municipio de Zapopan	\$100,159,938.02	\$100,159,938.02	\$0.00	\$79,715,751.25	\$20,444,186.77	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$4,900,442.02	\$0.00	\$0.00	79.59%	96.00%
Construcción de Retorno deprimido en el Anillo Periférico y Av. Deportivo tramo sur, en el municipio de Tlaquepaque	\$23,879,680.91	\$23,879,680.91	\$0.00	\$23,879,680.91	\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%
Terminación de laterales en Nudo Colón - Periférico, en el Sistema Anillo Periférico, en el municipio de Tlaquepaque	\$74,232,943.29	\$74,232,943.29	\$0.00	\$73,265,069.76	\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$987,854.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	98.70%	100.00%
Construcción de nudo y obras complementarias del Nudo San Isidro (Las Cañadas) - Periférico en el sistema Anillo Periférico, en el municipio de Zapopan	\$138,091,566.30	\$138,091,566.30	\$0.00	\$138,131,124.28	\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$4,900,442.02	\$0.00	\$0.00	95.45%	100.00%
Construcción del Nudo Tramo II Ferrocarril - Periférico, en el Sistema Anillo Periférico, en el municipio de Tlaquepaque	\$61,623,509.89	\$61,623,509.89	\$0.00	\$61,623,509.89	\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%
Construcción de Nudo El Verde - Periférico, en el Sistema Anillo Periférico, en el municipio de El Salto	\$92,806,706.12	\$92,806,706.12	\$0.00	\$87,959,383.10	\$4,837,323.02	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$4,837,323.02	\$0.00	\$0.00	94.79%	100.00%
Construcción del Nudo Carretera Libre a Zapopan - Periférico, en el Sistema Anillo Periférico, en los municipios de El Salto y Tlajomulco de Zúñiga	\$9,465,002.54	\$9,465,002.54	\$0.00	\$9,465,002.54	\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%
Ampliación y modernización a 6 carriles del Anillo Periférico Sur, tramo Calle Ahualulco del Mercado a Av. Tonatlecas, en el municipio de Tonalá	\$141,974,128.83	\$141,974,128.83	\$0.00	\$138,732,385.32	\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,241,763.51	\$0.00	98.42%	100.00%
Trabajos urgentes de conservación periódica y rutinaria sobre el Periférico de Guadalajara	\$11,063,665.71	\$11,063,665.71	\$0.00	\$11,063,665.71	\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%
Nudo Periférico - Carretera Chapala	\$62,748,839.64	\$62,748,839.64	\$0.00	\$48,983,462.57	\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$3,765,367.07	\$0.00	\$0.00	92.86%	100.00%
Construcción de Puentes Peatonales	\$42,631,309.89	\$39,142,635.98	\$3,488,273.91	\$34,749,624.52	\$4,393,011.46	\$0.00			\$3,488,273.91	\$0.00	\$4,393,011.46	\$0.00	\$0.00	81.51%	90.00%
TOTAL	\$80,356,353.31	\$32,770,051.40	\$5,488,123.91	\$92,286,857.49	\$39,277,800.96	\$4,374,944.40			\$39,277,800.96	\$4,374,944.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	95.94%	100.00%
OBRAS HIDRAULICAS METROPOLITANAS															
Construcción de obras de mejoramiento en el Canal Santa Catalina en el Municipio de Zapopan	\$181,453,047.51	\$181,453,047.51	\$0.00	\$180,516,066.69	\$936,960.62	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	99.46%	100.00%
TOTAL GENERAL	\$1,161,718,822.82	\$1,158,229,078.91	\$3,489,273.91	\$1,114,577,293.35	\$39,277,800.96	\$4,374,944.40			\$39,277,800.96	\$4,374,944.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	95.94%	100.00%

SALDO POR CONTRATAR = (1) MENOS (2)
 SALDO DE OBRAS EN PROCESO = (2) MENOS (4)
 SALDO DE OBRAS FINICIONADAS = (1) MENOS (4) = SALDO DISPONIBLE
 AVANCE FINANCIERO = (4) ENTRE (1)

Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel. 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-02

Tel. 38-19-23-07
38-19-23-06
Ext. 7568
Fax: 38-19-23-06
Ext. 7581



CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

Ixtlahuacán de los
Membrillos

Juanacatlán

Tlajomulco de
Zúñiga

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

PUNTO 3. Reporte de Avances Físicos – Financieros 2009

Asimismo se dio el informe correspondiente al avance financiero 2009, contenido en el siguiente cuadro:

NOMBRE DE LA OBRA	1	2	3	4	5	6	7	8
INVERSIÓN TOTAL	CONTRATADO	SALDO POR CONTRATAR	EJERCIDO	SALDO DE OBRAS EN PROCESO	SALDO DE OBRAS FINIQUITADAS	AVANCE FINANCIERO ABR/2011	AVANCE FÍSICO ABR/2011	
SISTEMA ANILLO PERIFÉRICO Y VIALIDADES ALIMENTADORAS	\$1,143,654,306.48	\$1,133,978,786.47	\$9,675,520.01	\$1,093,067,367.48	\$26,569,749.04	\$15,710,583.37	96%	99%
<i>Ejecución de Infraestructura Vial y Peatonal</i>								
Construcción del Puente sobre Av. López Mateos en el Sistema Lázaro Cárdenas	\$309,801,236.56	\$309,601,236.56	\$0.00	\$305,405,869.60	\$4,194,366.96	\$0.00	99%	100%
Construcción de la Primera Fase del Nudo El Tapatio - Fraccionamiento Revolución	\$120,000,000.00	\$117,318,527.58	\$2,681,472.42	\$115,426,529.55	\$1,691,998.03	\$0.00	96%	100%
Conclusión del Nudo Periférico - Carretera Libre a Zapotlanejo	\$69,884,519.26	\$69,884,519.26	\$0.00	\$64,426,362.38	\$5,458,126.88	\$0.00	92%	100%
Conclusión del Nudo Periférico - Belisario Domínguez	\$88,632,900.11	\$88,632,900.11	\$0.00	\$84,806,246.87	\$3,726,654.24	\$0.00	96%	100%
Construcción de la Primera Fase del Eoulador Tlaquepaque	\$41,423,731.73	\$41,423,731.73	\$0.00	\$40,382,037.77	\$1,031,693.96	\$0.00	98%	90%
Conservación y Modernización del Sistema Anillo Periférico	\$116,127,396.40	\$115,908,082.71	\$219,312.69	\$109,904,384.23	\$0.00	\$6,229,001.17	95%	100%
Conclusión de la ampliación a seis carriles del Periférico Oriente Tonalá	\$65,917,304.36	\$65,693,796.00	\$23,519.36	\$65,456,165.64	\$6,437,619.46	\$0.00	90%	100%
Canal y Colector Pluvial Nueva España	\$60,246,982.13	\$69,650,673.14	\$366,108.99	\$69,144,611.67	\$1,102,970.46	\$0.00	98%	100%
Construcción de obras de mejoramiento en el Canal Santa Catalina en el Municipio de Zapopan	\$125,961,251.90	\$125,961,251.80	\$0.00	\$119,173,548.20	\$6,787,703.61	\$0.00	95%	100%
Elaboración de estudios, regularización, adquisición de suelos, liberación de derechos de vía y pago de adeudos en el Anillo Periférico en sus tramos (I al VI), desde Av. 8 de Julio hasta Camino Colimilla y el ramo de Belisario Domínguez	\$45,000,000.00	\$43,625,181.14	\$1,374,818.86	\$43,303,519.43	\$321,661.71	\$0.00	96%	96%
Construcción de terracerías, obras complementarias, pavimentación y señalamientos en Periférico Oriente, tramo San Martín de las Flores-El Verde a Camaleira Libre a Zapotlanejo, en los Municipios de El Salto y Tlaquepaque (I), SEGUNDA ETAPA	\$14,500,000.00	\$14,500,000.00	\$0.00	\$14,075,479.34	\$0.00	\$423,520.66	97%	100%
Terminación de laterales en Nudo Colón - Periférico, en el Sistema Anillo Periférico, en el municipio de Tlaquepaque, SEGUNDA ETAPA	\$22,846,491.34	\$22,092,999.61	\$753,491.73	\$21,672,503.87	\$0.00	\$1,173,987.47	95%	100%
Construcción del Nudo Tramo Il Ferozcamil -Perif. en el Sistema Anillo Perif., en el mpio de Tlaquepaque, SEGUNDA ETAPA	\$28,725,228.00	\$28,725,228.00	\$0.00	\$28,725,228.00	\$0.00	\$0.00	100%	100%
Construcción de Nudo El Verde-Perif en el Sist Anillo Perif. en el mpio de El Salto, SEGUNDA ETAPA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%
Construcción de Puentes Peatonales (3) (Productos financieros)	\$34,867,266.90	\$30,650,469.63	\$4,226,796.97	\$27,152,843.03	\$3,507,626.60	\$0.00	78%	100%
TOTAL	\$1,143,654,306.48	\$1,133,978,786.47	\$9,675,520.01	\$1,093,067,367.48	\$26,569,749.04	\$15,710,583.37		

SALDO POR CONTRATAR = (1) MENOS (2)

SALDO DE OBRAS EN PROCESO = (2) MENOS (4)


SALDO DE OBRAS FINIQUITADAS = (1) MENOS (4) = SALDO DISPONIBLE

AVANCE FINANCIERO = (4) ENTRE (1)

Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel. 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-02

Tel. 38-19-23-07
38-19-23-06
Ext. 7568
Fax: 38-19-23-06
Ext. 7581



CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

Ixtlahuacán de los
Membrillos

Juanacatlán

Tlajomulco de
Zúñiga

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

PUNTO 4. Reporte de Avances Físicos – Financieros 2010

Avances Financieros correspondientes a las acciones 2010, contenidos en el siguiente cuadro continua informando el Ing. Enrique León Zepeda:

NOMBRE DE LA OBRA	INVERSIÓN TOTAL	CONTRATADO	SALDO POR CONTRATAR	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO ABR/2011	AVANCE FÍSICO ABR/2011
SISTEMA ANILLO PERIFÉRICO Y VIALIDADES ALIMENTADORAS						
Ejecución de Infraestructura Vial y Peatonal						
Construcción del Puente sobre Avenida López Mateos en el Sistema Lázaro Cárdenas, Segunda Etapa, en el Municipio de Guadalajara.	\$151,251,156.90	\$151,251,156.90	\$0.00	\$128,501,169.10	85%	100%
Construcción de la Primera Fase del Nudo El Tapatio - Fraccionamiento Revolución, Segunda Etapa, en el Municipio de Tlaquepaque.	\$105,000,000.00	\$91,135,647.46	\$13,864,352.54	\$78,139,289.89	74%	98%
Construcción de la Solución Vial San Ignacio-Niño Obrero, Primera Etapa, en el Municipio de Zapopan.	\$160,000,000.00	\$99,852,986.87	\$60,147,013.13	\$40,503,091.54	25%	81%
Conclusión del Nudo Periférico - Carretera Libre a Zapotlanejo, Segunda Etapa, en el Municipio de Tonalá.	\$30,000,000.00	\$28,474,009.44	\$1,525,990.56	\$24,736,732.12	82%	100%
Construcción del Nudo Periférico - Belisario Domínguez, Segunda Etapa, en el Municipio de Guadalajara.	\$50,000,000.00	\$37,349,331.72	\$12,650,668.28	\$32,666,770.11	65%	98%
Construcción del Nudo Periférico - Colón, Primera Etapa, en el Municipio de Tlaquepaque.	\$51,446,522.73	\$51,446,522.73	\$0.00	\$32,615,986.90	63%	55%
Elaboración de acciones específicas para la regularización, adquisición de suelo y obras para la conclusión del Tramo IV: Carretera Libre a Zapotlanejo-Autopista Zapotlanejo, Tramo V: Autopista a Zapotlanejo-Camino a Colimilla, y modernización del anillo Periférico	\$165,000,000.00	\$142,533,964.46	\$22,466,035.54	\$142,533,964.46	86%	86%
Construcción del nudo Circunvalación - Juan Pablo II, Primera Etapa, en el Municipio de Guadalajara.	\$50,000,000.00	\$2,070,600.00	\$47,929,400.00	\$2,044,500.00	4%	0%
Construcción de la Prolongación de la Avenida Colón, Segunda Etapa. En el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga.	\$18,839,183.00	\$17,489,953.61	\$1,349,219.39	\$9,715,586.49	52%	44%
SUBTOTAL ANILLO PERIFÉRICO Y VIALIDADES ALIMENTADORAS	\$781,555,852.63	\$621,624,183.19	\$159,932,679.44	\$491,476,093.61	63%	74%
TRANSFERENCIA MUNICIPIOS *						
Construcción del Paso a Deseñvel Circunvalación - Ávila Camacho, Primera Etapa, en el Municipio de Guadalajara	\$60,000,000.00	\$60,000,000.00	\$0.00	\$60,000,000.00	100%	0%
Construcción del Nudo Vial Las Juntas, Primera Etapa, en el Municipio de Tlaquepaque	\$81,000,000.00	\$81,000,000.00	\$0.00	\$81,000,000.00	100%	0%
SUBTOTAL MUNICIPIOS	\$141,000,000.00	\$141,000,000.00	\$0.00	\$141,000,000.00		
PRODUCTOS FINANCIEROS	\$922,566,862.63	\$762,634,183.19	\$159,932,679.44	\$632,476,093.61	0%	0%
TOTAL	\$934,223,084.79	\$762,634,183.19	\$171,588,901.60	\$632,476,093.61		

SALDO POR CONTRATAR = (1) MENOS (2)

SALDO DE OBRAS EN PROCESO = (1) MENOS (4)

SALDO DE OBRAS FINALIZADAS = (1) MENOS (4) = SALDO DISPONIBLE


AVANCE FINANCIERO = (4) ENTRE (1)

* RECURSOS TRANSFERIDOS AL MUNICIPIO MEDIANTE CONVENIO. ANEXO CON AVANCES.

Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel. 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-02

Tel. 38-19-23-07
38-19-23-06
Ext. 7568
Fax: 38-19-23-06
Ext. 7581



CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

**Ixtlahuacán de los
Membrillos**

Juanacatlán

**Tlajomulco de
Zúñiga**

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

PUNTO 5. Reporte Fotográfico de Avance de Obras

Se presentó y entregó a los miembros del Comité Técnico reporte fotográfico de Avance de obras al 26 de Mayo de 2011.

PUNTO 6. Autorización del Informe del Estado Financiero BANOBRAS

La Lic. Ma. Luisa Gabriela Ramírez Oliva, Delegada Estatal de BANOBRAS, informó el estado de posición financiera al 30 de Abril 2011, el cual es el siguiente:

Patrimonio:

Los recursos federales del fondo metropolitano que se han transferido al estado de Jalisco conforme a lo siguiente:

Recursos ejercicio 2008

Aportaciones del Fideicomitente (Gov. del Estado)		1,100'518,864.69
26 Jun 08	214'092,954.86	
09 Jul 08	306'472,364.81	
01 Ago 08	289'925,000.00	
08 Sep 08	175'600,000.00	
07 Oct 08	113'909,680.33	
21 Ene 09 INTERESES	518,864.69	
Intereses generados por la inversión del patrimonio a Abril 2011		61'199,488.13
TOTAL		1,161'718,352.82

Recursos ejercicio 2009

Aportaciones del Fideicomitente (Gov. del Estado)		1,100'210,180.56
19 Feb 09	445'095,180.56	
20 Mzo 09	160'000,000.00	
21 Abr 09	230'115,000.00	
18 May 09	110'000,000.00	
18 Jun 09	90'000,000.00	
18 Jul 09	45'000,000.00	
20 Ago 09	20'000,000.00	
Intereses generados por la inversión del patrimonio a Abril 2011		43'444,125.92
TOTAL		1,143'654,306.48

Recursos ejercicio 2010

Aportaciones del Fideicomitente (Gov. del Estado)		919'988,255.89
20 Jul 10	290'000,000.00	
02 Sep 10	150'000,000.00	
01 Oct 10	205'000,000.00	
03 Nov 10	153'000,000.00	
01 Dic 10	121'839,183.00	
INTERESES	149,072.89	
Intereses generados por la inversión del patrimonio a Abril 2011		14'234,828.90
TOTAL		934'223,084.79

Total recurso aportados al Fideicomiso


Aportaciones del Fideicomitente (Gov. del Estado)		3,120'717,301.14
Recursos aportados 2008	1,100'518,864.69	
Recursos aportados 2009	1,100'210,180.56	
Recursos aportados 2010	919'988,255.89	
Intereses generados por la inversión del patrimonio		118'878,442.95
Intereses generados 2008	61'196,174.69	
Intereses generados 2009	43'444,125.92	
Intereses generados 2010	14'234,828.90	
Intereses generados cuenta de cheques	3,313.44	
Total recursos aportados al Fideicomiso		3,239'595,744.09

Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel: 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-02

Tel: 38-19-23-07
38-19-23-06
Ext. 7568
Fax: 38-19-23-06
Ext. 7581

Handwritten signatures and initials in blue ink are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.



CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

**Ixtlahuacán de los
Membrillos**

Juanacatlán

**Tlajomulco de
Zúñiga**

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

Aplicaciones patrimoniales:

- Las erogaciones que ha registrado el Fideicomiso, para atender los requerimientos de la entidad ejecutora para la atención de las acciones u obras autorizadas por este Comité Técnico se encuentran conformadas al 30 de Abril de 2011 por la cantidad de \$2,841'521,393.13 estando integradas de la siguiente manera:
- Pagos a contratistas con recursos 2008 por la cantidad de \$1,116'812,781.46 de acuerdo a las siguientes acciones:

Recurso ejercicio 2008

Obras y acciones	Total operado
Elaboración de acciones específicas para la regulación, adquisición de suelos y pago de adeudos en el Anillo Periférico desde Av. 8 de Julio hasta Camino a Colimilla, incluyendo modernización	37'298,946.09
Continuación de la construcción de terracerías, obras complementarias, pavimentación y señalamientos en el Periférico Oriente, tramo San Martín de las Flores – El Verde a Carretera Libre a Zapotlanejo, en los municipios de El Salto y Tlaquepaque	187'538,882.24
Conclusión de Grapa Sur del Nodo Tutelar – Periférico, en el sistema Anillo Periférico, en el municipio de Zapopan	79'714,877.52
Construcción de retorno deprimido en el Anillo Periférico y Av. Deportivo tramo sur, en el municipio de Tlaquepaque	29'879,690.91
Terminación de laterales en Nodo Colón – Periférico, en el sistema Anillo Periférico en el municipio de Tlaquepaque	73'265,088.76
Construcción de nodo y obras complementarias del Nodo San Isidro (Las Cañadas) – Periférico en el sistema Anillo Periférico en el municipio de Zapopan*	133'135,561.65
Construcción del Nodo tramo II Ferrocarril – Periférico, en el sistema Anillo Periférico, en el municipio de Tlaquepaque	61'623,509.89
Construcción de Nodo El Verde – Periférico en el sistema Anillo Periférico, en el municipio de El Salto	87'969,383.10
Construcción del Nodo Carretera Libre a Zapotlanejo – Periférico en el sistema Anillo Periférico, en los municipios de El Salto y Tlajomulco de Zúñiga	10'867,247.10
Ampliación y modernización a 6 carriles a Anillo Periférico Sur, tramo calle Ahualulco del Mercado a Av. Tonaltecas, en el municipio de Tonalá	140'212,529.39
Trabajos urgentes de conservación periódica y rutinaria sobre el Periférico Sur de Guadalajara	11'063,665.24
Nodo Periférico – Carretera Chapala	48'984,517.87
Construcción de puentes peatonales	34'743,892.82
Construcción de obras de mejoramiento en el Canal Santa Catalina en el municipio de Zapopan	180'514,988.88
Suma pago a contratistas al 30 de Abril de 2011, con recursos 2008	1,116'812,781.46
Porcentaje	96%

- Pagos a contratistas con recursos de 2009 por la cantidad de \$1,087'189,377.58 por la ejecución de proyectos, acciones y obras públicas de infraestructura y su equipamiento de conformidad con el acuerdo No. 03 de fecha 11 de Diciembre de 2008, mismos que se desglosan de la siguiente manera:

Recurso ejercicio 2009

Obras y acciones	Total operado
Construcción del puente sobre Av. López Mateos en el sistema Lázaro Cárdenas	305'412,390.11
Construcción de la primera fase del Nodo El Tapatio – Fraccionamiento Revolución	111'784,485.02
Conclusión del Nodo Periférico – Carretera Libre a Zapotlanejo	63'874,894.94
Conclusión del Nodo Periférico – Belisario Domínguez	84'816,027.56
Construcción de la primera fase del Boulevard Tlaquepaque	40'399,853.53
Conservación y Modernización del Sistema Anillo Periférico	109'894,172.45
Conclusión de la ampliación a seis carriles del Periférico Oriente (Tonalá)	58'105,038.11
Continuación de acciones en Canal Santa Catalina	119'174,635.99
Canal y colector pluvial Nueva España	59'144,611.70
Elaboración de estudios, regulación, adquisición de suelos, liberación de derechos de vía y pago de adeudos en el Anillo Periférico en sus tramos (I al V) desde Av. 8 de Julio hasta Camino a Colimilla y el tramo Belisario Domínguez	43'303,519.43
Construcción de terracerías, obras complementarias, pavimentación y señalamiento en	13'729,174.23


Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel: 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-02

Tel: 38-19-23-07
38-19-23-06
Ext. 7568
Fax: 38-19-23-06
Ext. 7581

Handwritten signature

Handwritten signatures and scribbles at the bottom of the page.



CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

Ixtlahuacán de los
Membrillos

Juanacatlán

Tlajomulco de
Zúñiga

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

Periférico Oriente, tramo San Martín de las Flores – El Verde a Carretera Libre a Zapotlanejo en los municipios de El Salto y Tlaquepaque (1) segunda etapa	
Terminación de laterales en Nodo Colón – Periférico, en el Sistema Anillo Periférico en el municipio de Tlaquepaque, segunda etapa	21'672,503.86
Construcción del Nodo Tramo Ferrocarril – Periférico, en el Sistema Anillo Periférico, en el municipio de Tlaquepaque, segunda etapa	28'725,227.60
Construcción de puentes peatonales (productos financieros)	27'152,843.03
Suma pago a contratistas al 28 de Febrero de 2011, con recursos 2009	1,087'189,377.56
Porcentaje	95%

- Pagos a contratistas con recursos de 2010 por la cantidad de \$636'110,765.82 por la ejecución de proyectos, acciones y obras públicas de infraestructura y su equipamiento de conformidad con el acuerdo de fecha 21 de Mayo de 2010, mismos que se desglosan de la siguiente manera:

Recurso ejercicio 2010

Obras y acciones	Total operado
Construcción del Puente sobre Av. López Mateos en el sistema Lázaro Cárdenas	128'500,510.60
Construcción de la segunda etapa del Nodo El Tapatio – Fraccionamiento Revolución	81'768,427.44
Construcción de la solución vial San Ignacio – Niño Obrero, primera etapa, mpio de Zapopan	40'503,091.54
Conclusión del Nodo Periférico – Carretera Libre a Zapotlanejo, municipio de Tonalá	24'736,675.44
Construcción del Nodo Periférico – Belisario Domínguez, 2da. Etapa, en Guadalajara	32'692,013.98
Construcción del Nodo Periférico – Colón, 1era. Etapa, en Tlaquepaque	32'615,985.87
Construcción del Nodo Periférico – Santa Esther, 1era. Etapa, en Zapopan	0.00
Elaboración de acciones específicas para la regulación, adquisición de suelos y pago de adeudos para la conclusión del Anillo Periférico	142'533,964.46
Construcción del Nodo Circunvalación – Juan Pablo II, 1era. Etapa, en Guadalajara	2'044,500.00
Construcción de paso a desnivel Circunvalación – Avila Camacho, 1era etapa, en Guadalajara	60'000,000.00
Construcción del Nodo Vial Las Juntas, 1era. Etapa, en Tlaquepaque	81'000,000.00
Construcción de la prolongación de la Av. Colón, 2da. Etapa, en Tlajomulco	9'715,596.49
Suma pago a contratistas al 28 de Febrero de 2011, con recursos 2010	636'110,765.82
Porcentaje es en relación al monto autorizado	68%

Aplicaciones patrimoniales:

Concepto	Monto ejercido	Porcentaje
Pago a contratistas con recursos PEF 2008	1,116'812,781.46	96%
Pago a contratistas con recursos PEF 2009	1,087'189,377.56	95%
Pago a contratistas con recursos PEF 2010	636'110,765.82	68%
Honorarios fiduciarios	1'334,811.95	0%
Honorarios por auditoría al fideicomiso	47,612.00	
Comisiones pagadas	26,044.34	
Total aplicaciones patrimoniales	2,841'521,393.13	88%
Retenciones 5% al millar a la Contraloría del Estado	9'630,817.77	
Retenciones 2% al millar a la CMIC	1'419,701.05	


Resumen de ingresos y egresos

Ingresos totales		3,239'595,744.09
Aportaciones del fideicomitente (Gov. del Estado)	3,120'717,301.14	
Recursos aportados 2008	1,100'518,864.69	
Recursos aportados 2009	1,100'210,180.56	
Recursos aportados 2010	919'988,255.89	
Otros ingresos	118'878,442.95	
Intereses de las aportaciones		
Recursos 2008	61'199,488.13	
Recursos 2009	43'444,125.92	
Recursos 2010	14'234,828.90	
Egresos		2,841'521,393.13
Pagos a contratistas recursos 2008	1,116'812,781.46	
Elaboración de acciones específicas para la regulación, adquisición de suelos y pago de adeudos en el Anillo Periférico desde Av. 8 de Julio hasta Camino a Colimilla, incluyendo modernización	37'298,946.09	
Continuación de la construcción de terracerías, obras complementarias, pavimentación y señalamientos en el Periférico Oriente, tramo San Martín de las Flores – El Verde a Carretera Libre a Zapotlanejo, en los municipios de El Salto y Tlaquepaque	187'538,882.24	
Conclusión de Grapa Sur del Nodo Tutelar – Periférico, en el	79'714,877.52	

Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel. 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-02

Tel. 38-19-23-07
38-19-23-06
Ext. 7568
Fax: 38-19-23-06
Ext. 7581



CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

Ixtlahuacán de los
Membrillos

Juanacatlán

Tlajomulco de
Zúñiga

Tlaquepaque

Tonalá


Zapopan

sistema Anillo Periférico, en el municipio de Zapopan		
Construcción de retorno deprimido en el Anillo Periférico y Av. Deportivo tramo sur, en el municipio de Tlaquepaque	29'879,690.91	
Terminación de laterales en Nodo Colón – Periférico, en el sistema Anillo Periférico en el municipio de Tlaquepaque	73'265,088.76	
Construcción de nodo y obras complementarias del Nodo San Isidro (Las Cañadas) – Periférico en el sistema Anillo Periférico en el municipio de Zapopan*	133'135,561.65	
Construcción del Nodo tramo II Ferrocarril – Periférico, en el sistema Anillo Periférico, en el municipio de Tlaquepaque	61'623,509.89	
Construcción de Nodo El Verde – Periférico en el sistema Anillo Periférico, en el municipio de El Salto	87'969,383.10	
Construcción del Nodo Carretera Libre a Zapotlanejo – Periférico, en el sistema Anillo Periférico, en los municipios de El Salto y Tlajomulco de Zúñiga	10'867,247.10	
Ampliación y modernización a 6 carriles a Anillo Periférico Sur, tramo calle Ahualulco del Mercado a Av. Tonaltecas, en el municipio de Tonalá	140'212,529.39	
Trabajos urgentes de conservación periódica y rutinaria sobre el Periférico Sur de Guadalajara	11'063,665.24	
Nodo Periférico – Carretera Chapala	48'984,517.87	
Construcción de puentes peatonales	34'743,892.82	
Construcción de obras de mejoramiento en el Canal Santa Catalina en el municipio de Zapopan	180'514,988.88	
Pagos a contratistas recursos 2009		1,087'189,377.56
Construcción del puente sobre Av. López Mateos en el sistema Lázaro Cárdenas	305'412,390.11	
Construcción de la primera fase del Nodo El Tapatio – Fracc. Revolución	111'784,485.02	
Conclusión del Nodo Periférico – Carretera Libre a Zapotlanejo	63'874,894.94	
Conclusión del Nodo Periférico – Belisario Domínguez	84'816,027.56	
Construcción de la primera fase del Blvd. Tlaquepaque	40'399,853.53	
Conservación y Modernización del Sistema Anillo Periférico	109'894,172.45	
Conclusión de la ampliación a seis carriles del Per. Ote. (Tonalá)	58'105,038.11	
Continuación de obras de mejoramiento en el Canal Santa Catalina, municipio de Zapopan	119'174,635.99	
Canal y colector pluvial Nueva España	59'144,611.70	
Elaboración de estudios, regulación, adquisición de suelos, liberación de derechos de vía y pago de adeudos en el Anillo Periférico en sus tramos (I al V) desde Av. 8 de Julio hasta Camino a Colimilla y el tramo Belisario Domínguez	43'303,519.43	
Construcción de terracerías, obras complementarias, pavimentación y señalamiento en Periférico Oriente, tramo San Martín de las Flores – El Verde a Carretera Libre a Zapotlanejo en los municipios de El Salto y Tlaquepaque (1) segunda etapa	13'729,174.23	
Terminación de laterales en Nodo Colón – Periférico, en el Sistema Anillo Periférico en el municipio de Tlaquepaque, segunda etapa	21'672,503.86	
Construcción del Nodo Tramo Ferrocarril – Periférico, en el Sistema Anillo Periférico, en el municipio de Tlaquepaque, segunda etapa	28'725,227.60	
Construcción de Nodo el Verde – Periférico en el Sistema Anillo Periférico, en el municipio de El Salto, segunda etapa	---	
Construcción de puentes peatonales (productos financieros)	27'152,843.03	
Pagos a contratistas recursos 2010		636'110,765.82
Construcción del Puente sobre Av. López Mateos en el sistema Lázaro Cárdenas	128'500,510.60	
Construcción de la segunda etapa del Nodo El Tapatio – Fraccionamiento Revolución	81'768,427.44	
Construcción de la solución vial San Ignacio – Niño Obrero, primera etapa, municipio de Zapopan	40'503,091.54	
Conclusión del Nodo Periférico – Carretera Libre a Zapotlanejo, municipio de Tonalá	24'736,675.44	
Construcción del Nodo Periférico – Belisario Domínguez, 2da. Etapa, en Guadalajara	32'692,013.98	
Construcción del Nodo Periférico – Colón, 1era. Etapa, en Tlaquepaque	32'615,985.87	
Construcción del Nodo Periférico – Santa Esther, 1era. Etapa, en Zapopan	---	
Elaboración de acciones específicas para la regulación, adquisición de suelos y pago de adeudos para la conclusión del Anillo Periférico	142'533,964.46	
Construcción del Nodo Circunvalación – Juan Pablo II, 1era. Etapa, en Guadalajara	2'044,500.00	
Construcción de paso a desnivel Circunvalación – Avila Camacho, 1era etapa, en Guadalajara	60'000,000.00	
Construcción del Nodo Vial Las Juntas, 1era. Etapa, en Tlaquepaque	81'000,000.00	
Construcción de la prolongación de la Av. Colón, 2da. Etapa, en Tlajomulco	9'715,596.49	
Gastos de operación		1'408,468.29
Honorarios fiduciarios	1'334,811.95	
Honorarios de auditoría	47,612.00	
Comisiones	26,044.34	

Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel. 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-02

Tel: 38-19-23-07
38-19-23-06
Ext. 7568
Fax: 38-19-23-06
Ext. 7581



CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

Ixtlahuacán de los
Membrillos

Juanacatlán

Tlajomulco de
Zúñiga

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel: 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-02

Tel: 38-19-23-07
38-19-23-06
Ext. 7568
Fax: 38-19-23-06
Ext. 7581

Disponibilidad al 30 de Abril de 2011

Inversión en valores en BANOBRAS, S.N.C.
Saldo en chequera
Devolución de anticipo no amortizado

398'293,898.64
25,556.90
245,104.58

398'074,350.96

Disponibilidad líquida

Al 30 de Abril de 2011 el Fideicomiso registra una disponibilidad líquida de \$398'319,455.54 que se encuentra invertida conforme lo siguiente:

- \$ 398'293,898.64 invertidos en valores gubernamentales a una tasa promedio en el mes de diciembre de 4.52% que maneja la institución, de conformidad con lo establecido en la cláusula quinta del Contrato de Fideicomiso
- \$ 25,556.90 en la cuenta de cheques que se maneja en este fideicomiso

PUNTO 7. Asuntos Varios

- **Solicitud al titular de la Unidad Programática de Control Presupuestal de la Subsecretaría de Egresos de la SHCP, de los recursos financieros 2011 del Fondo Metropolitano**

El Ing. Enrique León Zepeda presentó ante los integrantes del Subcomité, el oficio SF 779/2011, emitido por el titular de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco al titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público, de fecha 13 de Abril de 2011, en el que se solicita los recursos financieros 2011 del Fondo Metropolitano.

- **Comunicado a C. Presidente Municipal de Guadalajara**

Comunicado al C. Presidente Municipal de Guadalajara, solicitando a través del oficio SEDEUR/1060/2011, CZMG/051/2011, entere a los miembros del Comité y Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos del expediente correspondiente a.

Proceso de licitación Pública que ampara el contrato con la empresa ganadora y en consecuencia con el convenio celebrado entre el Gobierno del Estado y el Municipio de Guadalajara.

El Ing. Enrique León Zepeda, informa:

El día 30 de Mayo del presente año, adjunto al oficio DC/1794/11; se recibió el reporte con la documentación de la obra "Paso a Desnivel en Av. Circunvalación y Av. Ávila Camacho, en la colonia Jardines del Country de la zona 2 Minerva".


- **Reglas de Operación vigentes**

Las Reglas de Operación vigentes, fueron emitidas en el mes de Abril del año 2011. El Ing. Enrique León Zepeda comunica que oportunamente se envió vía correo electrónico a cada uno de los miembros del Comité y Subcomité de Evaluación de Proyectos para su conocimiento y análisis, en cumplimiento a lo dispuesto por el Presidente del Fideicomiso, L.E. Martín G. Mendoza López.

- **Determinación de los estados financieros del fideicomiso**

El Ing. Enrique León Zepeda, informa: en cumplimiento a las Reglas de Operación y a lo instruido por los miembros del Comité y Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos, en oficio No. SEDEUR/1061/2011, CZMG/052/2011, se solicitó al titular de la Secretaría de Administración, la contratación de los servicios de Auditoría Externa para la determinación fiscal de los estados financieros del Fideicomiso correspondiente al ejercicio 2010.

El Arq. Héctor Pérez Camarena sugiere se incluya en el reporte de: "avance físico – financiero", el anexo técnico correspondiente a las acciones 2011, independientemente de que a ésta fecha aún no se recibe la ministración correspondiente.



CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

**Ixtlahuacán de los
Membrillos**

Juanacatlán

**Tlajomulco de
Zúñiga**

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

Acuerdo 19/01

El Comité Técnico del Fideicomiso autoriza por unanimidad el reporte correspondiente al avance físico – financiero 2008.

Acuerdo 19/02

El Comité Técnico del Fideicomiso autoriza por unanimidad el reporte correspondiente al avance físico – financiero 2009.

Acuerdo 19/03

El Comité Técnico del Fideicomiso autoriza por unanimidad el reporte correspondiente al avance físico – financiero 2010.

Adicional el Comité Técnico del Fideicomiso autoriza que los productos financieros al 30 de Abril 2011 del Fideicomiso por \$11'656,222.16 más lo que se acumule, se destinen en primer lugar a ofrecer suficiencia a las acciones ya programadas que lo requieran, así como acciones de infraestructura peatonal (puentes).

Acuerdo 19/04

Los miembros del Comité Técnico del Fideicomiso se enteran y aprueban por unanimidad la situación financiera y el Estado de Ingresos y Egresos del Fideicomiso 2134 del "Fondo Metropolitano Ciudad de Guadalajara" en cifras al 30 de Abril de 2011, presentado en tiempo y forma por la Lic. María Luisa Gabriela Ramírez Delegada de la Institución Fiduciaria.

Acuerdo 19/05

Los miembros del Comité Técnico del Fideicomiso se enteran de la solicitud al titular de la Unidad Programática de Control Presupuestal de la Subsecretaría de Egresos de la SHCP, de los recursos financieros 2011 del Fondo Metropolitano.

Acuerdo 19/06

Los miembros del Comité Técnico del Fideicomiso se enteran del comunicado al C. Presidente Municipal de Guadalajara, y solicita al Secretariado Técnico cite el día 06 de Julio del presente mes, a la instancia ejecutora de las acciones de trabajo según convenio, para explicar el reporte de referencia.

También se emitirá similar solicitud al Municipio de Tlaquepaque.

Acuerdo 19/07

Los miembros del Comité Técnico del Fideicomiso se enteran de las Reglas de Operación vigentes, y solicitan se turne a los integrantes las observaciones que se realizarán por el Secretariado Técnico, para a su vez emitir las observaciones que correspondan.

Acuerdo 19/08

Los miembros del Comité Técnico del Fideicomiso se enteran de la solicitud de la determinación de los estados financieros del fideicomiso.

Acuerdo 19/09


Los miembros del Comité Técnico del Fideicomiso aprueba incluir el anexo técnico, con las acciones autorizadas para el ejercicio 2011 aún sin avance a la fecha, debido a que la ministración de recursos está pendiente.

Agotado el orden del día, la L.C.P. M. Eréndira Ruíz Machuca, concluyó la sesión a las 12:00 horas.

Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel: 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-02

Tel: 38-19-23-07
38-19-23-06
Ext. 7568
Fax: 38-19-23-06
Ext. 7581



CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

**Ixtlahuacán de los
Membrillos**


Juanacatlán


**Tlajomulco de
Zúñiga**


Tlaquepaque

Tonalá


Zapopan



L.C.P. M. Eréndira Ruíz Machuca
Directora General de Egresos de la
Secretaría de Finanzas y Presidente del
Comité Técnico



Arq. Alfonso Javier Sámano Sevilla
Director General de Seguimiento,
Evaluación y Desarrollo Institucional y
Suplente ante el Comité Técnico


Arq. Héctor Pérez Camarena
Director General de Planeación Urbana y
Territorial de la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Titular ante el Comité Técnico


Zaira E. Gómez Beracochea
Secretaría de Actas

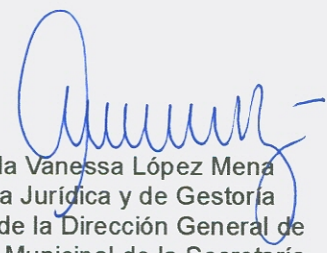
Lic. Gilda Vanessa López Mena
Directora Jurídica y de Gestión
Municipal de la Dirección General de
Desarrollo Municipal de la Secretaría
General de Gobierno y suplente ante el
Subcomité Técnico


Lic. Carlos Leal
Director de Área de Vinculación y
Seguimiento de la Secretaría de
Planeación y suplente ante el Comité
Técnico

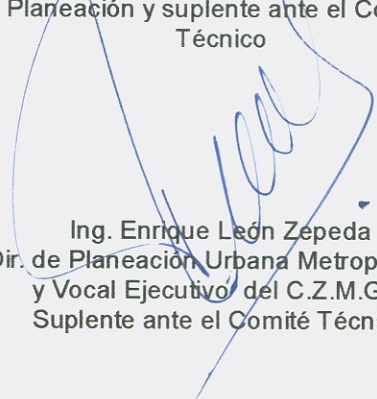
Ing. Enrique León Zepeda
Dir. de Planeación Urbana Metropolitana
y Vocal Ejecutivo del C.Z.M.G. y
Suplente ante el Comité Técnico

Esta hoja pertenece al Acta de la XIX Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Público de Administración e Inversión del "Fondo Metropolitano Ciudad de Guadalajara", celebrada el 01 de Junio de 2011.

Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel: 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-02

Tel: 38-19-23-07
38-19-23-06
Ext. 7568
Fax: 38-19-23-06
Ext. 7581
