

Generación de Infraestructura Social Básica

Nombre Generación de Infraestructura Social Básica

Actualizado 31 de diciembre de 2011

Descripción

Asignar recursos a municipios para la construcción de obras de infraestructura social básica para proporcionar mínimos de bienestar y posibilidades de desarrollo a localidades rurales en condiciones de pobreza extrema y rezago social, con una población no mayor a 2,500 habitantes, para que las mismas se adhieran al desarrollo sostenido y a la productividad, y se conviertan en comunidades integradoras de su propio desarrollo.

Objetivo

Contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida y las oportunidades de los habitantes de las localidades en condiciones de pobreza extrema y rezago social del estado, mediante la construcción de obras de infraestructura social básica en materia de suministro, almacenamiento y conducción de agua potable, alcantarillado, drenaje, letrinización, electrificación, vialidad, etc.

Porcentaje de Avance

50.00

Fecha de inicio

01/01/11

Fecha de Término

31/12/11

Dependencia

Secretaría de Desarrollo Rural


Área Responsable

Dirección General de Regiones Prioritarias

Nota


Debido a la operatividad del programa y los tiempos de ejecución del mismo, actualmente las obras se encuentran en proceso de construcción y convenidas con los Ayuntamientos respectivos, esperando queden finiquitadas al 100% durante el primer periodo del año. De esta manera se alcanzará la meta planteada en 2011.

Cumplimiento de Metas

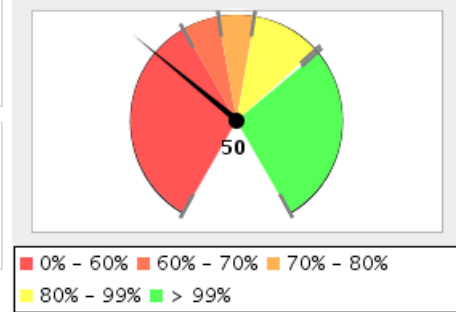

Avance Anual

Fecha	Meta	Avance
31-ene-11	0	0
28-feb-11	0	0
31-mar-11	0	0
30-abr-11	0	0
31-may-11	0	0
30-jun-11	0	0
31-jul-11	0	0
31-ago-11	4	0
30-sep-11	13	13.25
31-oct-11	63	50
30-nov-11	94	50
31-dic-11	100	50

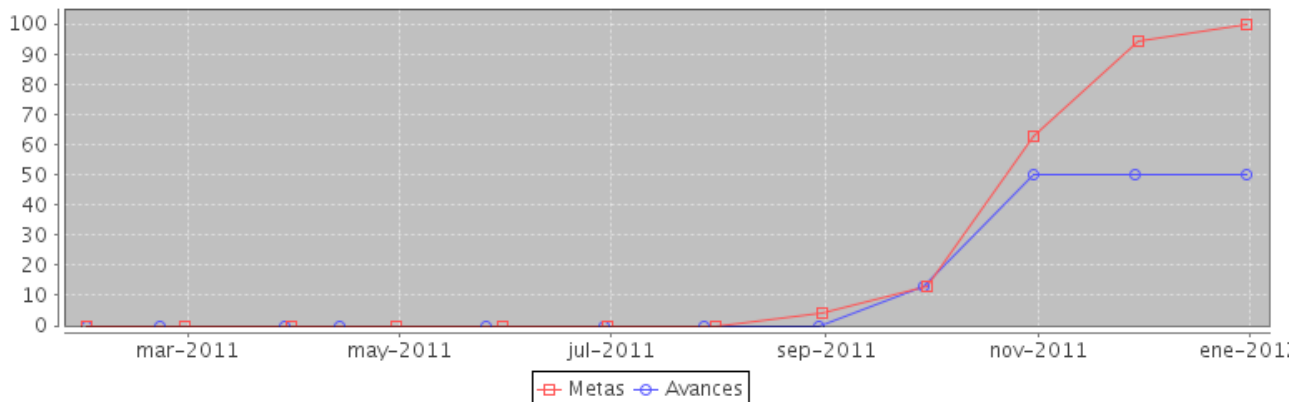

Componente	noviembre		diciembre	
	Meta	Avance	Meta	Avance
1.- Obras de infraestructura eléctrica rural construidas	20	13	21	13
2.- Obras de infraestructura social básica en vialidades construidas	80	12	84	12
3.- Obras de infraestructura social básica hidráulica y alcantarillado construidas	45	30	47	30

Componente	noviembre		diciembre	
	Meta	Avance	Meta	Avance
4.- Obras de infraestructura y equipamiento básico rural construidas	9	6	10	6


Componente 1: Obras de infraestructura eléctrica rural construidas

Nombre	Obras de infraestructura eléctrica rural construidas		
Fecha de	01/01/11	Fecha de Fin	31/12/11
Última Actualización	31/12/11		
Nota			

Fecha	Meta	Avance
31-ene-11	0	0
28-feb-11	0	0
31-mar-11	0	0
30-abr-11	0	0
31-may-11	0	0
30-jun-11	0	0
31-jul-11	0	0
31-ago-11	1	0
30-sep-11	3	3
31-oct-11	13	13
30-nov-11	20	13
31-dic-11	21	13

Indicador: Número de obras de infraestructura eléctrica rural construidas

Nombre	Número de obras de infraestructura eléctrica rural construidas		
Descripción	Construcción de obras de electrificación rural implementadas		
Valor Inicial	0	Valor Actual	13

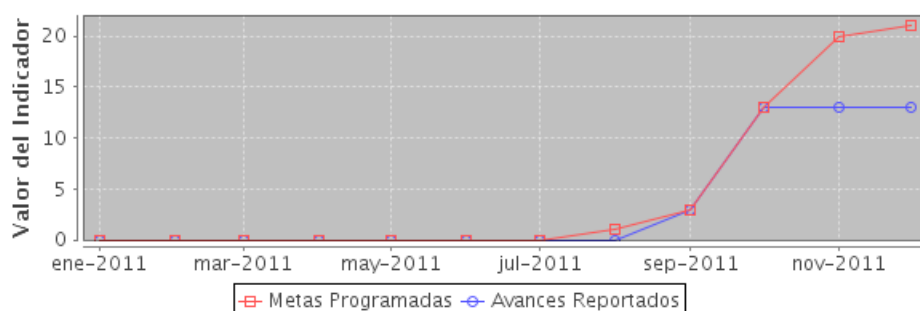


Componente 2: Obras de infraestructura social básica en vialidades construidas

Nombre	Obras de infraestructura social básica en vialidades construidas		
Fecha de	01/01/11	Fecha de Fin	31/12/11
Última Actualización	31/12/11		
Nota			

Fecha	Meta	Avance
31-ene-11	0	0
28-feb-11	0	0
31-mar-11	0	0
30-abr-11	0	0
31-may-11	0	0
30-jun-11	0	0
31-jul-11	0	0
31-ago-11	4	0
30-sep-11	12	12
31-oct-11	54	12
30-nov-11	80	12
31-dic-11	84	12

Indicador: Número de obras de infraestructura social básica en vialidades construidas

Nombre	Número de obras de infraestructura social básica en vialidades construidas		
Descripción	Construcción de infraestructura social básica en vialidades (empedrados, banquetas, puentes peatonales, huellas de rodamiento, entre otros).		
Valor Inicial	0	Valor Actual	12

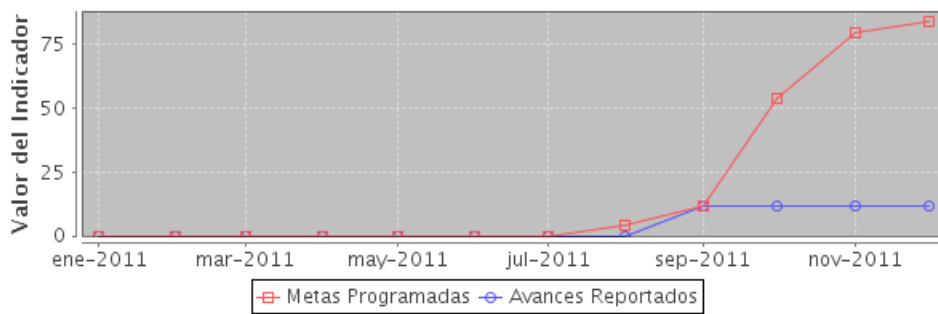


Componente 3: Obras de infraestructura social básica hidráulica y alcantarillado construidas

Nombre	Obras de infraestructura social básica hidráulica y alcantarillado construidas		
Fecha de	01/01/11	Fecha de Fin	31/12/11
Última Actualización	31/12/11		
Nota			

Fecha	Meta	Avance
31-ene-11	0	0
28-feb-11	0	0
31-mar-11	0	0
30-abr-11	0	0
31-may-11	0	0
30-jun-11	0	0
31-jul-11	0	0
31-ago-11	2	0
30-sep-11	7	7
31-oct-11	30	30
30-nov-11	45	30
31-dic-11	47	30

Indicador: Número de obras infraestructura social básica hidráulica y alcantarillado construidas

Nombre	Número de obras infraestructura social básica hidráulica y alcantarillado construidas		
Descripción	Construcción de obras de captación, extracción, distribución y almacenamiento de agua potable, drenaje y letrinización, mejorando la calidad de vida de los habitantes.		
Valor Inicial	0	Valor Actual	30

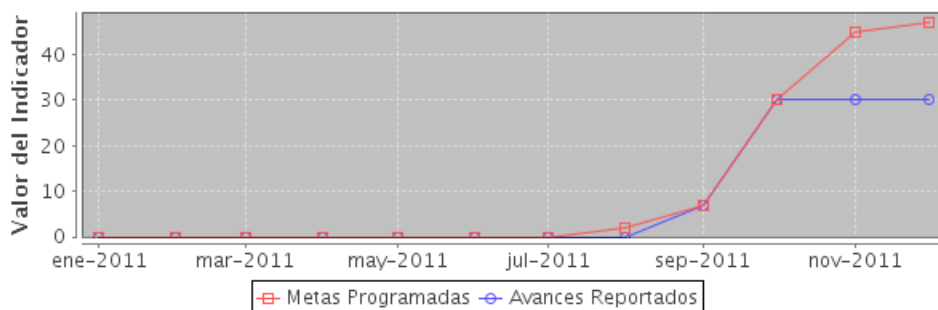

Componente 4: Obras de infraestructura y equipamiento básico rural construidas

Nombre	Obras de infraestructura y equipamiento básico rural construidas		
Fecha de	01/01/11	Fecha de Fin	31/12/11
Última Actualización	31/12/11		
Nota			

Fecha	Meta	Avance
31-ene-11	0	0
28-feb-11	0	0
31-mar-11	0	0
30-abr-11	0	0
31-may-11	0	0
30-jun-11	0	0
31-jul-11	0	0
31-ago-11	0	0
30-sep-11	1	1
31-oct-11	6	6
30-nov-11	9	6
31-dic-11	10	6

Indicador: Número de obras de infraestructura y equipamiento básico rural construidas

Nombre	Número de obras de infraestructura y equipamiento básico rural construidas		
Descripción	Construcción y equipamiento a través de infraestructura social básica (centros de salud, unidades deportivas, aulas, bodegas, muros, salones, entre otros).		
Valor Inicial	0	Valor Actual	6

