

1462/2016

**ENERGIAS RENOVABLES DE LA RIVERA SA DE CV**  
 ERR110523534  
 Domicilio Fiscal  
 Hidalgo 297 A  
 Col. Centro 45900  
 Chapala Jalisco México  
 Tel. 3767653680

**Factura No: 66**  
**FOLIO FISCAL (UUID):**  
 4F9D8427-034B-42B9-86FA-13FEC5B6FFBA  
**NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:**  
 00001000000203495276  
**NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:**  
 00001000000303925019  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:**  
 2016-12-23T13:32:34  
**FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:**  
 2016-12-23T13:27:33

**CLIENTE:** Municipio de Jocotepec Jalisco  
**RFC:** MJJ850101KP8  
 Colonia Centro C.P. 45800  
 Jocotepec Jalisco  
 Mexico

**Régimen Fiscal:** Régimen General de Ley Personas Morales  
**Lugar de Expedición:** Chapala, Jalisco  
**Forma de Pago:** Pago en una sola exhibición  
**Método de Pago:** 02-Cheque nominativo

**Fecha de Expedición:** 23 diciembre 2016  
**Clave de Moneda:** MXN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	N/A	FINIQUITO DEL CONTRATO NO. GMJ-13C-OP/2016 CORRESPONDIENTE A LA OBRA "ELECTRIFICACION DE MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CALLE FRANCISCO VILLA DE ZAPOTITAN DE HIDALGO", EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.  RETENCION 5 AL MILLAR DE SUPERVISION: \$704.93 CANTIDAD NETA A PAGAR:\$162,839.20	\$ 140,986.32	\$ 140,986.32

**IMPORTE CON LETRA:** CIENTO SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS, 13/100 MXN

**SUBTOTAL:** \$ 140,986.32  
**IVA(IVA 16.00%):** \$ 22,557.81  
**TOTAL:** \$ 163,544.13

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

Z9v0HidD/Lj0RCEq8d4NTplns/FsNs8cekGdZlc+uXnoDS5LgVckBG18s+RgAVFARxI8IG0179SMpKXn5D15k3Zwn03C3IRrgrnDbDBvZWSH9pZTCBy8Gr2Q1La8E+AlwiqwyKjASbqhz0AztGfCnwaZIHx+WKysBqSQ=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**


VYvBxRIMM2GFC4k8YOS5KNq4VYHmQN1Qwl2nYkFw3i2RnrBwqRnS8R6FC7dgXmaMSnlm3EIC+cZs1zcYH71HYibRP+yp2j2P4LG8hkaMjPg5TRGmo8ezEO9aUH7tnXrcyEYX3DIHX79mqHmp7qXUrwQaN66E4UbAQhGCU4=

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||| 014F9D8427-034B-42B9-86FA-13FEC5B6FFBA|2016-12-23T13:32:34|Z9v0HidD/Lj0RCEq8d4NTplns/FsNs8cekGdZlc+uXnoDS5LgVckBG18s+RgAVFARxI8IG0179SMpKXn5D15k3Zwn03C3IRrgrnDbDBvZWSH9pZTCBy8Gr2Q1La8E+AlwiqwyKjASbqhz0AztGfCnwaZIHx+WKysBqSQ=|00001000000203495276||



*[Handwritten signature]*



www.foliosdigitales.com

El presente documento es una copia digitalizada de un documento original emitido el 23 de diciembre de 2016.

**DIRECCIÓN DE OPERACIONES**



Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal

Limpiar UUID

RFC Emisor


RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen

Verificar CFDI

RFC del Emisor	Nombre o Razón Social del Emisor	RFC del Receptor	Nombre o Razón Social del Receptor
ERR110523534	ENERGIAS RENOVABLES DE LA RIVERA SA DE CV	MJJ850101KP8	Municipio de Jocotepec Jalisco
Folio Fiscal	Fecha de Expedición	Fecha Certificación SAT	PAC que Certificó
4F9D8427-034B-42B9-86FA-13FEC5B6FFBA	2016-12-23T13:27:33	2016-12-23T13:32:34	FMD100203JS7
Total del CFDI	Efecto del Comprobante	Estado CFDI	
\$163,544.13	ingreso	Vigente	

Imprimir



*[Handwritten signature]*

# SOLARHOUSE



## CONTROL DE ESTIMACIONES

**CONSTRUYE:** ENERGIAS RENOVABLES DE LA RIVERA SA DE CV ESTIMACION No.: 2 (FINIQUITO) FECHA: 10/12/2106  
**DESCRIPCION DE LA OBRA:** INSTALACION ELECTRICA CALLE FRANCISCO VILLA PERIODO DEL: 10/11/2016 A 10/12/2106  
**OBRA No.:** GMJ13C OP/2016 MONTO A PAGAR: \$162,839.20

PARTIDA	IMPORTE PRESUPUESTADO	IMPORTE ESTA ESTIMACION	IMPORTE ANTERIOR	IMPORTE ACUMULADO	SALDO	ESTIMACION	DEDUCCIONES
POSTE PC 09-450	\$82,124.28	\$0.00	\$82,124.28	\$82,124.28	\$0.00	ESTIMACION	\$140,986.32
POSTE PC 12-750	\$80,578.06	\$0.00	\$80,578.06	\$80,578.06	\$0.00	I.V.A. 16%	\$22,557.81
TRANSFORMADOR	\$140,986.32	\$140,986.32	\$0.00	\$140,986.32	\$140,986.32	SUMA	\$163,544.13
		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	AMORTIZACION	\$0.00
		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	I.V.A. AMORTIZADO	\$0.00
		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	SUMA	\$0.00
		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	5 AL MILLAR VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL DE OBRA	\$704.93
<b>SUMA</b>	<b>\$303,688.66</b>	<b>\$140,986.32</b>	<b>\$162,702.34</b>	<b>\$303,688.66</b>	<b>\$140,986.32</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>\$162,839.20</b>
<b>INDIRECTOS</b>							
<b>SUMA TOTAL</b>	<b>\$303,688.66</b>	<b>\$140,986.32</b>	<b>\$162,702.34</b>	<b>\$303,688.66</b>	<b>\$140,986.32</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>\$162,839.20</b>

IMPORTE	IVA	TOTAL	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL
\$303,688.66	\$48,590.19	\$352,278.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$162,702.34	\$26,032.37	\$188,734.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$140,986.32	\$22,557.81	\$163,544.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$303,688.66	\$48,590.19	\$352,278.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Contratista

Ing. Jose Valentin Zarate Rivera  
ENERGIAS RENOVABLES DE LA RIVERA SA DE CV

Director de Obras Públicas

Ing. Juan Manuel Garcia Escoto

# SOLARHOUSE



## NUMEROS GENERADORES

**OBRA:** INSTALACION ELECTRICA CALLE FRANCISCO VILLA      **DEPENDENCIA:** JOCOTEPEC      **ESTIMACION No.:** 2 (FINIQUITO)  
**PLANO:**      **PARTIDA:**      **NIVEL:**      **FECHA:** 10/12/2016      **PERIODO:** 10/11/2016      **A:** 10/12/2016      **OBRA NO.:** GMJ13C OP/2016

NÚMERO	2	CONCEPTO	EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	UNIDAD	SUBTOTAL	REFERENCIA
		Suministro e instalación de transformador bajo norma "K", D1-37.5 -22860-220/120V, incluye montaje de estructura 1CCF20 (cortacircuitos fusible), pruebas y puesta en servicio de transformador. Tramites de proyecto ante CFE, planos, diagramas unifilares y verificación de alumbrado público por medio de una unidad UVIE						2.00	PZA	2.00	
<b>TOTAL</b>										<b>2.00</b>	

Contratista

Director de Obras Públicas


  
 Ing. José Valentín Zárate Rivera  
 ENERGIAS RENOVABLES DE LA RIVERA SA DE CV

  
 Ing. Juan Manuel García Escoto



CROQUIS

OBRA:	INSTALACION ELECTRICA CALLE FRANCISCO VILLA	DEPENDENCIA:	JOCOTEPEC	ESTIMACION No.:	2 (FINIQUITO)
PLANO:		PARTIDA:	0	NIVEL:	
FECHA:	10/12/2016	PERIODO	10/11/2012 A 10/12/2016	OBRA NO.:	GMJ13C OP/2016

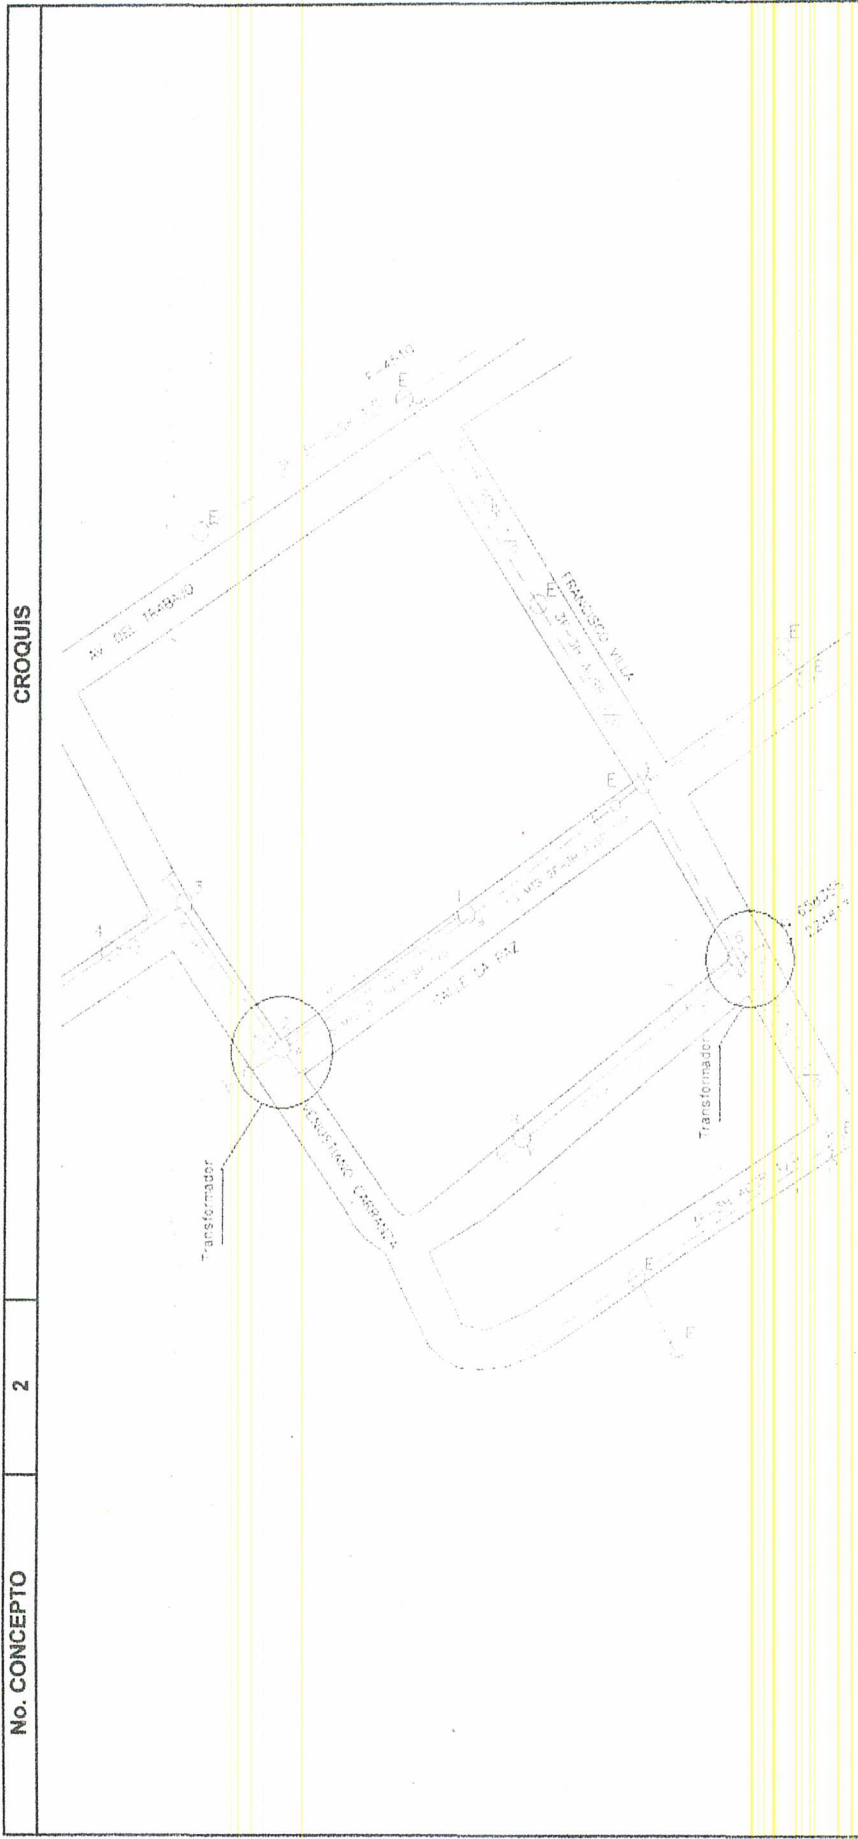

Contratista

*[Signature]*

Ing. José Valentín Zárate Rivera  
ENERGIAS RENOVABLES DE LA RIVERA SA DE CV

Director de Obras Públicas

*[Signature]*

Ing. Juan Manuel García Escoto



CIA. CONTRATISTA: ENERGIAS RENOVABLES DE LA RIVERA SA DE CV      FECHA: 10/12/2016  
 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: INSTALACION ELECTRICA CALLE FRANCISCO VILLA      OBRA No.: GMJ13C OP/2016  
 DEPENDENCIA: JOCOTEPEC      10/11/2016      A      10/12/2016

No.	Concepto	CANTIDAD ESTIMADA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	Suministro e instalación de transformador bajo norma "K", D1-37.5 -22860-220/120V, incluye montaje de estructura 1CCF20 (cortacircuitos fusible), pruebas y puesta en servicio de transformador. Tramites de proyecto ante CFE, planos, diagramas unifilares y verificación de alumbrado público por medio de una unidad UVIE	2.0	\$ 70,493.16	\$ 140,986.32
TOTAL				\$ 140,986.32

Contratista  
  
 Ing. José Valentín Zárate Rivera  
 ENERGIAS RENOVABLES DE LA RIVERA SA DE CV

Director de Obras Públicas  
  
 Ing. Juan Manuel García Espoto





DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

# REPORTE FOTOGRAFICO



OBRA:	INSTALACION ELECTRICA CALLE FRANCISCO VILLA	DEPENDENCIA:	JOCOTEPEC	ESTIMACION No.:	2 (FINIQUITO)
PLANO:		PARTIDA:		NIVEL:	
FECHA:	10/12/2016	PERIODO	10/11/2016 A 10/12/2016	OBRA NO.:	GMJ13C OP/2016

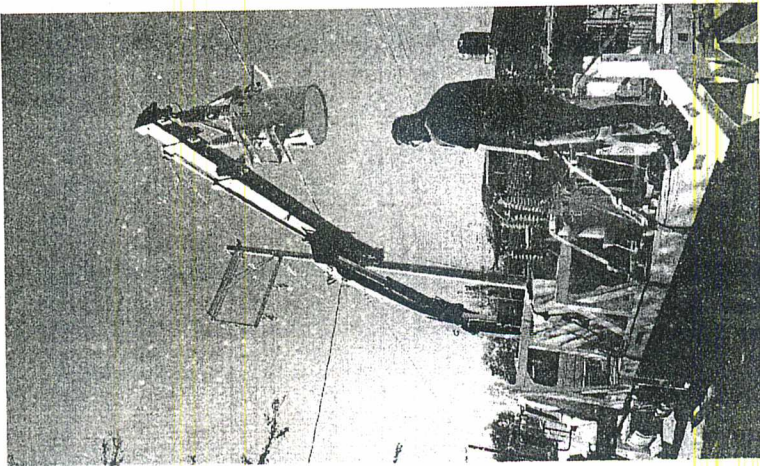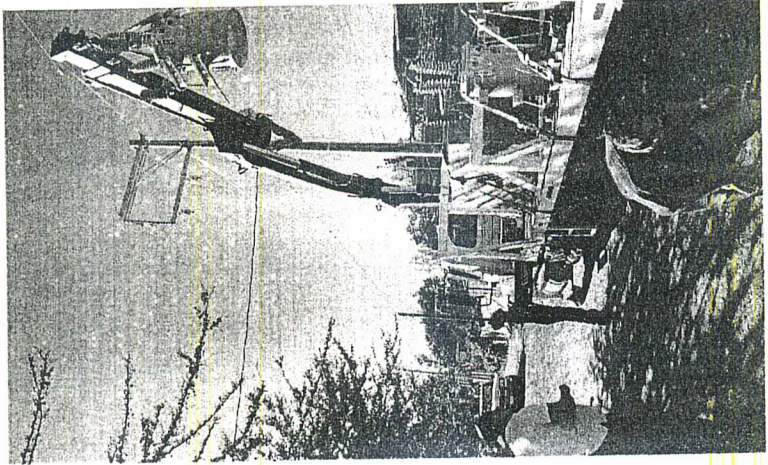No. CONCEPTO	2	FOTOGRAFÍAS	OBSERVACIONES
		 	

Contratista

*[Signature]*

Ing. José Valentín Zárate Rivera  
ENERGIAS RENOVABLES DE LA RIVERA SA DE CV

Director de Obras Públicas

*[Signature]*

Ing. Juan Manuel García Escoto



ESTADO DE PUEBLA  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

DIVISION JALISCO  
SUBGERENCIA DE DISTRIBUCIÓN  
CHAPALA

28 DIC 2016

Asunto: Aprobación de Proyecto

JOCOTEPEC, JALISCO a 28 de Diciembre de 2016

Jose Valentin Zarate Rivera  
Energias Renovables de la Rivera S.A. DE C.V.  
Hidalgo # 297-A

001870

En atención a su solicitud DX07102326202016, de fecha 28 de Diciembre de 2016, con la cual solicita la revisión y aprobación del proyecto para la construcción de la obra eléctrica a H AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC JALISCO, ubicada(o) en FRANCISCO VILLA, JOCOTEPEC, JALISCO.

En vista de que cumple con la normatividad vigente, otorgamos nuestra aprobación al proyecto, para que se construya dentro de lo especificado en las normas y especificaciones aplicables.

Ésta aprobación tiene vigencia de doce meses a partir de la fecha en que haga efectivo el pago por los conceptos abajo descritos, que ascienden a la cantidad de \$9240.1192 (nueve mil doscientos cuarenta pesos con doce centavos)

Revisión de proyecto:	1,322.00
Supervisión de Obra:	2,820.90
Maniobras y conexión:	3,822.72
Pruebas por puestas en operación:	0.00
Subtotal:	7,965.62
I.V.A.:	1,274.50
Total:	9,240.12

El presente presupuesto tiene vigencia de dos meses, contados a partir de la fecha en que haya sido entregado al solicitante para su revisión y aceptación, por lo que de no haberse cubierto la aportación en el plazo señalado quedará sin efecto.





El pago de ésta cantidad no implica que éste servicio se pueda contratar, sin antes haber realizado la entrega de las instalaciones requeridas por Comisión Federal de Electricidad, de lo cual el Depto. de Distribución o Planeación-Construcción dará aviso.

Es responsabilidad del titular del proyecto gestionar las autorizaciones por derechos de servidumbre de paso, cruzamiento con vías de comunicación (ferrocarriles, carreteras, etc.), estudios y acciones relativas al impacto ambiental que le sean aplicables al proyecto, debiendo presentar el original (cotejar y devolver) y copia de la autorización respectiva para ejecutar los trabajos a favor de Comisión Federal de Electricidad.

Atentamente



**CARLOS DANIEL FAJARDO VAZQUEZ**  
**JEFE DEPTO PLANEACION ZONA CHAPALA**

 Comisión Federal de Electricidad	FICHA DE DEPOSITO	DIVISION: JALISCO ZONA: CHAPALA FECHA: 28 DE DICIEMBRE DE 2016
<b>COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DIVERSAS</b>		
<b>BANCO SANTANDER</b>		<b>CONVENIO: 4753</b>
<b>CLABE INTERBANCARIA: 014320655007874318</b>		<b>REFERENCIA: 49830610048530340242</b>
FECHA LIMITE DE PAGO: 28 DE FEBRERO DE 2017		
CONCEPTO DE PAGO: REVISION DE PROYECTO, SUPERVISION DE OBRA, MANIOBRAS Y CONEXION DE LA SOLICITUD DX07102326202016.		
<b>TIPO DE DEPOSITO</b>		
EFECTIVO	I.V.A.: \$	1,274.50
	SUBTOTAL: \$	7,965.62
CHEQUES		
<b>TOTAL: \$</b>		<b>9,240.12</b>
 49830610048530340242		

La aportación podrá ser liquidada por transferencia electrónica con el número de referencia y la Clabe interbancaria N°014320655007874318. En caso de requerir factura, favor de enviar en un plazo no mayor a 5 días hábiles, después de realizado su pago, al correo claudia.duran@cfe.gob.mx, iliana.rosas@cfe.gob.mx, jessica.sanchez@cfe.gob.mx, con los siguientes datos: 1.- Cedula de identificación Fiscal, 2.- R.F.C (cédula emitida por SAT), 3.- Comprobante de pago.

Fco Villa

2017/01/19

## Scotiabank Inverlat S.A.

Página 1

16:57:25

Scotia en Línea

## Impresión de Comprobante de Traspasos en Otros Bancos

ORDENANTENombre

ENERGIAS RENOVABLES DE LA RIVERA SA DE

Cuenta de Cargo

CHQ-MXN-GUADALAJAR-01002828540-

Importe

9,240.12

I.V.A.

1,274.50

Moneda

MXN - PESOS

Tipo de envío

1-MISMO DÍA (SPEI)

Fecha de Aplicación

2017/01/19

Instrucción de Pago

1-SPEI

R.F.C.

ERR110523534

Concepto

49830610048530340242

Referencia (Numérica)

1901172

BENEFICIARIOCuenta de Abono

014320655007874318

Banco

SANTANDER

Tipo de Persona

2. PERSONA MORAL

R.F.C.

CSS160330-CF7

Nombre Beneficiario/Razón Social

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAST

Comisión

3.00

I.V.A. Comisión

0.80

Costo de Transmisión

0.00

Saldo Cuenta de Cargo

[REDACTED]

Estado de Operación

APLICADO

Folio

22020549248

Clave de Rastreo

3373065039

Mensaje

SU TRANSACCIÓN SE REALIZÓ EXITOSAMENTE.

Transacción aceptada, en proceso de verificación

Si deseas dar seguimiento al estatus de tu operación, favor de comunicarte a los teléfonos 5728-1262/5728-1205 ó 01-800-705-4000 eligiendo la opción correspondiente del Sistema de Audio respuesta Automática, mediante el uso del folio que fue generado por el sistema, podrás conocer el estatus de la misma.

Comprobante de carácter informativo, no tiene validez fiscal.

Centro atención telefónica CONDUSEF 5340-0999 ó 01 800 999-8080. Sitio Web para consulta de comisiones en: [www.scotiabank.com.mx](http://www.scotiabank.com.mx)  
Para aclaraciones llamar al 5728-1262 ó 01 800 705-4000. Centro de atención telefónica 5728 1262 ó 01 800 705 4000.

ENERGIAS RENOVABLES DE LA RIVERA  
[001] JORGE ALBERTO FRANCO CHAVEZ

 Scotiabank

SIN-941202-514
