



Secretaría de Infraestructura
y Obra Pública

XLI SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ TÉCNICO DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS DEL FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN “FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE GUADALAJARA”

En cumplimiento a la convocatoria del C. Mtro. Netzahualcóyotl Ornelas Plascencia, Secretario de Infraestructura y Obra Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, y en su carácter de Secretario Técnico del Consejo para el Desarrollo Metropolitano de Guadalajara; en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a las 11:00 horas del día jueves 26 de julio de 2018, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, se llevó a cabo la XLI Sesión Ordinaria del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos del Fideicomiso Público de Administración e Inversión, con los siguientes participantes: **Ing. Jacinto de la O Campos**, Director General Sectorial, de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y Prosecretario Técnico del Consejo; **Lic. Martha Lorena Benavides Castillo**, Directora General de Vinculación Administrativa, en representación de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas; **Lic. Alfonso Gómez Godínez**, Subsecretario de Asuntos del Interior, en representación de la Secretaría General de Gobierno; **Prof. y Lic. Daviel Trujillo Cuevas**, Secretario de Desarrollo e Integración Social, **Lic. Juan Manuel Alatorre Franco**, Director General de Inversión Pública de la Subsecretaría de Planeación y Evaluación, representando al Comité de Planeación y Desarrollo Estatal COPLADE; **L.C.P. Álvaro Alejandro Ríos Pulido**, Director de Área de Verificación de Obra Convenida, representante suplente de la Contraloría del Estado; **Lic. María Luisa Gabriela Ramírez Oliva**, Delegada Estatal de BANOBRAS; **Lic. Sahik Alarcón Esparza**, Subdelegado de Desarrollo Urbano, Ordenación del Territorio y Vivienda de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU Jalisco; bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. Bienvenida
2. Presentación del Avance Físico y Financiero de Ejercicio Fiscal 2016
3. Presentación del Avance Físico y Financiero de Ejercicio Fiscal 2017
4. Reintegro a la TESOFE de recursos 2017
5. Asuntos Varios
6. Acuerdos.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

PUNTO 1. Bienvenida

El Ing. Jacinto de la O Campos, Director General Sectorial, de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y Prosecretario Técnico del Consejo, expresa la bienvenida a los presentes a la XLI Sesión Ordinaria del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos del Fideicomiso Público de Administración e Inversión “Fondo Metropolitano Ciudad de Guadalajara”; conforme a la lista de asistencia verifica la existencia del quórum legal para dar lectura al Orden del día, quedando aprobado por unanimidad.



PUNTO 2. Presentación del Avance Físico y Financiero del Ejercicio Fiscal 2016

Continuando con el orden del día, el Ing. Jacinto de la O Campos, Prosecretario Técnico del Consejo, presenta el Avance Físico y Financiero del Ejercicio fiscal 2016, con fecha al 30 de junio de 2018, contenido en el siguiente cuadro:

Ejercicio 2016

FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE GUADALAJARA
RECURSO FISCAL 2016

NOMBRE DE LA OBRA	AUTORIZADO	DISPONIBLE	MODIFICADO	DEVENGADO/ EJERCIDO AL 30 DE JUN 2018	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
	\$723,060,264.22	\$722,337,203.92	\$761,191,379.42	\$747,796,696.63	100%	100%
1 Proyecto de paisaje urbano, andador y ciclovia en Av. Alcalde - 16 de Septiembre , municipio de Guadalajara	\$5,005,005.01	\$5,000,000.00	\$4,999,999.90	\$4,999,999.88	100%	100%
2 Construcción de paisaje urbano, andador y ciclovia en Av. Alcalde - 16 de Septiembre , primera etapa, municipio de Guadalajara	\$75,075,075.08	\$75,000,000.00	\$150,000,000.00	\$149,234,988.75	100%	99%
3 Proyecto de paisaje urbano en la inmediación a la Glorieta La Normal , Municipio de Guadalajara	\$1,501,501.50	\$1,500,000.00	\$1,496,850.08	\$1,496,850.08	100%	100%
4 Proyecto de paisaje urbano y andador en Av. López Mateos , municipio de Guadalajara	\$5,005,005.01	\$5,000,000.00	\$4,985,750.11	\$4,985,750.11	100%	100%
6 Proyecto de conexión troncal de transporte público: Extensión Línea 2 del tren ligero Tetlán-Parque de la Solidaridad, municipio de Guadalajara	\$5,005,005.01	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	100%	100%
7 Proyecto de paisaje urbano Av. Libertad , municipio de Guadalajara	\$1,851,851.85	\$1,850,000.00	\$1,850,000.00	\$1,850,000.00	100%	100%
10 Proyecto de paisaje urbano, andador y ciclovia en Av. Laureles , municipio de Zapopan	\$1,501,501.50	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$1,499,999.99	100%	100%
11 Proyecto del módulo de transferencia disuasoria para transporte masivo en Av. Laureles y Periférico Norte , municipio de Zapopan	\$2,002,002.00	\$2,000,000.00	\$1,998,758.24	\$1,998,758.24	100%	100%
13 Solución vial en Av. 5 de Mayo y Periférico , primera etapa, municipio de Zapopan	\$83,283,283.28	\$83,200,000.00	\$83,200,000.00	\$83,164,362.98	100%	100%
14 Proyecto de conexión troncal de transporte público de Av. Juan Gil Preciado , municipio de Zapopan.	\$3,503,503.50	\$3,500,000.00	\$3,500,000.00	\$3,499,999.99	100%	100%
15 Proyecto para la solución integral vial en Alamo Industrial - Fraccionamiento Revolución , municipio de San Pedro Tlaquepaque	\$900,900.90	\$900,000.00	\$891,811.22	\$891,811.22	100%	100%
17 Solución integral vial de la Av. 8 de Julio - San Sebastianito en Anillo Periférico , segunda etapa, municipio de San Pedro Tlaquepaque	\$50,050,050.05	\$50,000,000.00	\$39,920,026.60	\$37,468,818.71	100%	94%
18 Proyecto de paisaje urbano y andador de calle Independencia - Hidalgo , Municipio de San Pedro Tlaquepaque	\$1,501,501.50	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	100%	100%
20 Proyecto de conexión troncal de transporte público en Av. Tonalá , municipio de Tonalá	\$5,605,605.61	\$5,600,000.00	\$5,570,276.63	\$5,570,276.63	100%	100%
21 Construcción de conexión troncal de transporte público en Av. Tonalá , primera, etapa, municipio de Tonalá	\$54,054,054.05	\$54,000,000.00	\$54,000,000.00	\$53,895,286.33	100%	100%
23 Construcción de paisaje urbano, andador y ciclovia en Av. Jesús Michel González , municipio de Tlajomulco de Zúñiga	\$25,025,025.03	\$25,000,000.00	\$25,000,000.00	\$24,979,466.60	100%	100%
24 Proyecto del módulo de transferencia disuasoria para transporte masivo en Av. Concepción - Unión del Cuatro y Blvd. Santa Fe , municipio de Tlajomulco de Zúñiga	\$5,005,005.01	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	100%	100%
25 Proyecto de paisaje urbano, andador y ciclovia en Camino a Juanacatlán - Calle Hacienda - Calle Constitución , municipio de El Salto	\$1,201,201.20	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	100%	100%



Secretaría de Infraestructura
y Obra Pública

26	Paisaje urbano, andador y ciclovía en Camino a Juanacatlán - Calle Hacienda - Calle Constitución , municipio de El Salto	\$28,828,828.83	\$28,800,000.00	\$28,800,000.00	\$28,796,210.60	100%	100%
27	Cruceros seguros y paisaje urbano, en Carretera Guadalajara - Chapala , municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos	\$15,315,315.32	\$15,300,000.00	\$15,300,000.00	\$15,298,871.01	100%	100%
28	Construcción de paisaje urbano, andador y ciclovía en el Malecón de Juanacatlán , municipio de Juanacatlán	\$15,015,015.02	\$15,000,000.00	\$15,000,000.00	\$14,999,854.20	100%	100%
29	Conexión vial metropolitana Zapotlanejo - Tonalá, primera etapa, municipio de Zapotlanejo	\$20,020,020.02	\$20,000,000.00	\$20,000,000.00	\$19,999,996.28	100%	100%
31	Estudios de preinversión a nivel de perfil de los proyectos para módulos de transferencia disuasoria para transporte masivo en la Zona Metropolitana de Guadalajara	\$5,505,505.51	\$5,500,000.00	\$5,462,160.44	\$5,462,160.44	100%	100%
32	Proyecto de paisaje urbano, andador y ciclovía en Av. Ávila Camacho , municipios de Guadalajara y Zapopan	\$5,041,041.04	\$5,036,000.00	\$5,035,908.00	\$5,035,908.00	100%	100%
33	Construcción de paisaje urbano, andador y ciclovía en Av. Ávila Camacho , primera etapa, municipios de Guadalajara y Zapopan	\$63,927,927.93	\$63,864,000.00	\$63,864,000.00	\$63,853,816.20	100%	100%
35	Proyecto de paisaje urbano, andador y ciclovía en Av. Revolución , municipios de Guadalajara y San Pedro Tlaquepaque	\$5,605,605.51	\$5,600,000.00	\$5,600,000.00	\$5,600,000.00	100%	100%
37	Construcción de la solución vial en circuito Av. López Mateos, tercera etapa, en los Municipios de Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga	\$120,120,120.12	\$120,000,000.00	\$184,028,634.28	\$184,025,306.47	100%	100%
39	Proyecto para la solución vial y troncal de transporte público circuito Av. Adolf Horn , municipios de San Pedro Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga	\$6,587,791.71	\$6,581,203.92	\$6,581,203.92	\$6,581,203.92	100%	100%
41	Proyecto para el módulo de transferencia disuasoria para transporte masivo en Av. Colón y Periferico Sur , municipios de San Pedro Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga	\$7,537,537.54	\$7,530,000.00	\$7,530,000.00	\$7,530,000.00	100%	100%
42	Módulo de transferencia disuasoria para transporte masivo en Av. Colón y Periferico Sur , primera etapa, municipios de San Pedro Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga	\$100,100,100.10	\$100,000,000.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%
43	Proyecto para la conexión vial intermunicipal, en los municipios de Juanacatlán, Zapotlanejo, Tonalá, Ixtlahuacán de los Membrillos, Tlajomulco de Zúñiga y El Salto	\$2,378,378.38	\$2,376,000.00	\$2,376,000.00	\$2,376,000.00	100%	100%

El Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos del Fideicomiso, pone a consideración de los miembros del Comité Técnico autorizar el Avance Físico - Financiero del Ejercicio 2016 presentado por la instancia ejecutora, con fecha de corte al 30 de junio de 2018.

PUNTO 3. Presentación del Avance Físico y Financiero del Ejercicio Fiscal 2017

A continuación el Ing. Jacinto de la O Campos, Director General Sectorial y Prosecretario Técnico del Consejo para el Desarrollo Metropolitano de Guadalajara, presenta el avance físico-financiero correspondiente al ejercicio 2017 con fecha al 30 de junio de 2018, contenido en el siguiente cuadro, el cual se adjunta a la presente Acta, para formar parte integral de la misma (Anexo 1).



Ejercicio 2017

FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE GUADALAJARA
RECURSO FISCAL 2017

	AUTORIZADO PEF 2017	DISPONIBLE	MODIFICADO	COMPROMETIDO	REINTEGRO (BALDO SIN CONTRATAR AL 31 DE DIC)	DEVENGADO/ EJERCIDO AL 30 DE JUN-2018	PAGADO AL 30 DE JUN-2018	SALDO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
	\$327,941,428.00	\$255,104,072.29	\$255,104,072.29	\$253,989,904.18	\$1,148,144.14	\$143,084,020.78	\$158,235,346.38	\$90,851,885.37	75.47%	73.42%
1	Construcción de paisaje urbano, andador y ciclovia en Av. Alcalde - 1a de Septiembre, segunda etapa, Municipio de Guadalajara	\$45,000,000.00	\$44,505,000.00	\$43,789,619.10	\$43,629,094.11	\$140,523.79	\$26,387,785.32	\$26,387,785.32	51.24%	60.24%
2	Infraestructura vial, equipamiento urbano y renovación de paisaje urbano en vialidades del Centro Histórico, primera etapa, municipio de Guadalajara	\$25,000,000.00	\$24,725,000.00	\$24,725,000.00	\$24,699,281.99	\$25,718.01	\$8,577,134.35	\$8,021,103.71	33.90%	34.49%
3	Construcción de paisaje urbano, andador y ciclovia en Av. Laureles, Municipio de Zapopan	\$30,500,000.00	\$30,144,500.00	\$27,589,784.41	\$27,444,953.11	\$144,831.30	\$21,082,690.51	\$21,082,690.51	69.11%	76.41%
4	Solución vial en Av. 5 de Mayo y Periférico, segunda etapa, municipio de Zapopan	\$95,000,000.00	\$34,615,000.00	\$34,508,878.49	\$34,248,878.95	\$259,999.54	\$20,421,032.16	\$20,421,032.16	100.00%	59.18%
5	Construcción de paisaje urbano y andador de calle Independencia - Hidalgo, primera etapa, Municipio de San Pedro Tlaquepaque	\$15,000,000.00	\$14,835,000.00	\$13,074,478.64	\$13,074,478.64	\$0.00	\$3,922,943.40	\$3,922,943.40	0.00%	30.00%
6	Construcción de conexión troncal de transporte público en Av. Tonala, segunda etapa, Municipio de Tonala	\$20,000,000.00	\$19,780,000.00	\$24,110,257.36	\$24,004,284.28	\$103,973.08	\$24,004,283.96	\$24,004,283.96	100.00%	99.57%
7	Construcción de paisaje urbano, andador y ciclovia en Av. Anita Camacho, segunda etapa, Municipios de Guadalajara y Zapopan	\$17,941,428.00	\$17,744,072.29	\$16,109,248.28	\$16,109,248.28	\$0.00	\$16,109,247.19	\$16,109,247.19	100.00%	100.00%
8	Construcción de paisaje urbano, andador y ciclovia en Av. Revolución, primera etapa, municipio de Guadalajara	\$49,500,000.00	\$48,955,600.00	\$51,414,805.19	\$51,154,783.40	\$260,021.79	\$23,948,448.51	\$21,349,249.63	47.24%	46.58%
9	Solución vial y troncal de transporte público circuito Av. Adolf Horn, primera etapa, municipios de San Pedro Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga	\$70,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
10	Rehabilitación de la calle Monte Everest y Construcción del Libramiento Zapotlanejo-Guadalajara (ruta Juancacatlán-Tonalá), primera etapa, Municipio de Zapotlanejo	\$5,000,000.00	\$4,945,000.00	\$4,945,000.00	\$4,879,028.43	\$65,971.57	\$4,793,744.67	\$4,793,744.67	94.74%	96.94%
11	Rehabilitación de infraestructura vial y ciclovia en calle Hidalgo, primera etapa, en la localidad de San José del Castillo, Municipio de El Salto	\$6,000,000.00	\$4,945,000.00	\$4,945,000.00	\$4,842,489.24	\$102,510.74	\$4,842,481.19	\$4,842,481.19	97.38%	97.93%
12	Rehabilitación de infraestructura vial y equipamiento urbano en calle Donato Ibarra, primera etapa, en la cabecera municipal de Juancacatlán	\$5,000,000.00	\$4,945,000.00	\$4,945,000.00	\$4,944,000.01	\$99.99	\$4,944,000.01	\$3,250,454.03	65.81%	99.98%
13	Rehabilitación de infraestructura vial y equipamiento urbano en calle Hidalgo, en la localidad de Alegría, Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos	\$5,000,000.00	\$4,945,000.00	\$4,945,000.00	\$4,899,183.47	\$45,816.53	\$4,048,227.31	\$4,048,227.31	81.82%	81.87%

En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, publicado en el Diario Oficial de la Federación DOF: 30/11/2016, específicamente para Fondo Metropolitano Zona Metropolitana de la Ciudad de Guadalajara se autorizó un monto de \$327, 941,428

En este sentido y posterior a la gestión ante la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al 31 de diciembre de 2017, únicamente se transfirió a Jalisco el monto de \$255,104,072.29 especificado en el cuadro anterior; toda vez que el recurso ministrado por la federación se recibe etiquetado para las acciones contenidas en la Cartera de Proyectos registrada, para la acción número 9 "Solución vial y troncal de transporte público circuito Adolf Horn, primera etapa, municipios de San Pedro Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga" no se ministró el recurso solicitado, razón por la cual esta acción se muestra en \$0.00



Secretaría de Infraestructura
y Obra Pública

Una vez señalado lo anterior, los miembros del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos del Fideicomiso, recomiendan a los miembros del Comité Técnico autorizar el Avance Físico - Financiero del Ejercicio 2017 presentado por la instancia ejecutora, con fecha de corte al 30 de junio de 2018, quedando aprobado por unanimidad.

PUNTO 4. Reintegro a la TESOFE de recursos 2017.

Continuando con la Orden del día, el Ing. Jacinto de la O Campos expone a los presentes que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ministró a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco recursos del Fondo Metropolitano 2017 por un monto de \$255' 104,072.29 (Doscientos cincuenta y cinco millones, ciento cuatro mil setenta y dos pesos 29/100 M.N.); quedando un monto de **\$1'168,166.14** (Un millón ciento sesenta y ocho mil ciento sesenta y seis pesos 14/100 M.N.) correspondiente al **saldo sin contratar** al 31 de diciembre de 2017; por lo que pide a los miembros del Subcomité Técnico, recomienden al Comité Técnico solicitar a la instancia ejecutora gestione ante la fiduciaria el reintegro del saldo señalado más los intereses generados a la fecha de la devolución del recurso a la SEPAF, para que ésta realice lo propio ante la Tesorería de la Federación (TESOFE); quedando aprobado por unanimidad.

PUNTO 5. Asuntos Varios.

El Subcomité Técnico no presenta temas a considerar en Asuntos Varios, dentro del orden del día.

PUNTO 6. Acuerdos.

Continuando con el orden del día el Ing. Jacinto de la O Campos, en su calidad de Prosecretario Técnico del Consejo, procede a la lectura de los siguientes.

ACUERDOS

Acuerdo 01/41

El Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos del Fideicomiso Público de Administración e Inversión encomienda al Comité Técnico autorizar el informe presentado por la instancia ejecutora del avance físico-financiero del Ejercicio 2016.

Acuerdo 02/41

Los representantes del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos del Fideicomiso recomiendan al Comité Técnico autorice el informe del Avance Físico y Financiero del Ejercicio Fiscal 2017, con cifras al 30 de junio del 2018.


Acuerdo 03/41

Los miembros del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos del Fideicomiso exhortan al Comité Técnico solicite a la instancia ejecutora, gestionar ante la fiduciaria el reintegro del saldo correspondiente al recurso sin contratar, más los intereses generados a la fecha de la devolución.

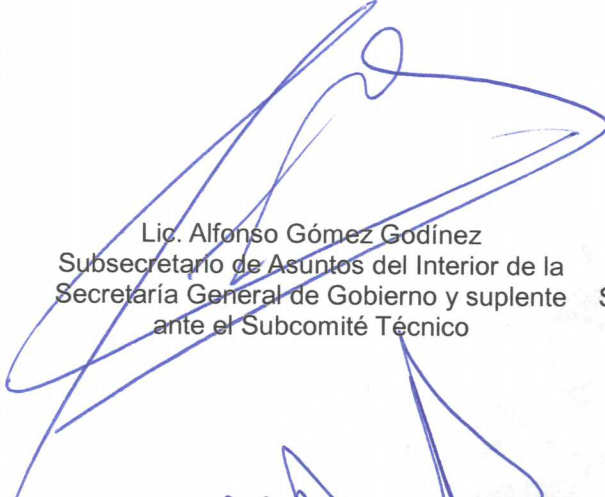
Agotado el orden del día, el Ing. Jacinto de la O Campos, Director General Sectorial, de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y Prosecretario Técnico del Consejo para el Desarrollo Metropolitano de Guadalajara, concluyó la sesión a las 11:25 horas.






 Ing. Jacinto de la O Campos
 Director General Sectorial
 de la Secretaría de Infraestructura y Obra
 Pública y Prosecretario Técnico del Consejo


 Lic. Martha Lorena Benavides Castillo
 Directora General de Vinculación
 Administrativa de la Secretaría de
 Planeación, Administración y Finanzas y
 suplente del Presidente ante el
 Subcomité Técnico


Secretaría de Infraestructura
 y Obra Pública


 Lic. Alfonso Gómez Godínez
 Subsecretario de Asuntos del Interior de la
 Secretaría General de Gobierno y suplente
 ante el Subcomité Técnico


 Prof. y Lic. Daviel Trujillo Cuevas
 Secretario de Desarrollo e Integración
 Social y titular ante el Subcomité Técnico


 Lic. Juan Manuel Alatorre Franco
 Director General de Inversión Pública de la
 Subsecretaría de Planeación y Evaluación y
 Comité de Planeación y Desarrollo Estatal
 COPLADE y titular ante el Subcomité
 Técnico


 Lic. Sañik Alarcón-Esparza
 Subdelegado de Desarrollo Urbano,
 Ordenación del Territorio y Vivienda de la
 Secretaría de Desarrollo Agrario,
 Territorial y Urbano SEDATU Jalisco y
 suplente ante el Subcomité Técnico


 Arq. María Trinidad Saracco Soltero
 Secretaria de Actas



Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

ANEXO 1

FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE GUADALAJARA RECURSO FISCAL 2017

	AUTORIZADO PEF 2017	DISPONIBLE	MODIFICADO	COMPROMETIDO	REINTEGRO (SALDO SIN CONTRATAR AL 31 DE DIC)	DEVENGADO/ EJERCIDO AL 30 DE JUN-2018	PAGADO AL 30 DE JUN-2018	SALDO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
	\$327,941,428.00	\$255,104,072.29	\$255,104,072.29	\$253,935,906.15	\$1,168,164.14	\$163,084,020.78	\$158,235,345.28	\$90,851,885.37	75.67%	73.62%
1	\$45,000,000.00	\$44,505,000.00	\$43,789,619.90	\$43,629,096.11	\$140,523.79	\$26,387,785.32	\$26,387,785.32	\$17,241,310.79	40.00%	60.26%
2	\$25,000,000.00	\$24,725,000.00	\$24,725,000.00	\$24,699,281.99	\$25,718.01	\$8,577,136.35	\$8,021,103.71	\$16,122,145.64	27.00%	34.69%
3	\$30,500,000.00	\$30,164,500.00	\$27,589,784.41	\$27,444,953.11	\$144,831.30	\$21,082,690.51	\$21,082,690.51	\$4,362,262.60	88.00%	76.41%
4	\$35,000,000.00	\$34,615,000.00	\$34,508,878.49	\$34,248,878.95	\$259,999.54	\$20,421,032.16	\$20,421,032.16	\$13,827,846.79	100.00%	59.18%
5	\$15,000,000.00	\$14,835,000.00	\$13,076,478.66	\$13,076,478.66	\$0.00	\$3,922,943.60	\$3,922,943.60	\$9,153,535.06	0.00%	30.00%
6	\$20,000,000.00	\$19,780,000.00	\$24,110,257.36	\$24,006,284.28	\$103,973.08	\$24,006,283.96	\$24,006,283.96	\$0.32	100.00%	99.67%

Esta hoja pertenece a la XLI Sesión Ordinaria del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos del Fideicomiso Público de Administración e Inversión "Fondo Metropolitano Ciudad de Guadalajara" celebrada el 26 de Julio de 2018.



Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE GUADALAJARA
RECURSO FISCAL 2017

	AUTORIZADO FEB 2017	DISPONIBLE	MODIFICADO	COMPROMETIDO	REINTEGRO (SALDO SIN CONTRATAR AL 31 DE DIC)	DEVENGADO/ EJERCIDO AL 30 DE JUN-2018	PAGADO AL 30 DE JUN-2018	SALDO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
	\$327,941,428.00	\$255,104,072.29	\$255,104,072.29	\$253,935,906.15	\$1,168,166.14	\$143,064,020.78	\$158,235,345.28	\$70,851,885.37	75.47%	73.62%
7	\$17,941,428.00	\$17,744,072.29	\$16,109,248.28	\$16,109,248.28	\$0.00	\$16,109,247.19	\$16,109,247.19	\$1.09	100.00%	100.00%
8	\$49,500,000.00	\$48,955,500.00	\$51,414,805.19	\$51,156,983.60	\$257,821.59	\$23,948,448.51	\$21,349,349.63	\$27,208,535.09	53.00%	46.58%
9	\$70,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
10	\$5,000,000.00	\$4,945,000.00	\$4,945,000.00	\$4,879,028.43	\$65,971.57	\$4,793,744.67	\$4,793,744.67	\$85,283.76	100.00%	96.94%
11	\$5,000,000.00	\$4,945,000.00	\$4,945,000.00	\$4,842,489.26	\$102,510.74	\$4,842,481.19	\$4,842,481.19	\$8.07	100.00%	97.93%
12	\$5,000,000.00	\$4,945,000.00	\$4,945,000.00	\$4,944,000.01	\$999.99	\$4,944,000.01	\$3,250,456.03	\$0.00	100.00%	99.98%
13	\$5,000,000.00	\$4,945,000.00	\$4,945,000.00	\$4,899,183.47	\$45,816.53	\$4,048,227.31	\$4,048,227.31	\$850,956.16	100.00%	81.87%

Esta hoja pertenece a la XLII Sesión Ordinaria del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos del Fideicomiso Público de Administración e Inversión "Fondo Metropolitano Ciudad de Guadalajara" celebrada el 26 de Julio de 2018.
