

# Generación de Infraestructura Social Básica

**Nombre** Generación de Infraestructura Social Básica

Actualizado 31 de diciembre de 2010

## Descripción

Asignar recursos a municipios para la construcción de obras de infraestructura social básica para proporcionar mínimos de bienestar y posibilidades de desarrollo a localidades rurales de alta y muy alta marginación, con una población no mayor a 2,500 habitantes, para que las comunidades en extrema pobreza se adhieran al desarrollo sostenido y a la productividad, y se conviertan en comunidades integradoras a través de los municipios (Consejos comunitarios, Comités de Obra, H. Ayuntamientos y Beneficiados).

## Objetivo

Abatir los índices de pobreza y elevar la calidad de vida de los habitantes de las comunidades rurales con alta y muy alta marginación a través de construcción de vialidades, líneas de agua potable, electrificación, ), dónde se desarrollará infraestructura rural básica para agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinización, salud pública, vial, electrificación, urbanización.

## Porcentaje de Avance

111.75

## Fecha de inicio

01/01/10

## Fecha de Término

31/12/10

## Dependencia


Secretaría de Desarrollo Rural

## Área

## Responsable


Dirección General de Regiones Prioritarias

## Cumplimiento de Metas

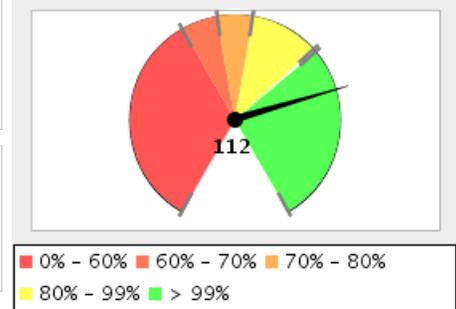

## Avance Anual

Fecha	Meta	Avance
31-ene-10	0	0
28-feb-10	0	0
31-mar-10	0	0
30-abr-10	0	0
31-may-10	0	0
30-jun-10	0	0
31-jul-10	9	2.5
31-ago-10	25	2.75
30-sep-10	37	9.25
31-oct-10	55	23
30-nov-10	76	67
31-dic-10	100	100

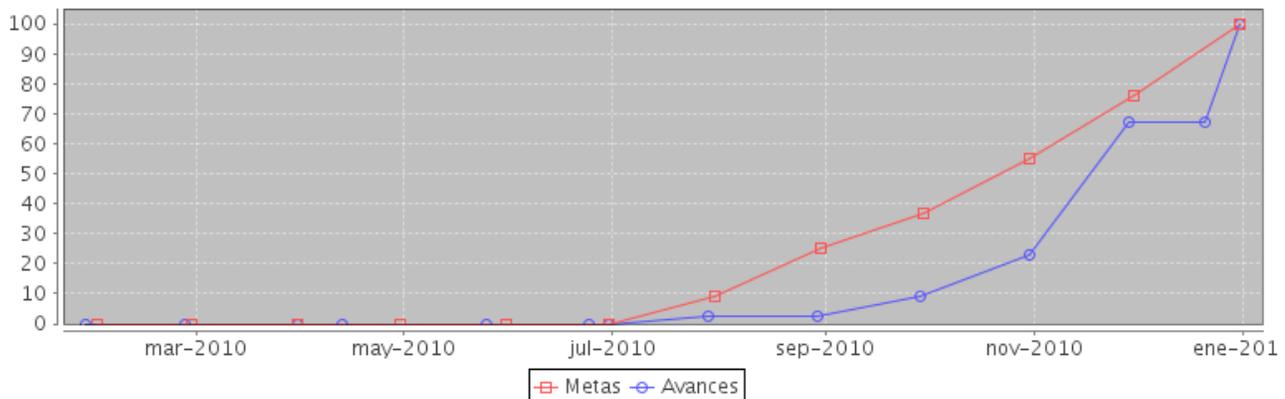

Componente	noviembre		diciembre	
	Meta	Avance	Meta	Avance
1.- Infraestructura eléctrica rural	7	9	9	15
2.- Infraestructura social básica en vialidades	35	37	48	59
3.- Infraestructura social básica hidráulica y alcantarillado.	63	35	80	51
4.- Infraestructura y equipamiento básico rural	11	7	15	14


## Componente 1: Infraestructura eléctrica rural

<b>Nombre</b>	Infraestructura eléctrica rural		
<b>Fecha de</b>	01/01/10	<b>Fecha de Fin</b>	31/12/10
<b>Última Actualización</b>	31/12/10		
<b>Nota</b>			

Fecha	Meta	Avance
31-ene-10	0	0
28-feb-10	0	0
31-mar-10	0	0
30-abr-10	0	0
31-may-10	0	0
30-jun-10	0	0
31-jul-10	1	0
31-ago-10	3	0
30-sep-10	4	0
31-oct-10	6	2
30-nov-10	7	9
31-dic-10	9	15

### Indicador: Número de obras entregadas

<b>Nombre</b>	Número de obras entregadas		
<b>Descripción</b>	Construcción de obras de electrificación rural implementadas		
<b>Valor Inicial</b>	0	<b>Valor Actual</b>	15

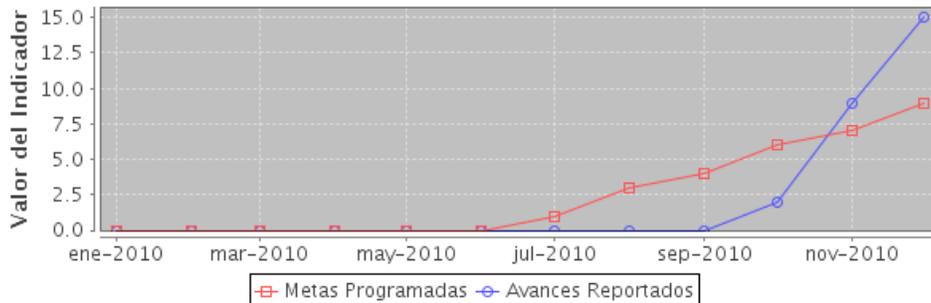


## Componente 2: Infraestructura social básica en vialidades

<b>Nombre</b>	Infraestructura social básica en vialidades		
<b>Fecha de</b>	01/01/10	<b>Fecha de Fin</b>	31/12/10
<b>Última Actualización</b>	31/12/10		
<b>Nota</b>	A la fecha el Programa reporta 59 obras obras concluidas físicamente respecto a infraestructura social básica en vialidades, continúa el proceso de ejecución de algunas obras.		

Fecha	Meta	Avance
31-ene-10	0	0
28-feb-10	0	0
31-mar-10	0	0
30-abr-10	0	0
31-may-10	0	0
30-jun-10	0	0
31-jul-10	3	0
31-ago-10	9	0
30-sep-10	15	3
31-oct-10	20	14
30-nov-10	35	37
31-dic-10	48	59

### Indicador: Número de obras entregadas

<b>Nombre</b>	Número de obras entregadas		
<b>Descripción</b>	Construcción de infraestructura social básica en vialidades (empedrados, banquetas, puentes peatonales, huellas de rodamiento, entre otros).		
<b>Valor Inicial</b>	0	<b>Valor Actual</b>	59

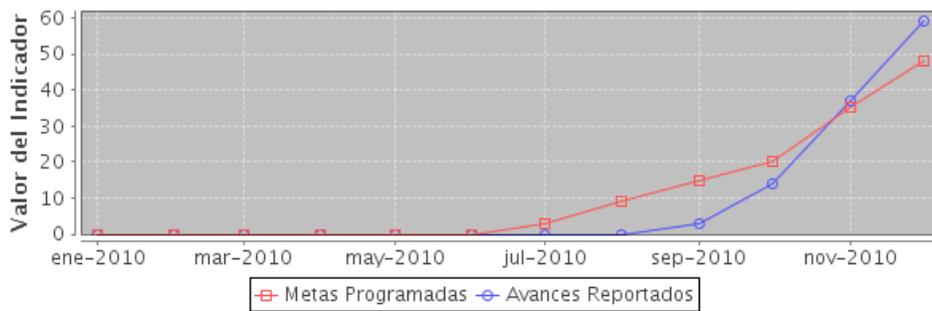


### Componente 3: Infraestructura social básica hidráulica y alcantarillado.

<b>Nombre</b>	Infraestructura social básica hidráulica y alcantarillado.	
<b>Fecha de</b>	01/01/10	<b>Fecha de Fin</b> 31/12/10
<b>Última Actualización</b>	31/12/10	
<b>Nota</b>		

Fecha	Meta	Avance
31-ene-10	0	0
28-feb-10	0	0
31-mar-10	0	0
30-abr-10	0	0
31-may-10	0	0
30-jun-10	0	0
31-jul-10	5	2
31-ago-10	17	3
30-sep-10	30	3
31-oct-10	46	11
30-nov-10	63	35
31-dic-10	80	51

#### Indicador: Número de obras entregadas

<b>Nombre</b>	Número de obras entregadas	
<b>Descripción</b>	Construcción de obras de captación, extracción, distribución y almacenamiento de agua potable, drenaje y letrinización, mejorando la calidad de vida de las comunidades rurales.	
<b>Valor Inicial</b>	0	<b>Valor Actual</b> 51

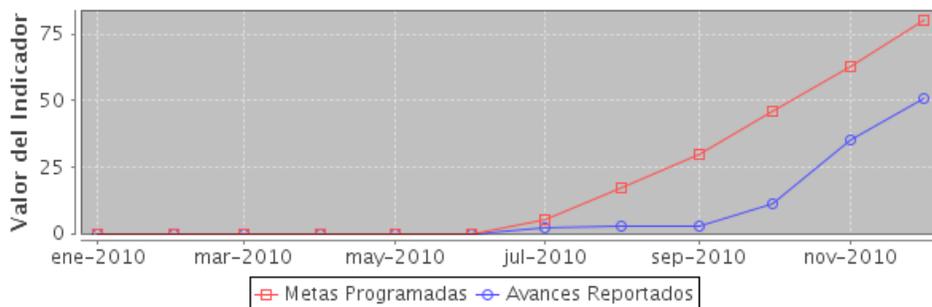

## Componente 4: Infraestructura y equipamiento básico rural

<b>Nombre</b>	Infraestructura y equipamiento básico rural		
<b>Fecha de</b>	01/01/10	<b>Fecha de Fin</b>	31/12/10
<b>Última Actualización</b>	31/12/10		
<b>Nota</b>			

Fecha	Meta	Avance
31-ene-10	0	0
28-feb-10	0	0
31-mar-10	0	0
30-abr-10	0	0
31-may-10	0	0
30-jun-10	0	0
31-jul-10	2	1
31-ago-10	4	1
30-sep-10	5	4
31-oct-10	8	4
30-nov-10	11	7
31-dic-10	15	14

### Indicador: Número de obras entregadas

<b>Nombre</b>	Número de obras entregadas		
<b>Descripción</b>	Construcción y equipamiento a través de infraestructura social básica (centros de salud, unidades deportivas, aulas, bodegas, muros, salones, entre otros).		
<b>Valor Inicial</b>	0	<b>Valor Actual</b>	14

