

**ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DEL FIDEICOMISO 2181
"FONDO METROPOLITANO
PUERTO VALLARTA"
(EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016)**

En la ciudad de Tepic, Nayarit; siendo las 13:00 horas del día **04 de Agosto del año 2016 dos mil dieciseis**, en la Sala de Juntas "José Armenta" de la Secretaría de Planeación, Programación y Presupuesto del Gobierno del Estado de Nayarit, se reunieron:

Por parte de Nayarit:

los C.C. **Mtro. José Trinidad Espinoza Vargas**, Secretario General de Gobierno y representante del C. Gobernador **Roberto Sandoval Castañeda**; **Mtro. Mario Alberto Pacheco Ventura**, Secretario de Administración y Finanzas en carácter de presidente rotativo anual del Consejo para el Desarrollo Metropolitano de Puerto Vallarta—Bahía de Banderas; **Lic. Roy Argel Gómez Olguin**, Secretario de Planeación, Programación y Presupuesto y Coordinador General del COPLADENAY; **Ing. Sergio Tapia Pérez** Director General de Programas Operativos de la Secretaría de Planeación, Programación y Presupuesto y Secretario Técnico del Consejo; **C.P. Luis Antonio Apaseo Gordillo**, Secretario de la Contraloría General; **Ing. Juan Ignacio Ávila Ruiz** Secretario de Obras Públicas y Ejecutor de Obras y Proyectos; **Lic. Gerardo Aguirre Barrón**, Delegado Estatal en Nayarit de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y representante del C. Enrique González Tiburcio, Subsecretario de Ordenamiento Territorial de SEDATU Federal; y **Ing. Roberto Rodríguez Medrano**, Delegado Estatal en Nayarit de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; **Lic. Juan Roberto Ocampo Solís**, Encargado del Despacho de la Delegación de BANOBRAS en el Estado y Representante del Fiduciario del Fideicomiso 2181 "Fondo Metropolitano Puerto Vallarta-Bahía de Banderas"; y **M.A. Ana Elvira Zerecero Valderrama**, Jefa del Departamento de Planeación de la Secretaría de Obras Públicas y Secretaria de Actas del Consejo para el Desarrollo Metropolitano de Puerto Vallarta-Bahía de Banderas;

Por parte de Jalisco:

Ing. Roberto Dávalos López, Secretario de Infraestructura y Obra Pública y Secretario Técnico del Consejo y representante del Gobernador, **Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz**; **Lic. Raúl Juárez Valencia**, Subsecretario de Asuntos del Interior y representante del Secretario **Mtro. Roberto López Lara**, de la Secretaría General de Gobierno; **Mtro. Cesar Eduardo Uribe Vera**, Director de Fideicomisos de la Subsecretaria de Planeación. y representante del Secretario de Planeación, Administración y Finanzas, **Mtro. Héctor Pérez Partida**; **Prof. y Lic. Daviel Trujillo Cuevas**, Subsecretario de Participación Social y Ciudadana de y representante de **Lic. Miguel Castro Reynoso**, de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social; **Mtro. Luis Enrique Barboza Niño**, **Director General de Verificación y Control de la Obra** y representante de la **Lic. María Teresa Brito Serrano**, **Contralora del Estado**; a efecto de celebrar la Tercera Sesión Ordinaria 2016 del Consejo del Fideicomiso 2181 "Fondo Metropolitano Puerto Vallarta" que fue previa y legalmente convocada mediante la invitación respectiva, conforme al siguiente:

Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo del Fideicomiso 2181 "Fondo Metropolitano Puerto Vallarta-Bahía de Banderas"

ORDEN DEL DÍA

1. Bienvenida y Declaración de Quórum Legal.
2. Revisión y aprobación del orden del día.
3. Reporte de avances físico-financiero a la fecha por parte de los estados de:
 - Jalisco:
 - Ejercicio Fiscal 2015.
 - Ejercicio Fiscal 2016.
 - Nayarit
 - Ejercicio Fiscal 2015.
 - Ejercicio Fiscal 2016.
4. Solicitud de modificación de nombre, metas y calendarización del los proyectos del Ejercicio Fiscal 2016 por parte del Estado de Nayarit.
5. Informe de la situación financiera por parte de la fiduciaria BANOBRAS al 30 de Junio de 2016.
6. Asuntos Generales.
7. Acuerdos.
8. Clausura de Sesión.

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DIA

1.- BIENVENIDA Y DECLARACION DE QUÓRUM LEGAL.- Siendo las 13:00 horas y comenzando con el punto uno del orden del día, se procede a dar inicio a la **Tercera Sesión Ordinaria del Consejo del Fideicomiso 2181 "Fondo Metropolitano Puerto Vallarta-Bahía de Banderas"**; en uso de la palabra el **Mtro. Mario Alberto Pacheco Ventura**, Secretario de Administración y Finanzas y Presidente de este Consejo, procede a pasar lista de asistencia, manifestando que están presentes la totalidad de los convocados a la presente reunión; por lo que se declara la existencia de quórum legal para llevar a cabo la segunda sesión, y en consecuencia validos todos los acuerdos que de ésta emanen.

2- LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.- Procediendo con el segundo punto del orden del día, el **Mtro. Mario Alberto Pacheco Ventura**, Secretario de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit y Presidente de este Consejo, procede a realizar la lectura del orden del día, aprobándolo por unanimidad de los presentes.

3.- REPORTE DE AVANCES FÍSICO-FINANCIERO A LA FECHA POR PARTE DE LOS ESTADOS DE:

JALISCO.- En cumplimiento al cuarto punto de la orden del día el Ing. Sergio Tapia Pérez, Secretario Técnico del Consejo cede el uso de la palabra al Ing. Roberto Dávalos López, **Secretario de Infraestructura y Obra Pública** quien, informa el avance físico-financiero del ejercicio fiscal 2015 al 30 treinta de junio del 2016:

2015

NOMBRE DE LA OBRA	INVERSIÓN TOTAL	CONTRATADO	SALDO POR CONTRATAR	EJERCIDO	SALDO	AVANCE FINANCIERO JUN/2016	AVANCE FISICO JUN/2016
Construcción de Puente Vehicular en la Av. México – Agapito Medina sobre el río Pitillal en Fluvial Vallarta, en el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.	\$24,695,185.00	\$24,695,185.00	\$0.00	\$10,908,182.80	\$13,683,102.71	44%	53%
Productos financieros	\$382,658.61	\$0.00	\$382,658.61	\$0.00	\$0.00		
TOTAL	\$25,077,843.61	\$24,695,185.00	\$382,658.61	\$10,908,182.80	\$13,683,102.71	44%	53%

2016

Se encuentra en proceso de envío en el portal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

NAYARIT.- En cumplimiento al cuarto punto de la orden del día el Ing. Sergio Tapia Pérez, Secretario Técnico del Consejo, cede la palabra a la Arq. María Dolores Luna Castañeda, Encargada del Despacho de la Secretaría de Obras Públicas y Ejecutora de Obras y Proyectos quien expone los avances físicos y financieros de los proyectos que se están ejecutando con recurso Fiscal 2015, como se enlista a continuación:

ACCION	MONTO					AVANCE	
	AUTORIZADO	DISPONIBLE	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO
Construcción de vialidades de acceso al Puente Federación en el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. Sexta Etapa.	\$9,902,664.30	\$9,892,761.64	\$9,885,836.30	\$9,885,836.28	\$6,927,010.75	100%	99.92%
Construcción de Entronque Carretero del camino Cruz de Huanacaxtle-Punta de Mita en el km. 0+000, en el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.	\$5,940,000.00	\$5,934,060.00	\$5,916,571.03	\$5,897,528.35	\$36,531.65	100.00%	99.38%
Colector Pluvial tramo: Carretera Federal 200 (km. 146+600 - km 145+900) en la localidad de Mezcales, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.	\$8,852,520.70	\$8,843,668.18	\$8,834,160.88	\$2,650,248.26	\$6,193,419.92	100.00%	30%

2016.- Comenta que las notas técnicas ya fueron ingresadas al sistema de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, estas ya fueron revisadas por los especialistas y se encuentran en proceso de solventación por parte de personal del Estado de Nayarit.

4.- SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE PROYECTO, NOMBRE, METAS Y CALENDARIO DE EJECUCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016, POR PARTE DE LOS ESTADO DE NAYARIT.- El Ing. Sergio Tapia Pérez, Secretario Técnico del Consejo cede la palabra al Ing. Juan Ignacio Avila quien comenta la necesidad de replantear un proyecto, los nombres, las metas y calendario de ejecución de los proyectos autorizados, derivado del registro, revisión y solventación de observaciones a las notas técnicas, y solicita sean modificados de la siguiente manera:

Cartera de programas, proyectos, estudios, acciones y obras de infraestructura y su equipamiento

No. Del Programa o Proyecto	Denominación del Programa o proyecto	Recursos programados (Pesos)	Meta Programada	Unidad de medida	Ubicación: Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o unidad responsable
TOTAL		24,695,185.00				
1	Iluminación, jardinería, entronque y vialidades de acceso al Puente Federación en el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, Séptima Etapa.	21,000,000.00	100.00	ML	Bahía de Banderas, San Vicente.	Secretaría de Obras Públicas, Nayarit
2	Actualización del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Bahía de Banderas, Nayarit.	3,695,185.00	1.00	Estudio	Bahía de Banderas, Mezcales	Secretaría de Obras Públicas, Nayarit

Modificación nombre y metas

Caleendario de Ejecución y Gasto: de 12 meses a partir de que se radique el recurso.

No. Del Programa o Proyecto	Denominación del programa o proyecto	Acción	Caleendario de ejecución												TOTAL		
			Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12			
TOTAL																	
1	Iluminación, jardinería, entronque y vialidades de acceso al Puente Federación en el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, Séptima Etapa.	Trazo (No)	0%	25%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	24,695,185.00
		Presupuesto (P)	1,024,500.00	2,294,925.00	1,050,000.00	1,024,500.00	1,024,500.00	1,024,500.00	1,024,500.00	1,024,500.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	21,000,000.00
2	Actualización del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Bahía de Banderas, Nayarit.	Trazo (No)	5%	25%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	3,695,185.00
		Presupuesto (P)	184,739.25	923,706.25	184,739.25	184,739.25	184,739.25	184,739.25	184,739.25	184,739.25	369,478.50	369,478.50	369,478.50	369,478.50	369,478.50	369,478.50	3,695,185.00

Modificación nombre y metas

Caleendario de ministración:

No. Del Programa o Proyecto	Denominación del programa o proyecto	Caleendario de ministración (pesos)			
		Mes 1	Mes 2	Uno al millar	TOTAL
TOTAL					24,695,185.00
1	Iluminación, jardinería, entronque y vialidades de acceso al Puente Federación en el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, Séptima Etapa.	10,489,500.00	10,489,500.00	21,000.00	21,000,000.00
2	Actualización del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Bahía de Banderas, Nayarit.	1,845,744.91	1,845,744.91	3,695.19	3,695,185.00

Modificación nombre y metas

Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo del Fideicomiso 2181 "Fondo Metropolitano Puerto Vallarta-Bahía de Banderas"

Presentando la Cartera de Programas, Proyectos, Estudios, Acciones y Obras de Infraestructura y su Equipamiento, y Calendario de Ejecución del Presupuesto 2016 de la Zona Metropolitana Puerto Vallarta por parte de NAYARIT, quedando como sigue:

Cartera de programas, proyectos, estudios, acciones y obras de infraestructura y su equipamiento (MODIFICADO)

No. Del Programa o Proyecto	Denominación del Programa o proyecto	Recursos programados (Pesos)	Meta		Ubicación: Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o unidad responsable
			Programada	Unidad de medida		
TOTAL		24,695,185.00				
1	Iluminación, entronque y vialidades de acceso al Puente Federación en el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, Séptima Etapa.	21,000,000.00	6,409.56	m2	Bahía de Banderas, San Vicente	Secretaría de Obras Públicas, Nayarit
2	Actualización del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Bahía de Banderas, Nayarit.	3,695,185.00	1	Estudio	Bahía de Banderas, Varios	Secretaría de Obras Públicas, Nayarit

Calendario de Ejecución y Gasto (MODIFICADO): de 12 meses a partir de que se radique el recurso.

No. Del Programa o Proyecto	Denominación del programa o proyecto	Acción	Calendario de ejecución												TOTAL		
			Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12			
TOTAL																	
1	Iluminación, entronque y vialidades de acceso al Puente Federación en el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, Séptima Etapa.	Presupuesto (P)	5%	25%	5%	5%	5%	5%	5%	15%	30%	50%	70%	85%	95%	100%	21,000,000.00
		Presupuesto (M)	1,050,000.00	4,200,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	21,000,000.00
2	Actualización del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Bahía de Banderas, Nayarit.	Presupuesto (P)	5%	25%	5%	5%	5%	5%	5%	15%	30%	50%	70%	85%	95%	100%	3,695,185.00
		Presupuesto (M)	184,774.25	744,744.25	184,774.25	184,774.25	184,774.25	184,774.25	184,774.25	369,548.50	739,097.00	1,108,645.50	1,478,194.00	1,847,744.25	1,847,744.25	1,847,744.25	3,695,185.00


Calendario de ministración (MODIFICADO):

No. Del Programa o Proyecto	Denominación del programa o proyecto	Calendario de ministración (pesos)			
		Mes 1	Mes 2	Uno al millar	TOTAL
TOTAL					24,695,185.00
1	Iluminación, entronque y vialidades de acceso al Puente Federación en el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, Séptima Etapa.	10,489,500.00	10,489,500.00	21,000.00	21,000,000.00
2	Actualización del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Bahía de Banderas, Nayarit.	1,845,744.91	1,845,744.91	3,695.19	3,695,185.00

Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo del Fideicomiso 2181 "Fondo Metropolitano Puerto Vallarta-Bahía de Banderas"

Una vez analizada la modificación de proyectos por parte de Nayarit que se ejecutarán para el ejercicio fiscal 2016, este consejo aprueba por unanimidad.

5.- INFORME DE LA SITUACIÓN FINANCIERA POR PARTE DE LA FIDUCIARIA BANOBRAS.- El Lic. Juan Roberto Ocampo Solís, Encargado del Despacho de la Delegación de BANOBRAS en el Estado de Nayarit y Representante del Fiduciario, expone la Situación Financiera del Fideicomiso 2181 "Fondo Metropolitano Puerto Vallarta-Bahía de Banderas" al 30 de Junio del año en curso; según cuadro que se anexa a la presente acta.

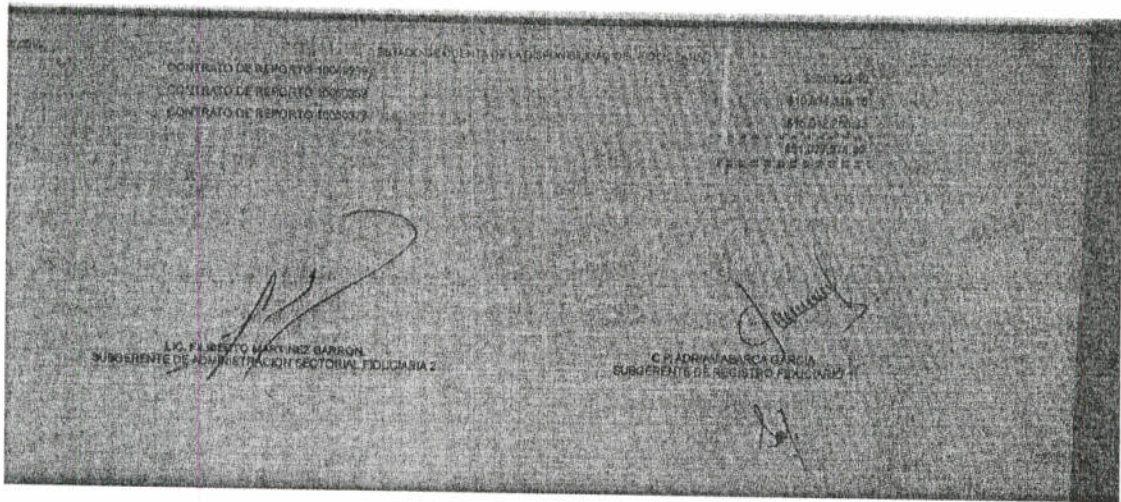

Al no existir Asuntos Generales, y una vez analizadas las propuestas se procede a someter a consideración de este órgano colegiado los siguientes:

FIDEICOMISO 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA
 INSTALACIÓN DE OBRA EN LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE MAYO DE 2016

NÚMERO	MONEDA LOCAL	CONCEPTO	FECHA	VALOR
DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE MAYO DE 2016				
01-06-2016		CONTRATO DE REPORTE 10000000 EN LA JUNTA DE CHEQUES BANCOS S.A. DE LOS RAYOS DE SOL	01-06-2016	2,500.00
04-06-2016		OPEDONEMTO	04-06-2016	5,000.00
11-06-2016		PROCESOS DE MANEJO DEL CONTRATO 10000000 CONSTRUCCION DE PUENTE VIAL EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS NAVARRI, SANTA ETAPA, GUB. FACATUMA B 541	11-06-2016	1,000.00
21-06-2016		CONSTRUCCION Y FINANZIACION VIAL Y ASOCIACION DE CIV. CONSTRUCCION DE PUENTE VIAL EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS NAVARRI, SANTA ETAPA, GUB. FACATUMA B 541	21-06-2016	6,000.00
22-06-2016		REGISTRO COMPLEMENTARIO AL PAGO	22-06-2016	1,000.00
23-06-2016		CAMARA MERCANTIL DE LA REPUBLICA DE LA CONSTRUCCION, CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE ACCESO AL PUENTE VIAL EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS NAVARRI, SANTA ETAPA, GUB. FACATUMA B 541	23-06-2016	1,000.00
24-06-2016		SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE ACCESO AL PUENTE VIAL EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS NAVARRI, SANTA ETAPA, GUB. FACATUMA B 541	24-06-2016	1,000.00
11-06-2016		E.S. GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE ACCESO AL PUENTE VIAL EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS NAVARRI, SANTA ETAPA, GUB. FACATUMA B 541	11-06-2016	4,000.00
22-06-2016		CAMARA MERCANTIL DE LA REPUBLICA DE LA CONSTRUCCION, CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE ACCESO AL PUENTE VIAL EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS NAVARRI, SANTA ETAPA, GUB. FACATUMA B 541	22-06-2016	1,000.00
23-06-2016		SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE ACCESO AL PUENTE VIAL EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS NAVARRI, SANTA ETAPA, GUB. FACATUMA B 541	23-06-2016	1,000.00
24-06-2016		E.S. GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE ACCESO AL PUENTE VIAL EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS NAVARRI, SANTA ETAPA, GUB. FACATUMA B 541	24-06-2016	1,000.00
25-06-2016		REGISTRO COMPLEMENTARIO AL PAGO	25-06-2016	1,000.00

6.- ASUNTOS GENERALES.- En cumplimiento al sexto punto de la orden del día el Ing. Sergio Tapia Pérez, Secretario Técnico del Consejo, solicite se ratifique el calendario de sesiones ordinarias del Consejo como a continuación se detalla:

No. Sesión Ordinaria	Fecha
1a. Ordinaria Consejo (Instalación)	martes, 19 de enero de 2016
2a. Ordinaria Consejo	viernes, 18 de marzo de 2016
3a. Ordinaria Consejo	jueves, 04 de agosto de 2016
4a. Ordinaria Consejo	viernes, 23 de septiembre de 2016
5a. Ordinaria Consejo	viernes, 09 de diciembre de 2016

Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo del Fideicomiso 2181 "Fondo Metropolitano Puerto Vallarta-Bahía de Banderas"

Se procede a someter a consideración de este Órgano Colegiado los siguientes:

ACUERDOS

CONSEJO/SO/004/2016: Los miembros del Consejo aprueban por unanimidad los avances físico-financiero a la fecha de los Ejercicios Fiscales 2015 y 2016.

CONSEJO/SO/005/2016: Los miembros del Consejo aprueban por unanimidad la modificación a proyecto, nombre, las metas y calendarización del Ejercicio Fiscal 2016 de la cartera del Estado de Nayarit y ratificando el proyecto aprobado por el Estado de Jalisco, quedando como sigue:

POR EL ESTADO DE JALISCO:

NOMBRE DE LA OBRA	AUTORIZADO	1 AL MILLAR	DISPONIBLE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
Pavimentación de concreto hidráulico de Avenida México, del 2+800 al 9+280 hasta la Av. Federación, Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. Tercera Etapa	\$24,695,185.00	\$24,695.19	\$24,670,489.82	ML	2,260
TOTAL	\$24,695,185.00	\$24,695.19	\$24,670,489.82	ML	900 ML

POR EL ESTADO DE NAYARIT:

No. Del Programa o Proyecto	Denominación del Programa o proyecto	Monto Autorizado	1 al millar	Monto Disponible	Meta Programada	Unidad de medida
TOTAL		24,695,185.00	24,695.19	24,670,489.82		
1	Iluminación, jardinería, entronque y vialidades de acceso al Puente Federación en el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, Séptima Etapa.	21,000,000.00	21,000.00	20,979,000.00	6,409.56	M2
2	Actualización del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Bahía de Banderas, Nayarit.	3,695,185.00	3,695.19	3,691,489.82	1.00	Estudio

CONSEJO/SO/006/2016.- Este Consejo acuerda por unanimidad la ratificación del calendario de sesiones ordinarias del Consejo como a continuación se detalla:

No. Sesión Ordinaria	Fecha
1a. Ordinaria Consejo (Instalación)	martes, 19 de enero de 2016
2a. Ordinaria Consejo	viernes, 18 de marzo de 2016
3a. Ordinaria Consejo	jueves, 04 de agosto de 2016
4a. Ordinaria Consejo	viernes, 23 de septiembre de 2016
5a. Ordinaria Consejo	viernes, 09 de diciembre de 2016


8.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.- Finalmente, en el punto número ocho del orden del día, no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente del Consejo Técnico del Fideicomiso 2181 "Fondo Metropolitano Puerto Vallarta-Bahía de Banderas" procede a declarar clausurada la presente sesión relativa a la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo del Fideicomiso 2181 "Fondo Metropolitano Puerto Vallarta-Bahía de Banderas", siendo las 14:00 horas del día 04 de Agosto del año 2016 dos mil dieciseis, firmando al margen y al calce los que en ella intervienen.

POR EL ESTADO DE NAYARIT




MTRO. JOSÉ TRINIDAD ESPINOZA
VARGAS


SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO y
REPRESENTANTE DEL C. GOBERNADOR
ROBERTO SANDOVAL CASTAÑEDA



MTRO. MARIO ALBERTO PACHECO VENTURA
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS Y PRESIDENTE DEL CONSEJO DEL
FIDEICOMISO 2181

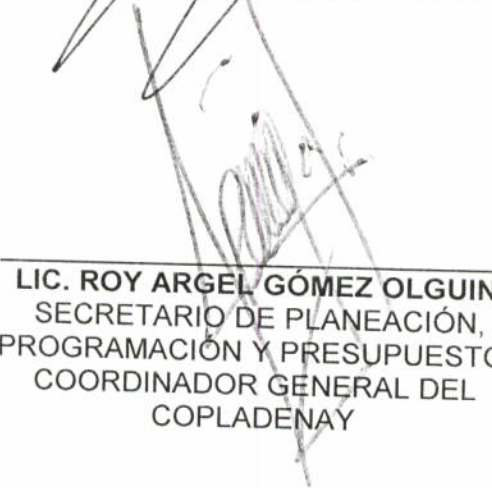


LIC. ROY ARGEL GÓMEZ OLGUIN
SECRETARIO DE PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO,
COORDINADOR GENERAL DEL
COPLADENAY




ING. SERGIO TAPIA PÉREZ
DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMAS
OPERATIVOS DE LA SECRETARIA DE
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Y SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO PARA EL
DESARROLLO METROPOLITANO DE PUERTO
VALLARTA-BAHÍA DE BANDERAS





C.P. LUIS ANTONIO APASEO GORDILLO
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL






ING. JUAN IGNACIO ÁVILA RUIZ
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS EN SU
CARÁCTER DE EJECUTOR DE OBRAS Y
PROYECTOS


LIC. GERARDO AGUIRRE BARRÓN
DELEGADO ESTATAL EN NAYARIT DE LA
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO,
TERRITORIAL Y URBANO Y
REPRESENTANTE DEL C. ENRIQUE
GONZÁLEZ TIBURCIO, SUBSECRETARIO DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE SEDATU
FEDERAL



ING. ROBERTO RODRIGUEZ MEDRANO
DELEGADO ESTATAL EN NAYARIT DE LA
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES



LIC. JUAN-ROBERTO OCAMPO SOLIS
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
DELEGACION DE BANOBRAS EN EL ESTADO Y
REPRESENTANTE DEL FIDUCIARIO DEL
FIDEICOMISO 2181


M.A. ANA ELVIRA ZERECERO VALDERRAMA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN DE
LA SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS Y
SECRETARIA DE ACTAS DEL CONSEJO PARA EL
DESARROLLO METROPOLITANO DE PUERTO
VALLARTA-BAHÍA DE BANDERAS





POR EL ESTADO DE JALISCO


ING. ROBERTO DAVALOS LÓPEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y
OBRA PÚBLICA Y SECRETARIO TÉCNICO
DEL CONSEJO Y REPRESENTANTE DEL
GOBERNADOR


LIC. RAÚL JUÁREZ VALENCIA
SUBSECRETARIO DE ASUNTOS DEL
INTERIOR Y REPRESENTANTE DE LA
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

ESTA HOJA DE FIRMAS PERTENECE AL ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DEL FIDEICOMISO 2181 "FONDO METROPOLITANO PUERTO VALLARTA-BAHÍA DE BANDERAS" CELEBRADA EL DIA 04 DE AGOSTO DEL AÑO 2016 DOS MIL DIECISEIS.



MTRO. CESAR EDUARDO URIBE VERA
DIRECTOR DE FIDEICOMISOS DE LA
SUBSECRETARIA DE PLANEACION. Y
REPRESENTANTE DEL SECRETARIO DE
PLANEACION, ADMINISTRACION Y
FINANZAS



LIC. DAVIEL TRUJILLO CUEVAS
SUBSECRETARIO DE PARTICIPACION
SOCIAL Y CIUDADANA Y REPRESENTANTE
DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO E
INTEGRACION SOCIAL



MTRO. LUIS ENRIQUE BARBOZA NIÑO
DIRECTOR GENERAL DE VERIFICACION Y
CONTROL DE LA OBRA Y REPRESENTANTE
DE LA LIC. MARIA TERESA BRITO SERRANO,
CONTRALORA DEL ESTADO.



ESTA HOJA DE FIRMAS PERTENECE AL ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DEL FIDEICOMISO 2181 "FONDO METROPOLITANO PUERTO VALLARTA-BAHÍA DE BANDERAS" CELEBRADA EL DIA 04 DE AGOSTO DEL AÑO 2016 DOS MIL DIECISEIS.

