

Construcción y distribución de redes Hidroagrícolas en el Estado

Nombre Construcción y distribución de redes Hidroagrícolas en el Estado

Actualizado 31 de diciembre de 2011

Descripción

Los productores agrícolas se ven limitados a cultivos de bajo rendimiento por carecer de una fuente de abastecimiento confiable del vital líquido, obligándolos a depender principalmente de la cantidad de precipitación pluvial, o bien, están sujetos a altos costos de producción derivado de los consumos de energía eléctrica por bombeos para riego. La finalidad de este programa es brindar a los productores agropecuarios la posibilidad de incrementar la producción, además de fomentar la producción piscícola y actividades recreativas, buscando una mejor calidad de vida y cuidando en forma sustentable la naturaleza. Este año se realizara la continuación de 4 presas multianuales las cuales contarán con aportación Federal, así como realizar la construcción de la segunda etapa del sistema de riego el Carrizo con aportación Federal. Asimismo el Estado tiene una responsabilidad compartida con la CNA de realizar acciones preventivas para garantizar y/o disminuir los riesgos de inundaciones, lo cual se ejecutara mediante el desazolve de cuerpos de agua y la trituration de lirio acuático con la intervención de 63 equipos en las 12 regiones del Estado en coordinación con los Municipios y beneficiarios que aportaran su apoyo en especie

Objetivo

Dotar de infraestructura hidráulica básica a través de la construcción de nuevos almacenamientos hidráulicos y sistemas de riego, además de modernizar la infraestructura existente. Así como Desazolver cauces, cuerpos de agua, presas y triturar maleza acuática con maquinaria propiedad del Estado, para la protección de zonas habitacionales rurales y urbanas, así como optimizar el uso del agua y controlar la presencia de maleza acuática.

Porcentaje de Avance

75.50

Fecha de inicio

01/01/11

Fecha de Término

31/12/11

Dependencia

Secretaría de Desarrollo Rural

Área


Responsable

Dirección General de Infraestructura Rural

Nota


La razón por la cual no se cumplió la meta establecida para este año, se debe a la prioridad de los Municipios en la atención de 22 obras diversas, como la construcción de carreteras, construcción de libramientos y rehabilitación de calles en las comunidades y la construcción del Centro de Valor Agregado (extracción de escombros).

Cumplimiento de Metas

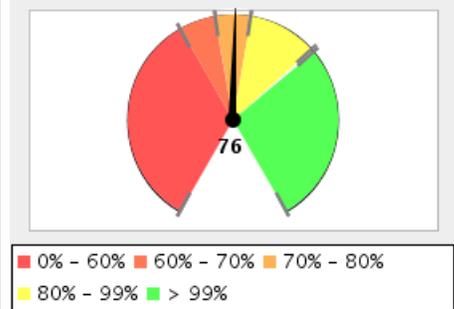

Avance Anual

Fecha	Meta	Avance
31-ene-11	0	0
28-feb-11	3	2
31-mar-11	12	5.25
30-abr-11	16	8.75
31-may-11	18	10
30-jun-11	20	11.75
31-jul-11	21	15
31-ago-11	27	18
30-sep-11	33	23
31-oct-11	39	24.25
30-nov-11	83	36.75
31-dic-11	100	75.5

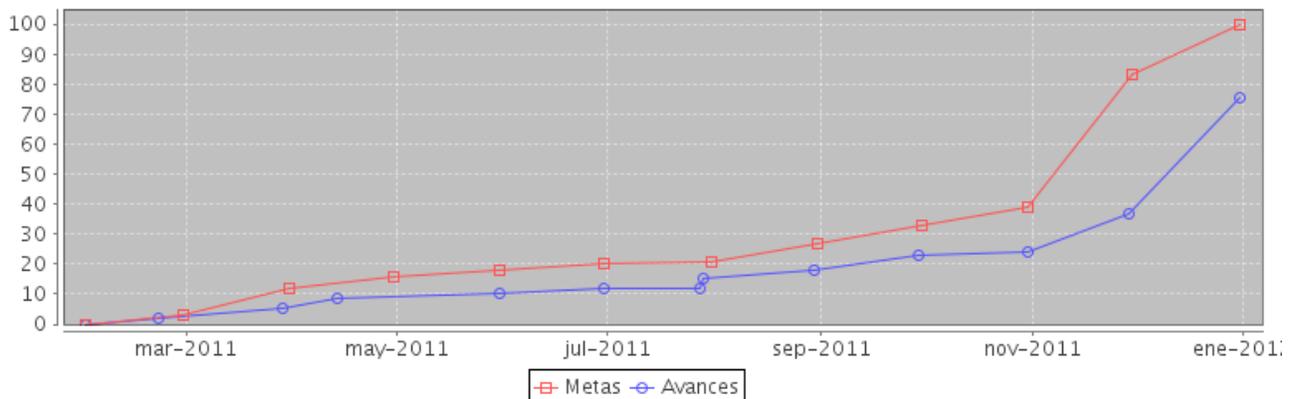

Componente	noviembre		diciembre	
	Meta	Avance	Meta	Avance
1.- Etapas de las presas de almacenamiento de agua construidas	2	2	4	4

Componente	noviembre		diciembre	
	Meta	Avance	Meta	Avance
2.- Hectáreas trituradas de lirio acuático	410	82.1	445	91.6
3.- Metros cúbicos desazolvados en los distintos cuerpos de agua	1116107	992424	1256732	1019068
4.- Primer etapa del sistema de riego construido	1	0	1	1


Componente 1: Etapas de las presas de almacenamiento de agua construidas

Nombre	Etapas de las presas de almacenamiento de agua construidas		
Fecha de	01/01/11	Fecha de Fin	31/12/11
Última Actualización	31/12/11		
Nota			

Fecha	Meta	Avance
31-ene-11	0	0
28-feb-11	0	0
31-mar-11	0	0
30-abr-11	0	0
31-may-11	0	0
30-jun-11	0	0
31-jul-11	0	0
31-ago-11	0	0
30-sep-11	0	0
31-oct-11	0	0
30-nov-11	2	2
31-dic-11	4	4

Indicador: Número de etapas de las presas construidas

Nombre	Número de etapas de las presas construidas		
Descripción	Construcción de cuatro etapas en las presas de almacenamiento con un avance en la participación Estatal en 2011 de; 26% presa el Naranjo 3ra. etapa, 30% presa los Panales 3ra. etapa, 20% presa el Ancón 1ra. etapa y 100% presa Vista Hermosa 5ta. etapa.		
Valor Inicial	0	Valor Actual	4

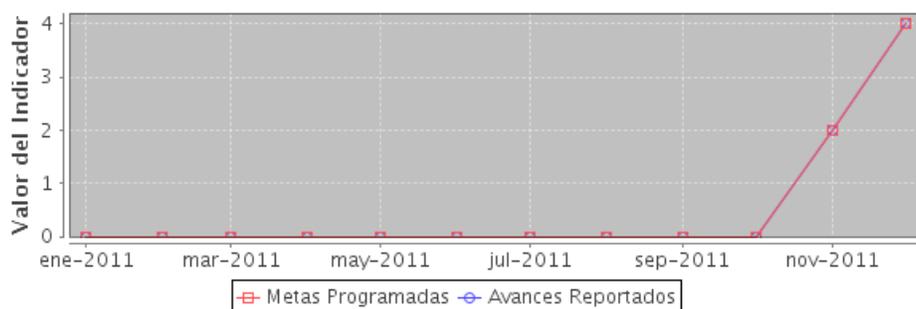


Componente 2: Hectáreas trituradas de lirio acuático

Nombre	Hectáreas trituradas de lirio acuático		
Fecha de	01/01/11	Fecha de Fin	31/12/11
Última Actualización	31/12/11		
Nota			

Fecha	Meta	Avance
31-ene-11	0	0
28-feb-11	10	15
31-mar-11	108	45
30-abr-11	138	49
31-may-11	153	59.8
30-jun-11	163	65.8
31-jul-11	178	69.8
31-ago-11	236	73.8
30-sep-11	296	77.8
31-oct-11	353	82.1
30-nov-11	410	82.1
31-dic-11	445	91.6

Indicador: Número de hectáreas trituradas

Nombre	Número de hectáreas trituradas		
Descripción	Este indicador muestra en número de hectáreas de lirio triturado trituradas en cauces y cuerpos de agua, permitiendo con ello mayor oxigenación y por lo tanto la proliferación de la vida acuática		
Valor Inicial	0	Valor Actual	91.6

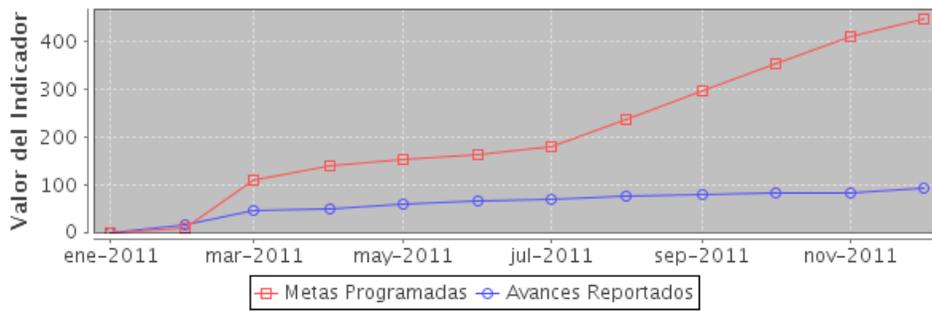


Componente 3: Metros cúbicos desazolvados en los distintos cuerpos de agua

Nombre	Metros cúbicos desazolvados en los distintos cuerpos de agua		
Fecha de	01/01/11	Fecha de Fin	31/12/11
Última Actualización	31/12/11		
Nota			

Fecha	Meta	Avance
31-ene-11	0	0
28-feb-11	140625	65365
31-mar-11	281250	135135
30-abr-11	421875	297581
31-may-11	465785	343344
30-jun-11	509697	397403
31-jul-11	553607	553854
31-ago-11	694232	688587
30-sep-11	834857	938970
31-oct-11	975482	992424
30-nov-11	1116107	992424
31-dic-11	1256732	1019068

Indicador: Número de metros cúbicos desazolvados

Nombre	Número de metros cúbicos desazolvados		
Descripción	Desazolve de cuerpos de agua y cauces federales en lagunas, ríos, arroyos y presas con un total de 1,256,732 metros cúbicos desazolvados.		
Valor Inicial	0	Valor Actual	1019068

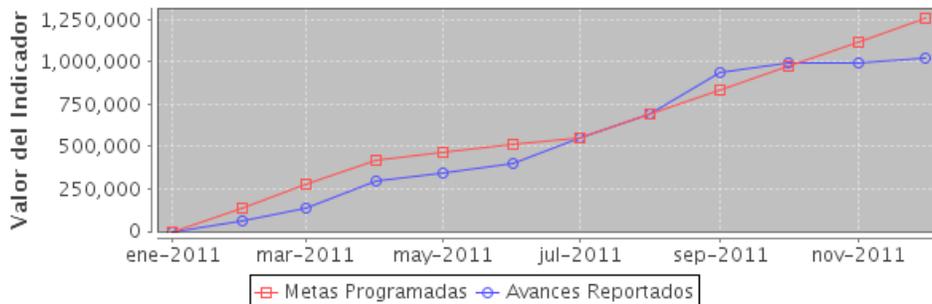

Componente 4: Primer etapa del sistema de riego construido

Nombre	Primer etapa del sistema de riego construido		
Fecha de	01/01/11	Fecha de Fin	31/12/11
Última Actualización	31/12/11		
Nota			

Fecha	Meta	Avance
31-ene-11	0	0
28-feb-11	0	0
31-mar-11	0	0
30-abr-11	0	0
31-may-11	0	0
30-jun-11	0	0
31-jul-11	0	0
31-ago-11	0	0
30-sep-11	0	0
31-oct-11	0	0
30-nov-11	1	0
31-dic-11	1	1

Indicador: Número de etapas de sistema de riego construido

Nombre	Número de etapas de sistema de riego construido		
Descripción	Construcción de la primera etapa del sistema de riego en la presa el Carrizo, con un avance en la participación Estatal en 2011 del 5%.		
Valor Inicial	0	Valor Actual	1

