

Construcción y distribución de redes Hidroagrícolas en el Estado

Nombre Construcción y distribución de redes Hidroagrícolas en el Estado

Actualizado 31 de diciembre de 2012

Descripción

Los productores agrícolas se ven limitados a cultivos de bajo rendimiento por carecer de una fuente de abastecimiento confiable del vital líquido, obligándolos a depender principalmente de la cantidad de precipitación pluvial, o bien, están sujetos a altos costos de producción derivado de los consumos de energía eléctrica por bombeos para riego. La finalidad de este programa es brindar a los productores agropecuarios la posibilidad de incrementar la producción, además de fomentar la producción piscícola y actividades recreativas, buscando una mejor calidad de vida y cuidando en forma sustentable la naturaleza. Este año se realizara la continuación de 7 presas multianuales las cuales contarán con aportación Federal, así como realizar la construcción de 3 etapas de sistemas de riego con aportación Federal. Asimismo el Estado tiene una responsabilidad compartida con la CNA de realizar acciones preventivas para garantizar y/o disminuir los riesgos de inundaciones, lo cual se ejecutara mediante el desazolve de cuerpos de agua y la trituración de lirio acuático con la intervención de maquinaria en las 12 regiones del Estado en coordinación con los Municipios y beneficiarios que aportaran su apoyo en especie

Objetivo

Dotar de infraestructura hidráulica básica a través de la construcción de nuevos almacenamientos hidráulicos y sistemas de riego, además de modernizar la infraestructura existente. Así como Desazolver cauces, cuerpos de agua, presas y triturar maleza acuática con maquinaria propiedad del Estado, para la protección de zonas habitacionales rurales y urbanas, optimizando el uso del agua y controlando la presencia de maleza acuática.

Porcentaje de Avance

94.25

Fecha de inicio

01/01/12

Fecha de Término

31/12/12

Dependencia


Secretaría de Desarrollo Rural

Área

Responsable


Dirección General de Infraestructura Rural

Cumplimiento de Metas

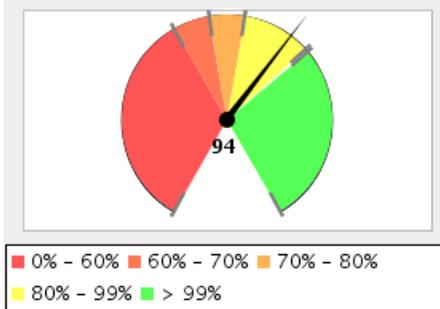

Avance Anual

Fecha	Meta	Avance
31-ene-12	3	2.25
28-feb-12	5	3.75
31-mar-12	8	5.75
30-abr-12	11	6.75
31-may-12	20	12
30-jun-12	32	24
31-jul-12	37	26.25
31-ago-12	41	30
30-sep-12	43	35.75
31-oct-12	46	38
30-nov-12	71	43.25
31-dic-12	100	94.25

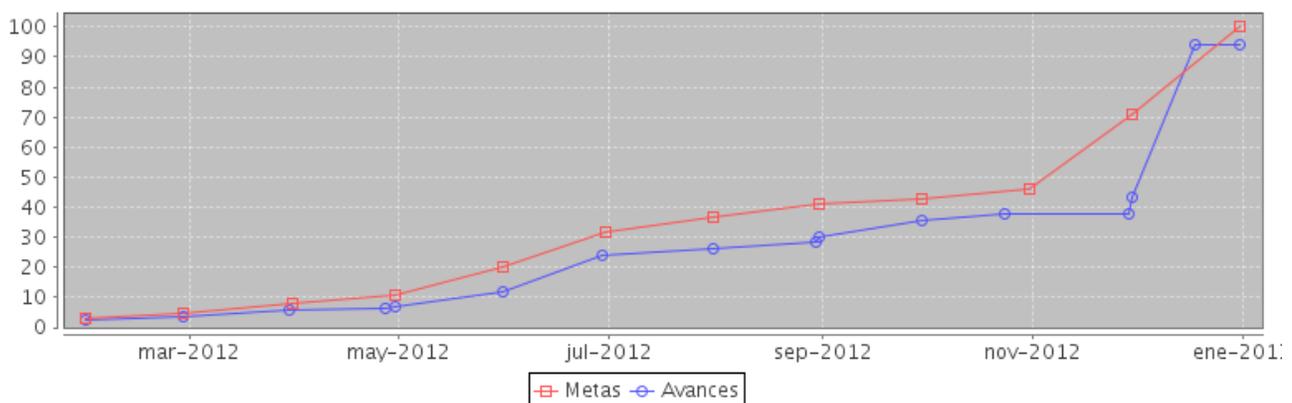

Componente	noviembre		diciembre	
	Meta	Avance	Meta	Avance
1.- Etapas de las presas de almacenamiento de agua construidas	3	0	7	7
2.- Etapas del sistemas de riego construidos	2	0	4	4
3.- Hectáreas trituradas de lirio acuático	203	130.5	221	138.5

Componente	noviembre		diciembre	
	Meta	Avance	Meta	Avance
4.- Metros cúbicos desazolados en los distintos cuerpos de agua	958600	1101453.58	970000	1104034


Componente 1: Etapas de las presas de almacenamiento de agua construidas

Nombre	Etapas de las presas de almacenamiento de agua construidas		
Fecha de	01/01/12	Fecha de Fin	31/12/12
Última Actualización	18/12/12		

Fecha	Meta	Avance
31-ene-12	0	0
28-feb-12	0	0
31-mar-12	0	0
30-abr-12	0	0
31-may-12	0	0
30-jun-12	0	0
31-jul-12	0	0
31-ago-12	0	0
30-sep-12	0	0
31-oct-12	0	0
30-nov-12	3	0
31-dic-12	7	7

Indicador: Número de etapas de las presas construidas

Nombre	Número de etapas de las presas construidas		
Descripción	Construcción de cuatro etapas en las presas de almacenamiento con un avance en la participación Estatal en 2012 de; 58% Presa Aguamilpa 3ra. etapa, 15% presa el Ancón 1ra etapa, 65% presa el Naranja 4ta. etapa, 25% presa el salitrillo 3ra. etapa, 80% presa las Codornices 2da. Etapa, 60% presa los Panales 2da. Etapa y 50% presa Santa Rosa 1ra. etapa		
Valor Inicial	0	Valor Actual	7

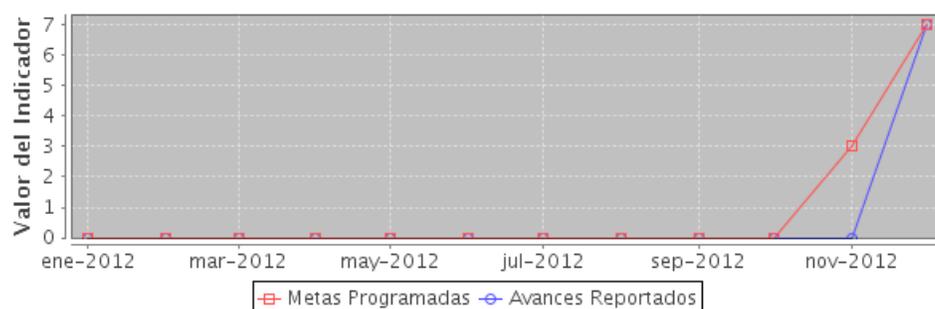


Componente 2: Etapas del sistemas de riego construidos

Nombre	Etapas del sistemas de riego construidos		
Fecha de	01/01/12	Fecha de Fin	31/12/12
Última Actualización	18/12/12		
Nota			

Fecha	Meta	Avance
31-ene-12	0	0
28-feb-12	0	0
31-mar-12	0	0
30-abr-12	0	0
31-may-12	0	0
30-jun-12	0	0
31-jul-12	0	0
31-ago-12	0	0
30-sep-12	0	0
31-oct-12	0	0
30-nov-12	2	0
31-dic-12	4	4

Indicador: Número de etapas de sistemas de riego construidos

Nombre	Número de etapas de sistemas de riego construidos		
Descripción	Construcción de etapas del sistema de riego, con un avance en la participación Estatal en 2012 de; 15% sistema de riego el Carrizo, 55% pozo higuera blanca 1era etapa, y 6% sistema de riego Vista Hermosa 1ra. etapa y 10% Planta de bombeo Aútlán (2da. Etapa)		
Valor Inicial	0	Valor Actual	4

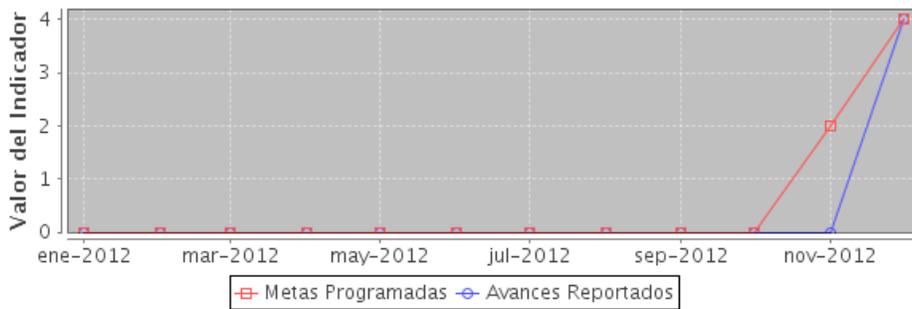


Componente 3: Hectáreas trituradas de lirio acuático

Nombre	Hectáreas trituradas de lirio acuático		
Fecha de	01/01/12	Fecha de Fin	31/12/12
Última Actualización	18/12/12		
Nota	En lo que va del año, se ha logrado triturar un total de 138.5 hectáreas de lirio en diferentes cauces de ríos. Para este mes de diciembre se tenía contemplado una meta de 221 hectáreas trituradas, debido a que el margen de los cauces reduce el acceso de la maquinaria a ciertas zonas de difícil acceso, solo se ha logrado cumplir el 63% de la meta programada.		

Fecha	Meta	Avance
31-ene-12	18	18
28-feb-12	37	18
31-mar-12	56	19.7
30-abr-12	75	22.5
31-may-12	93	25.9
30-jun-12	111	39.7
31-jul-12	129	42.5
31-ago-12	147	55.9
30-sep-12	165	81.84
31-oct-12	184	90.3
30-nov-12	203	130.5
31-dic-12	221	138.5

Indicador: Número de hectáreas trituradas

Nombre	Número de hectáreas trituradas		
Descripción	Este indicador muestra en número de hectáreas de lirio triturado trituradas en cauces y cuerpos de agua, permitiendo con ello mayor oxigenación y por lo tanto la proliferación de la vida acuática		
Valor Inicial	0	Valor Actual	138.5

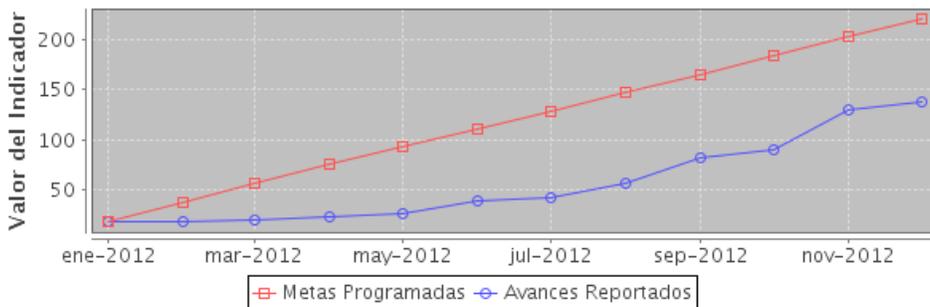

Componente 4: Metros cúbicos desazolvados en los distintos cuerpos de agua

Nombre	Metros cúbicos desazolvados en los distintos cuerpos de agua		
Fecha de	01/01/12	Fecha de Fin	31/12/12
Última Actualización	31/12/12		
Nota			

Fecha	Meta	Avance
31-ene-12	19531	8650
28-feb-12	39062	66218
31-mar-12	58593	133027
30-abr-12	78124	163683
31-may-12	345276	345276
30-jun-12	752511	752511
31-jul-12	852611	838736
31-ago-12	952736	922278.58
30-sep-12	955000	1032968
31-oct-12	958000	1075414
30-nov-12	958600	1101453.5
31-dic-12	970000	1104034

Indicador: Número de metros cúbicos desazolvados

Nombre	Número de metros cúbicos desazolvados		
Descripción	Desazolve de cuerpos de agua y cauces federales en lagunas, ríos, arroyos y presas con un total de 234,375 metros cúbicos desazolvados.		
Valor Inicial	0	Valor Actual	1104034

