


Creación de Centros de capacitación SUPERA y CANDI por la Familia para un mejor futuro

Eje	Desarrollo Social
Programa	Desarrollo Humano Sustentable
SubPrograma	Superación de la pobreza
Nombre	Creación de Centros de capacitación SUPERA y CANDI por la Familia para un mejor futuro

Cumplimiento de Metas

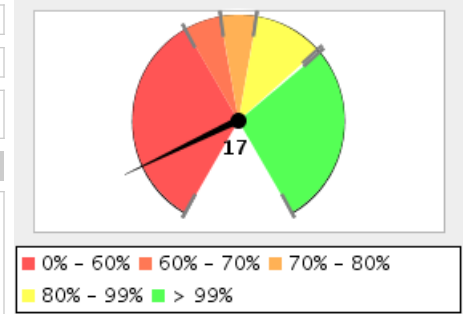

Descripción

CIEN CORAZONES: El proyecto es de continuidad la operación del Centro Cien Corazones se proyecta para el mes de Agosto con una capacidad para 100 niños, con un modelo de atención operado por la orden hospitalaria de San Juan de Dios, el funcionamiento del Centro será a través de la coordinación entre el gobierno del Estado y Asociaciones Civiles con lo cual se buscarán las vías para el cofinanciamiento de la operación del Centro y los proyectos complementarios. Dentro de la segunda etapa se pretende construir el Centro Educativo lúdico y laboral para los 100 niños de Cien corazones, el centro consiste en la Construcción de un área de unidad básica de rehabilitación, un área administrativa, talleres y salones, museo, ludoteca, auditorio, y área de juegos. **CENTROS SUPERA:** Este proyecto se inició en el 2009, son obras Municipales con cobertura regional, actualmente están por concluir la primera etapa de construcción de 3 Centros Supera en los Municipios de Huejuquilla el Alto, Cuautitlán de García Barragán y Atotonilco el alto; y en proceso de donación de terreno a DIF Jalisco se encuentran otros 3 en los Municipios de Tala, Talpa y San Juan de los Lagos. Con este proyecto se pretende llevar a cabo la conclusión de estos 6 centros de capacitación con espacios adecuados en infraestructura para impulsar la formación del capital social en el desarrollo familiar y comunitario. Las capacitaciones estarán dirigidas al fortalecimiento de la familia en la integración de todos sus miembros para fortalecer a los jóvenes, quienes serán los promotores a los procesos de desarrollo de sus localidades, reforzando su experiencia con temáticas sobre valores, la importancia del trabajo en familia y asesoramiento para el desarrollo de un proyecto de vida así como la enseñanza de conocimientos técnicos sobre la participación social y eco tecnologías.

Avance Anual

Fecha	Meta	Avance
31-ene-11	0	0
28-feb-11	0	0
31-mar-11	0	0
30-abr-11	0	0
31-may-11	0	0
30-jun-11	0	0
31-jul-11	8	0
31-ago-11	48	0
30-sep-11	65	8.25
31-oct-11	74	16.5
30-nov-11	82	16.5
31-dic-11	100	16.5

Objetivo Mejorar la calidad de vida de niños y jóvenes del Estado de Jalisco en condición de vulnerabilidad a través de la atención que se les brinde en los Centros Cien corazones y SUPERA construídos.


Porcentaje de Avance 16.50

Fecha de inicio 01/01/11 **Fecha de Término** 31/12/11

Dependencia Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)

Área Responsable Dirección de Previsión Social

Presupuesto anual estatal asignado \$ 51,500,000 **Presupuesto anual estatal ejercido** \$ 46,350,000

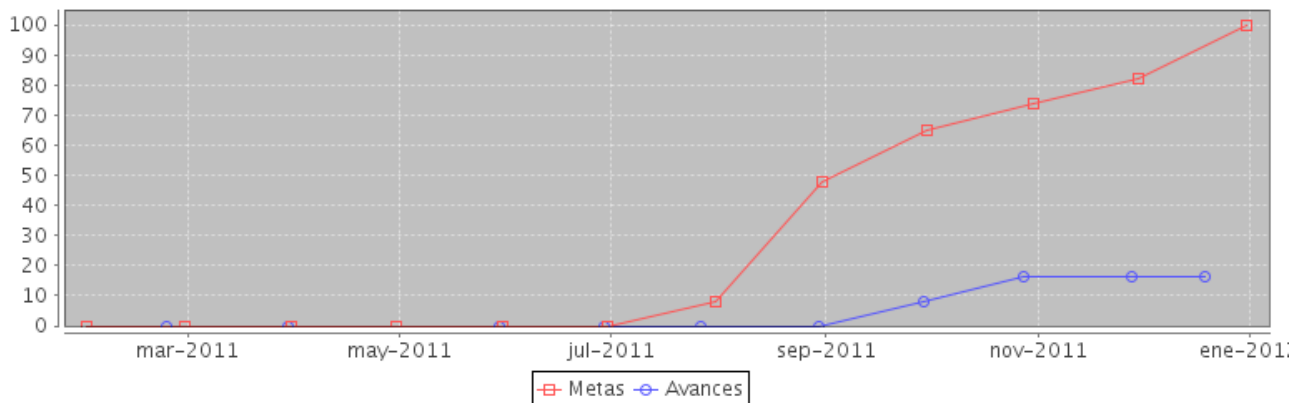

Componente	enero	
	Meta	Avance
1.- Centro Cien Corazones construido y operando	0	0
2.- Centros Supera construidos	0	0
3.- Centros Supera en construcción (1ra Etapa)	0	0
4.- Niños con discapacidad intelectual atendidos en el Centro Cien Corazones	0	0


Componente 1: Centro Cien Corazones construido y operando

Nombre	Centro Cien Corazones construido y operando		
Fecha de	01/01/11	Fecha de Fin	31/12/11
Última Actualización	19/12/11		

Fecha	Meta	Avance
31-ene-11	0	0
28-feb-11	0	0
31-mar-11	0	0
30-abr-11	0	0
31-may-11	0	0
30-jun-11	0	0
31-jul-11	0	0
31-ago-11	1	0
30-sep-11	1	0
31-oct-11	1	0
30-nov-11	1	0
31-dic-11	1	0

Indicador: Centro Construido y operando

Nombre	Centro Construido y operando		
Descripción	En este componente se realizará la conclusión de la Contrucción del Centro Cien corazones iniciando con la Cimentación, Obra negra, Electrificación, Acabados, y Equipamiento. Una vez construido, operará esperando beneficiar a 100 niños con discapacidad intelectual.		
Valor Inicial	0	Valor Actual	0

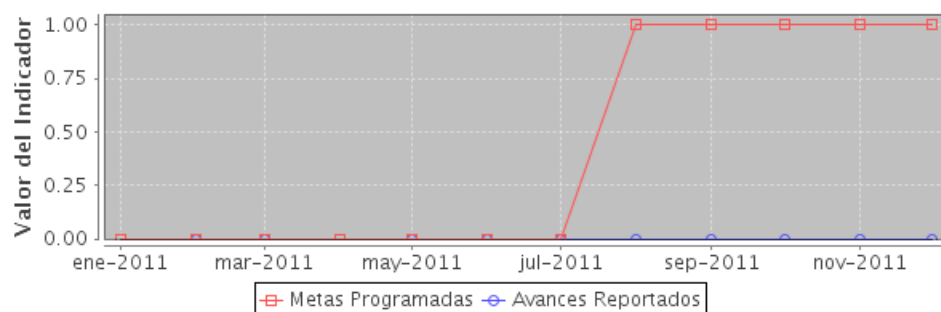


Componente 2: Centros Supera construidos

Nombre	Centros Supera construidos		
Fecha de	01/01/11	Fecha de Fin	31/12/11
Última Actualización	19/12/11		

Fecha	Meta	Avance
31-ene-11	0	0
28-feb-11	0	0
31-mar-11	0	0
30-abr-11	0	0
31-may-11	0	0
30-jun-11	0	0
31-jul-11	1	0
31-ago-11	1	0
30-sep-11	2	1
31-oct-11	2	1
30-nov-11	3	1
31-dic-11	3	1

Indicador: Número de Centros Supera construidos

Nombre	Número de Centros Supera construidos		
Descripción	Con este componente se realizará la conclusión de la construcción de 3 Centros Supera de los Municipios de Huejuquilla el Alto, Cuautitlán de García Barragán y Atotonilco el alto, con las siguientes etapas: 1ra. etapa de construcción(Dormitorios para hombres y mujeres) 2da. Etapa de construcción (Andadores y vialidades interiores, aula de capacitación, cocina-comedor, y talleres) 3ra. Etapa de construcción (Bardeo perimetral, modulo de vigilancia, bodega-baños, aula abierta, canchas de usos múltiples, alimentadores e instalaciones eléctricas, telefonía, y datos, instalaciones hidrosanitarias y red general) Una vez construidos, operarán esperando beneficiar a 2,700 adolescentes.		
Valor Inicial	0	Valor Actual	1

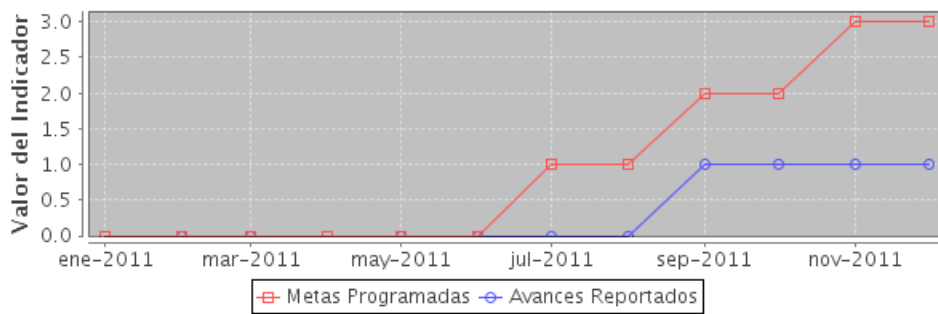


Componente 3: Centros Supera en construcción (1ra Etapa)

Nombre	Centros Supera en construcción (1ra Etapa)		
Fecha de	01/01/11	Fecha de Fin	31/12/11
Última Actualización	19/12/11		

Fecha	Meta	Avance
31-ene-11	0	0
28-feb-11	0	0
31-mar-11	0	0
30-abr-11	0	0
31-may-11	0	0
30-jun-11	0	0
31-jul-11	0	0
31-ago-11	0	0
30-sep-11	1	0
31-oct-11	2	1
30-nov-11	2	1
31-dic-11	3	1

Indicador: Número de Centros Supera en construcción

Nombre	Número de Centros Supera en construcción		
Descripción	En este componente son Centros Supera de los Municipios de Tala, Talpa y San Juan de los Lagos, que inician su construcción con la Donación de terrenos, Licitación de las Obras, Construcción de Dormitorios para hombres y mujeres, andadores y vialidades interiores, aula de capacitación, cocina-comedor, y talleres, concluyendolos en Obra Negra.		
Valor Inicial	0	Valor Actual	1

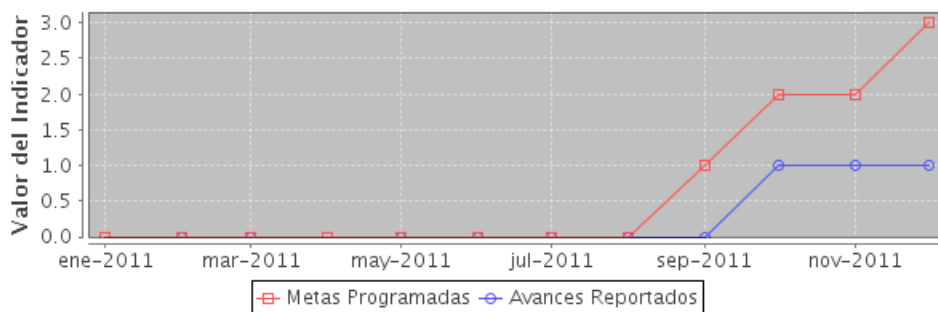

Componente 4: Niños con discapacidad intelectual atendidos en el Centro Cien Corazones

Nombre	Niños con discapacidad intelectual atendidos en el Centro Cien Corazones		
Fecha de	01/01/11	Fecha de Fin	31/12/11
Última Actualización	19/12/11		

Fecha	Meta	Avance
31-ene-11	0	0
28-feb-11	0	0
31-mar-11	0	0
30-abr-11	0	0
31-may-11	0	0
30-jun-11	0	0
31-jul-11	0	0
31-ago-11	30	0
30-sep-11	30	0
31-oct-11	30	0
30-nov-11	30	0
31-dic-11	50	0

Indicador: Número de niños con discapacidad intelectual atendidos en el Centro Cien Corazones

Nombre	Número de niños con discapacidad intelectual atendidos en el Centro Cien Corazones		
Descripción	Atención integral a los niños albergados en el Centro Cien corazones de manera permanente en los aspectos de salud, alimentación y educación entre otros. (Se iniciará con 30 niños concluyendo el año con 50, esperando que para el mes de Abril del próximo año este a su capacidad de 100 niños)		

Valor Inicial	0	Valor Actual	0
----------------------	---	---------------------	---

