

ANEXO 2  
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS  
www.cejalisco.gob.mx

FECHA DE IMPRESIÓN: 13/05/2019  
FECHA DE EMISIÓN: 27/05/2019  
N.º DE OFICIO: DSM / C-0255 / 2019 F  
RESUMEN: Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: May 27 2019 1:05PM

SUBDIRECTOR/DIRECTOR: EDGAR SAID LOPEZ SALDOVAR  
COMISIONADO: SAUL OMAR AGUILAR LOPEZ  
COMPANARCA:  
EMPUESTO: Subdirector de Servicios a Municipios  
OPERADOR DE GRUA  
RESUMEN: Terminada

EMISOR DOCUMENTO: GEMA ELIZABETH INGLEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO SITCEA  
STATUS: Oficio Comprobado y Autorización por el Emisor

FECHA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES MONITOREADAS	GENERA	MONEDA	MONTO	IMPUESTO	IMPORTE TOTAL
13/05/2019	MUNICIPIO: Sin Destinyuno. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: TRASLADO Y REHABILITACION DEL POZO PROFUNDO 9 JAJUJA CONTROL 39782	COMIDA	MONEDA	Tonala \$ 0.00	0.00	Tonala \$ (0.00) - **IVA \$(0.00)
14/05/2019	MUNICIPIO: Tonalá \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: TRASLADO Y REHABILITACION DEL POZO PROFUNDO 9 JAJUJA CONTROL 39782	COMIDA	MONEDA	Tonala \$ 0.00	0.00	Tonala \$ (0.00) - **IVA \$(0.00)
15/05/2019	MUNICIPIO: Tonalá \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: TRASLADO Y REHABILITACION DEL POZO PROFUNDO 9 JAJUJA CONTROL 39782	COMIDA	MONEDA	Tonala \$ 0.00	0.00	Tonala \$ (0.00) - **IVA \$(0.00)
16/05/2019	MUNICIPIO: Tonalá \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: TRASLADO Y REHABILITACION DEL POZO PROFUNDO 9 JAJUJA CONTROL 39782	COMIDA	MONEDA	Tonala \$ 0.00	0.00	Tonala \$ (0.00) - **IVA \$(0.00)
17/05/2019	MUNICIPIO: Tonalá \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: TRASLADO Y REHABILITACION DEL POZO PROFUNDO 9 JAJUJA CONTROL 39782	COMIDA	MONEDA	Tonala \$ 0.00	0.00	Tonala \$ (0.00) - **IVA \$(0.00)

(\*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISION	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROBADO	IVA	SALDO	VERIFICADO POR	JN 75242	*CON RECARGA
FECHA SALIDA: 13/05/2019	VIÁTICOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	VERIFICADO POR	KODIAK CHASS CABINA / 6 Ch. / 19.5 Km.	
FECHA SALIDA: 14/00 Hs.	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA MODELO	Chevrolet / 2007	
FECHA DE REGRESO: 17/05/2019	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	STACION FINAL	69,614.00 Km. / 69,706.00 Km.	
FECHA DE REGRESO: 21:00 Hs.	TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	EN RESERVA	92.00 Km.	
FECHA DE REGRESO: Servicio con cob	PROGRAMA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMIENZO DE COMISION		
FECHA DE REGRESO: 7:392.00 Hrs.	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEP/AF 2019	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	0 - 0 + 0 = 0		
MUNICIPIOS ASESORADO		SALDO EN VALORES RECORRIDOS		0.00		0.00 - 0.00		
		SALDO EN VALORES MANIOBRAS		0.00		0.00		
		VALORES RECORRIDOS		0.00				

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 0.00 ( CERO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARE EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DIAS HABILES AL TÉRMINO DE LA COMISION.


EFFECTIVO A FAVOR DE: CEA

CARGO CONTABLE: \$ 0.00  
MENOS ANTICIPO: \$ 0.00  
SALDO: \$ 0.00

COMISIONADO: SAUL OMAR AGUILAR LOPEZ  
OPERADOR DE GRUA  
Nota: Sólo se validan los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJERO

*Saul Omar Aguilar Lopez*

AUTORIZA COMPROBACION COMISION DIRECTOR



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C

SAUL OMAR AGUILAR LOPEZ N° OFICIO: DSM / C-0255 / 2019

DEL DÍA 13/05/2019 AL DÍA 17/05/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN

13 MAYO 2019 TRASLADO AL POZO 9 DE DIGPRES PARA SU REHABILITACION.

14 MAYO 2019 SE RETIRARON 19 TRAMOS DE 6"X6.10 DANDO UN TOTAL DE 115 METROS CON UNA BOMBA MARCA MEDINA DE 100 HP A 440 VOLTS.

15 MAYO 2019 SE TOMO VIDEO DETECTANDO 265 METROS DE PROFUNDIDAD Y SE COMENZO A FABRICAR CEPILLO PARA LA REHABILITACIÓN, HACIENDO LA MANIOBRA EL RESTO DEL DIA CON ADEME DE 10".

16 MAYO 2019 SE CONTINUO CON EL CEPILLADO Y EN LA TARDE SE INICIO CON EL PISTONEO

17 MAYO 2019 SE CUCHAREO QUEDANDO UN FONDO TOTAL DE 268 METROS, NO SE INSTALO LA BOMBA DEBIDO A QUE SE LA LLEVARON A REPARAR. REGRESO A GUADALAJARA DEJANDO EL CAMION GRUA EN EL ALMACEN DE AVILA CAMACHO


*S. O. Aguilar Lopez*

COMENTARIOS

SE CUMPLIO CON EL SERVICIO

*ES*

*[Handwritten signature]*

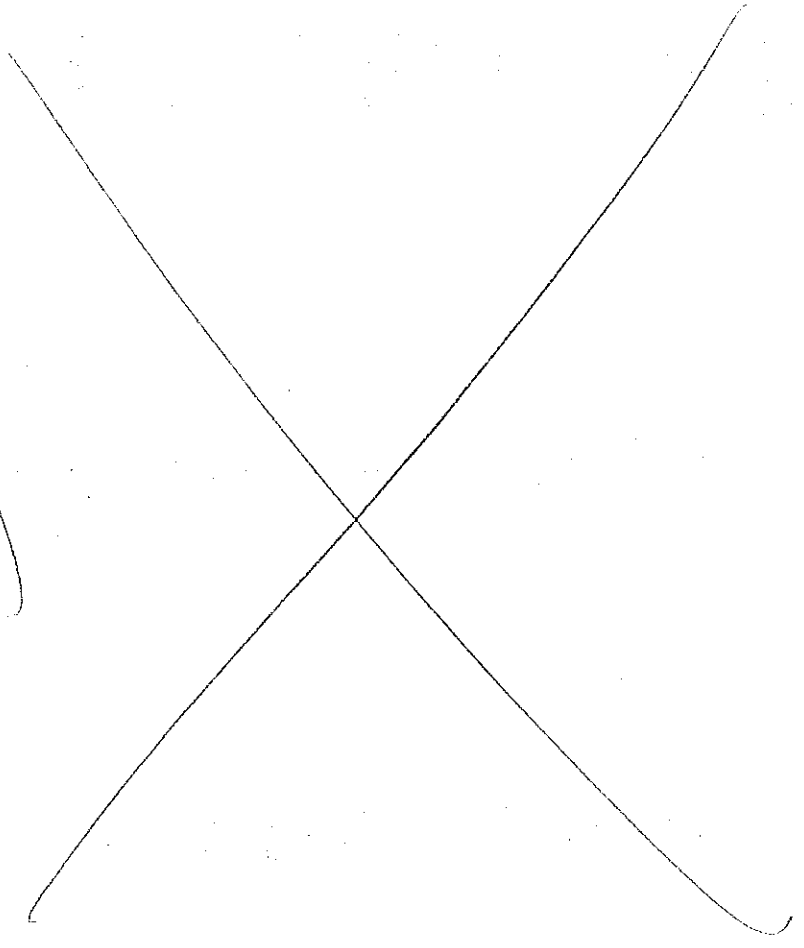

# POZO # 9 HISTORIAL

PROFUNDIDAD TOTAL: 200 M  
TOTAL DE COLUMNA:  
DIAMETRO DE ADEME:  
DIAMETRO D COLUMNA:  
FECHA DE CONSTRUCCION:  
ELECTRONIVELES: 100 M  
INICIO DE TUBERIA RANURADA:  
TIPO DE RANURACION:  
COLAPSOS:  
NIVEL ESTATICO: 74 M  
NIVEL DINAMICO: 91.4 M (MAYO 2002)  
PRESION: 4 KG  
GASTO:  
MARCA DE LA BOMBA:  
H.P. ( 100 H.P. SEGÚN AMPERAJE )  
VOLTAJE: 440 V  
AMPERAJE: 110 AMP.  
TAZONES:  
  
INTERRUPTOR POZO 9  
SIEMENS 250 AMP.  
MODELO FXD 63B 250  
SERIES B  
AJUSTES 2 A TIPO FXD6-A TRIFÁSICO

29 DE JULIO DEL 2002

HORA 12:10

SE REVISO Y LIMPIO, EL GABINETE ELECTRICO DEL MISMO,  
SE TOMARON LECTURAS DE VOLTAJE, AMPERAJE, Y NIVELES

VOLTAJE	450 POR FASE	AMPERAJE	100 POR FASE
N.E.	75	N.D.	91
		PRECION	3 ¼ KGS.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C

SAUL OMAR AGUILAR LOPEZ N° OFICIO: DSM / C-0255 / 2019

DEL DÍA 13/05/2019 AL DÍA 17/05/2019

SEÑOR(S) DEL(A)S LOCALIDAD(ES)

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA

PROGRAMA DE REMEDIACIÓN SOCIAL  
DEL ESTADO DE JALISCO

14 MAYO 2019  
**RECIBIDO**  
SUB DIRECCIÓN OPERATIVA

*Chimel*
