

Fecha Pago Anticipo	30/01/2017
Fecha Elab. Compro.	07/02/2017
N° de Oficio	GO / C-0033 / 2017 F
RESUMEN COM.	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 7 2017 12:36PM

GERENTE O DIRECTOR:	VICENTE QUINTERO ARAIZA	PUESTO:	GERENTE DE OBRAS
COMISIONADO:	HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES	PUESTO:	RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES - RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA	STATUS:	Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

### DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
30/01/2017	Sin Desayuno \$ 0.00 GD: (1) 0.00	Poncitlán \$ 170.00	Poncitlán \$ 100.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
ACTIVIDAD: REVISIÓN DE VICIOS OCULTOS					
31/01/2017	Zapotlanejo \$ 0.00 GD: (1) 0.00	Zapotlanejo \$ 0.00	Zapotlanejo \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
ACTIVIDAD: ENTREGA DE RECEPCIÓN ACTAS FINIQUITO MUNICIPIO					
01/02/2017	Mexhtlacacán \$ 75.00 GD: (1) 0.00	Mexhtlacacán \$ 128.00	Mexhtlacacán \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
ACTIVIDAD: REVISIÓN DE DETALLES DE OBRAS CON LA EMPRESA FRECOM					
02/02/2017	Cañadas de Obregón \$ 75.00 GD: (1) 0.00	Cañadas de Obregón \$ 128.00	Cañadas de Obregón \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
ACTIVIDAD: REVISIÓN DE DETALLES DE OBRAS					
03/02/2017	Lagos de Moreno \$ 100.00 GD: (1) 0.00	Lagos de Moreno \$ 170.00	Lagos de Moreno \$ 100.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
ACTIVIDAD: VERIFICACIÓN DE VICIOS OCULTOS					

(\*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*) IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN	CONCEPTO	ANTIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	JN 61349	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	30/01/2017	VIÁTICOS \$:	1,098.00	1,192.00	0.00	\$ -94.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007
DIA(S) COMISIÓN:	5	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	276,690.00 Km. / 278,161.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	03/02/2017	PEAJE \$:	0.00	543.00	74.90	\$ -543.00	KM. RECORRIDO:	1,471.00 Km.
HORA DE REGRESO:	22:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:	Obras	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017			ANTIPO - EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO -	2,500.00	
JUST. VALES EXCE:						SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00	
						VALES MANIOBRAS ANTIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
						SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
						\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **1,098.00** ( MIL NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN.)


COMO ANTIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARE EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR	CARGO CONTABLE	\$ 1,735.00
EMPLEADO	MENOS ANTIPO	\$ 1,098.00
	SALDO	\$ -637.00

COMISIONADO  
 HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES  
 RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
 DIRECTOR O GERENTE

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES N° OFICIO: GO / C-0033 / 2017

DEL DÍA: 30/01/2017 AL DÍA: 03/02/2017

## RESULTADO DE LA COMISIÓN:

30 DE ENERO DEL 2017.

ACTIVIDADES: SE REALIZA RECORRIDO CON PERSONAL DEL MUNICIPIO DE PONCITLAN PARA VERIFICAR EL REPORTE DE DOS FUGAS EN LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE LA OBRA: Línea de conducción al tanque existente de El Chalpicote, red de distribución de agua potable en el Chalpicote, y La Zapotera, incluye 125 y 111 tomas domiciliarias, respectivamente (segunda etapa), en las localidades de Chalpicote, La Zapotera y Agua Caliente, municipio de Ponciltan, Jalisco" Contrato: CEA-ZR-CI-028/2015, DE LA CUAL SE ANEXA COPIA DE LA MINUTA.

31 DE ENERO DEL 2017.

ACTIVIDADES: SE HACE ENTREGA DE LAS ACTAS ADMINISTRATIVAS DE ENTREGA RECEPCIÓN CON EL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO. DEL CONTRATO CEA-ZR-CI-068-2017, PARA LO CUAL SE RECABAN LAS FIRMAS DE QUIEN FUNGE EN LAS MISMAS.

01 DE FEBRERO DEL 2017.

ACTIVIDADES: EN RECORRIDO DE OBRA PARA LA ELABORACION DE LOS TRABAJOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LA LOCALIDAD DE LOS CHARCOS, MUNICIPIO DE MEXTICACAN, JALISCO SE OBSERVA QUE YA SE INICIARON CON LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN.

02 DE FEBRERO DEL 2017.

ACTIVIDADES: SE REALIZO EL RECORRIDO PARA VERIFICAR LOS DETALLES DE VICIOS OCULTOS SE HAYAN REALIZADO CONFORME A LA ULTIMA VISITA, POR LO QUE SE INSTRUYO AL CONTRATISTA REALIZAR LA BARRIDA DE LA OBRA PARA LA ENTREGA DE LA MISMA.

03 DE FEBRERO 2017.









ACTIVIDADES: SE VERIFICA EL AVANCE DEL CONTRATO, CEA-RE-CI-091-2016, DE LA OBRA CONCLUSION DE LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EL BAJIO MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO. DONDE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LAS PRIVADAS VAN CON UN AVANCE DE 150 ML, ENTRE LAS DOS PRIVADAS, Y SE LE SOLICITA EL PROYECTO TOPOGRAFICO LEVANTADO POR LA EMPRESA PARA SU APROBACION POR ESTA DEPENDENCIA.

## COMENTARIOS:

SE ANEXAN MINUTAS Y ACTAS RESPECTIVAS.

# COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:  
 HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES N° OFICIO: GO / C-0033 / 2017  
 DEL DÍA: 30/01/2017 AL DÍA: 03/02/2017

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO DE PONCITLÁN, JAL.</p>	<p>J. Jesús Méndez Castellanos </p>
 <p>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO</p>	<p>      ING. J. CRUZ MÉNDEZ      SUPERVISOR DE OBRAS</p>
 <p>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE MEXICACÁN, JAL. 2015-2018</p>	<p>Leonardo Portillo Duran</p>
 <p>Registro Civil N°3 Sta. Rosalía de la Cruz, Jalisco. 2015-2018</p>	<p>Hugo Pérez Gómez</p>
 <p>DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y ALGENTALLADO (SAPALACOS) MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO GOBIERNO MUNICIPAL Administración 2016-2018</p> <p>03 FEB. 2017</p> <p><b>RECIBIDO</b></p> <p>H. Ayuntamiento de Lagos de Moreno, Jal. 2016 - 2018</p>	

PLAZA DE COBRO JALOSTOTITLAN  
 TRAMO: ARANDAS - EL DESPERDICIO  
 FOLIO = 7-0002228267 CARRIL:6 A

01706100-02536784-B1F343DF-2A920C90

02/02/2017 EFECTIVO  
 12:11:48  
 IMPORTE: IVA: TOTAL:  
 \$ 80.17 12.83 93.00

01706100-02536784-B1F343DF-2A920C90



Para que sea válido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando éste ocurra, permanecer en el lugar del mismo y presentar el boleto correspondiente al tramo. Condiciones generales en: www.redviacorta.mx/servicio/seguro

PLAZA DE COBRO JALOSTOTITLAN  
 TRAMO: EL DESPERDICIO - ARANDAS  
 FOLIO = 1-0001899269 CARRIL:1 B

01701200-02581833-9330B97A-3B256269

02/02/2017 EFECTIVO  
 15:53:48  
 IMPORTE: IVA: TOTAL:  
 \$ 80.17 12.83 93.00

01701200-02581833-9330B97A-3B256269



Para que sea válido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando éste ocurra, permanecer en el lugar del mismo y presentar el boleto correspondiente al tramo. Condiciones generales en: www.redviacorta.mx/servicio/seguro



PLAZA DE COBRO: LA JOYA  
 TRAMO: GUADALAJARA - ZAPOTLANEJO  
 FOLIO = 23-0001180379 CARRIL:7 B

01157200-01265227-E027B967-B44B7895

03/02/2017 EFECTIVO  
 08:34:16  
 IMPORTE: IVA: TOTAL:  
 \$ 49.14 7.86 57.00

01157200-01265227-E027B967-B44B7895



Para que sea válido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando éste ocurra, permanecer en el lugar del mismo y presentar el boleto correspondiente al tramo. Condiciones generales en: www.redviacorta.mx/servicio/seguro

PLAZA DE COBRO TEPATITLAN  
 TRAMO: ZAPOTLANEJO - ENT. ARANDAS  
 FOLIO = 5-0003868234 CARRIL:5 A

01605100-04173062-4507C367-4D23138D

03/02/2017 EFECTIVO  
 09:00:12  
 IMPORTE: IVA: TOTAL:  
 \$ 113.79 18.21 132.00

01605100-04173062-4507C367-4D23138D



Para que sea válido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando éste ocurra, permanecer en el lugar del mismo y presentar el boleto correspondiente al tramo. Condiciones generales en: www.redviacorta.mx/servicio/seguro

PLAZA DE COBRO JALOSTOTITLAN  
 TRAMO: ARANDAS - EL DESPERDICIO  
 FOLIO = 7-0002228872 CARRIL:6 A

01706100-02537942-F1268F6D-F94FB33D

03/02/2017 EFECTIVO  
 09:31:00  
 IMPORTE: IVA: TOTAL:  
 \$ 134.48 21.52 156.00

01706100-02537942-F1268F6D-F94FB33D



Para que sea válido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando éste ocurra, permanecer en el lugar del mismo y presentar el boleto correspondiente al tramo. Condiciones generales en: www.redviacorta.mx/servicio/seguro

**TP** TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE JALISCO, S.A. DE C.V.  
 LOPEZ COTILLA 998-1 COL. AMERICANA  
 C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.  
 TEL. 38-26-66-90  
 R.F.C. TPJ-810124-213

LIBRAMIENTO VALLE DE GUADALUPE, JAL.

FOLIO	
Nº	686995
SUB-TOTAL	I.V.A.
\$ 10.35	\$ 1.65
TOTAL	
\$ 12.00	
AUTO	

CD

Atentamente.

*Hugo Ernesto Gonzalez Magallanes*  
 Ing. Hugo Ernesto Gonzalez Magallanes  
 Residente Supervisor de Obra.  
 Comisión Estatal del Agua de Jalisco.

Nº Oficio: G0/c-0033 / 2017  
 No. 712023 Miguel Gonzalez Martinez  
 DPTO. ORIZABA.

CHOR de Sotom JN61349

**SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V.** (NOTA DE VENTA)  
 Av. Washington No. 56 Tel/Fax: 3619-6805  
 C.P. 44440 Guadalajara, Jal.  
 R.F.C. SWA 060223 HEA  
 77311

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: <b>CDQJ-Jal 2-2-2012</b>	
NOMBRE: <b>CDQJ</b>	RFC:
DOMICILIO:	PLACS:
POBLACION:	CLAVE DEL PRODUCTO:
CARGO:	PRECIO UNITARIO:
CANTIDAD LITROS:	IMPORTE:
<b>870</b>	<b>162</b>
MAGNA SIN	32011
PREMIUM	32012
ACEITE DORADO	
ACEITE VERDE	
ACEITE TRANSMISIÓN	
ADITIVOS	
VARIOS	
CANTIDAD CON LETRA:	TOTAL <b>14,373</b>

**SAT** Servicio de Administración Tributaria  
 CLAVE DE REG. FED. DE CONTRIBUYENTE: **SWA060223HEA**  
 NOMBRE, DENOMINACIÓN Y RAZÓN SOCIAL: **SERVICIO WASHINGTON SA DE CV**  
 FOLIO: **F 6358686**  
 JAL-23/02/2006-E 3/11/15/5/NC/5w

IMPRESO POR: ROMANE, S.A. DE C.V.  
 ARASOJO NÚM. 6 COL. AGUA BLANCA, C.P. 45235  
 ZARAGOZA, JAL. TELS.: 3612-54-47 • 3614-71-43  
 WWW.FACTURADIGITALMEXICO.COM  
 IMPRESO EN OCTUBRE DEL 2012  
 EFECTIVO EN SU ENTIDAD DE ORIGEN  
 PRESENTAR EN SU LOCAL DE DESTINO  
 COMPROMISANTE NO FISCAL  
 FOLIO DEL 46001 AL 82000

Debe y pagará a la orden de **SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V.** en esta ciudad o en cualquier otra que se me requiera de pago el día de **del** la cantidad de \$ **14,373.00** (M.N.) Valor de la mercancía que he recibido a mi entera satisfacción. Este pagará es mercancía y esta regla por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su Art. 173 parte final y artículos correlativos por no ser pagará identificado. Quedando expreso que de no ser liquidado a su vencimiento causará intersementario del **OS5** \* mensual

*Miguel Gonzalez Martinez*

*[Handwritten signature]*

SERVICIO WASHINGTON S.A. DE C.V.  
AV WASHINGTON #56  
FERROCARRIL  
GUADALAJARA, JALISCO

SWA-060223-HEA  
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000105452

EL

E.S. 11502  
TRENOGAS S.A. DE C.V.  
CIRCUNVALACION AGUSTIN YANEZ 1306  
COL. MODERNA  
GUADALAJARA, JAL. C.P. 44190  
3810-0752

TRE100421EC6  
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000115622

Regimen Fiscal  
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Lugar de Expedicion

JALISCO 1'488, 492.63

Lugar de Expedicion  
JALISCO

===== COPIA =====  
NOTA #1351137

2'620, 426.20

===== COPIA =====  
TICKET #314630

FOLIO : 0005039390  
FECHA : 01/02/2017, 12:03 (50393900)  
POSICION: 11  
TERMINAL: 6

1'153, 943.3

FOLIO : 0004219268  
FECHA : 30/01/2017, 13:51 (42192680)  
POSICION: 6  
TERMINAL: 3

>>>> CREDITO <<<<<<  
> PAGO CON TARJETA <  
CLIENTE 041900004  
Comision estatal del agua de Jalisco  
Francia . 1726  
Moderna  
44190 - Guadalajara, Jalisco.  
CEA070225JK4

1'023, 771.0

>>>> CREDITO <<<<<<  
> PAGO CON TARJETA <  
CLIENTE 041900004  
Comision estatal del agua de Jalisco  
Francia . 1726  
Moderna  
44190 - Guadalajara, Jalisco.  
CEA070225JK4  
>>>>>>>><<<<<<<<<<

PRODUCTO	CANTIDAD U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	57.025 LTS	16.52	942.10

PRODUCTO	CANTIDAD U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	88.767 LTS	16.52	1466.43

SUBTOTAL: 815.14  
IVA: 126.96  
TOTAL: 942.10

SUBTOTAL: 1268.82  
IVA: 197.61  
TOTAL: 1466.43

(novecientos cuarenta y dos pesos 10/100 M.  
.N.)

(un mil cuatrocientos sesenta y seis pesos  
43/100 M.N.)

TARJETA : 19000359  
RUTA :  
NRO.ECO.:  
NRO.PAT.: \*  
VEHICULO: JN 61349 (Gerencia de Obra)  
FORDF-150  
ODOMETRO: 277040  
RENDIM. : 6.14 Kms/Lts

TARJETA : 19000359  
RUTA :  
NRO.ECO.:  
NRO.PAT.: \*  
VEHICULO: JN 61349 (Gerencia de Obra)  
FORDF-150  
ODOMETRO: 276690  
RENDIM. : 9.26 Kms/Lts

----- ( F I R M A ) -----

----- ( F I R M A ) -----

Magallanes  
ra.  
de Jalisco.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA**  
**DIRECCIÓN DE APOYO A MUNICIPIOS**



**ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA – RECEPCIÓN**  
**CON EL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO.**  
**CONTRATO CEA-ZR-CI-068-2016**

**ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR LA ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION DE COLECTOR LA CUCHARA, EN LA LOCALIDAD DE PUEBLOS DE LA BARRANCA (EL MAESTRANZO), MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO.", ENTRE EL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO**

**1.- LUGAR, HORA Y FECHA.-** EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO, JALISCO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL 30 DE ENERO DE 2017, SE REUNEN POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO EL L.A.P. HECTOR ALVAREZ CONTRERAS, LIC. JAIME SALVADOR LUPERCIO PEREZ, ING. S. JOSE GUILLERMO RAMIREZ MATUS, PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO MUNICIPAL, Y DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS RESPECTIVAMENTE; Y POR PARTE DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, EL ING. VICENTE QUINTERO ARAIZA, SU CARÁCTER DE GERENTE DE OBRAS; EL ARQ, LUIS FERNANDO HORNER VALENCIA, EN SU CARÁCTER DE JEFE DE FORMULACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS, Y EL ING, HUGO E. GONZALEZ MAGALLANES EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

**2.- DILIGENCIA.-** SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA EN DONDE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO ENTREGA AL H. AYUNTAMIENTO, LOS TRABAJOS DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION DE COLECTOR LA CUCHARA, EN LA LOCALIDAD DE PUEBLOS DE LA BARRANCA (EL MAESTRANZO), MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO.",

**3.- ANTECEDENTES.-** LOS TRABAJOS SE REALIZARON AL AMPARO DEL CONTRATO NÚMERO CEA-ZR-CI-068-2016, CON UN IMPORTE CONTRACTUAL DE \$ 172,659.45 (CIENTO SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS, 45/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO; RECURSOS PROVENIENTES DEL PROGRAMA PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES IV (PROSSAPYS IV). PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA) 2016, APARTADO RURAL.

LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS POR LA EMPRESA GA URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V., CON UN IMPORTE DE \$ 172,659.45 (CIENTO SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS, 45/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.

**4- OBSERVACIONES.-** SE PROCEDE A LA ENTREGA.

**5.-RESUMEN DEL EJERCICIO.-**

CAPITULO	MONTO	EJERCIDO	POR CANCELAR
CONTRATO	\$150,620.14	\$150,620.14	\$0.00
CONVENIO	\$22,039.31	\$22,039.31	\$0.00
<b>TOTAL.-</b>	<b>\$ 172,659.45</b>	<b>\$ 172,659.45</b>	<b>\$ 0.00</b>

NOTA: LOS IMPORTES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

**6.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS.-** "CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR LA CUCHARA, EN LA LOCALIDAD DE PUEBLOS DE LA BARRANCA (EL MAESTRANZO), MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO, RED ALCANTARILLADO SANITARIO, LIMPIA Y TRAZOEN EL AREA DE TRABAJO, CARGA A CAMIC, EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA P/ZANJAS EN SECO ZONA "B", EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS EN SECO DE 0.00 A 2.00 MTS, EXCAVACIÓN CON EQUIPO EN CUALQUIER



**ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA – RECEPCIÓN**  
**CON EL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO.**  
**CONTRATO CEA-ZR-CI-068-2016**

MATERIAL EXCEPTO ROCA EN SECO, EXCAVACIÓN CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA "B" DE 0.00 A 6.00 MTS DE PROFUNDIDAD, PLANTILLA APISONADA AL 85 % PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL DE BANCO, RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO LIGERO AL 90 %PROCTOR EN CAPAS DE 20 CMS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE P.V.C. ALACANTARILLADO SERIE 20 NOM-001-CNA; NMX 215 DE 200 MM DE DIAMETRO, POZOS DE VISITA COMUN HASTA 1.25, 1.50, 1.75 M, DE PROFUNDIDAD, A BASE DE LADRILLO ROJO RECOCIDO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BROCALES Y TAPA DE CONCRETO, MANGAS DE PVC PARA EMPOTRAMIENTO, ACARREO 1er KM MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, ACARREO EN KM SUBSECUENTES AL 1° , MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN."

7.- **CONDICIONES BAJO LAS QUE SE RECIBE Y ENTREGA LA OBRA.-** EN EL PRESENTE ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN, Y EN CUMPLIMIENTO A LA CLAUSULA QUINTA.- ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA, INCISO 5.1 Y EN PARTICULAR DEL INCISO 5.2 DEL CONVENIO DE PARTICIPACIÓN, LA "CEA JALISCO" HACE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA EN FUNCIONAMIENTO, Y EL "H.AYUNTAMIENTO" RECIBE LA OBRA EJECUTADA LA CUAL PASA A FORMAR PARTE DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO QUIEN SE HARÁ CARGO DE LA VIGILANCIA, ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.

8.- **GARANTIA DE LOS BIENES.-** PARA GARANTIZAR LAS OBRAS EJECUTADAS POR DEFECTOS O VICIOS OCULTOS DERIVADOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS MISMAS, Y EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EL CONTRATISTA EXHIBE GARANTÍA CONSISTENTE EN FIANZA NÚMERO 6-01605-4 DE AFIANZADORA INSURGENTES S.A. DE C.V. PARA GARANTIZAR POR 12 (DOCE) MESES A PARTIR DEL 28 DE OCTUBRE DE 2016, DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES CONTRACTUALES Y LA LEGISLACIÓN APLICABLE, MISMA QUE PODRA HACERSE EFECTIVA TOTAL O PARCIALMENTE DURANTE SU PERIODO DE VIGENCIA A SOLICITUD DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO; EN LOS CASOS DONDE SE DETERMINE SEAN RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA CONTRATISTA Y NO PROVENGAN DE UNA INADECUADA OPERACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES.

9.- **CIERRE DEL ACTA.-** NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL EVENTO SIENDO LAS 14.00 HORAS DEL DÍA 30 DE ENERO DE 2017.







COMISIÓN ESTATAL DEL  
**AGUA**  
**JALISCO**

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA**  
**DIRECCIÓN DE APOYO A MUNICIPIOS**

**ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA – RECEPCIÓN**  
**CON EL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO.**  
**CONTRATO CEA-ZR-CI-068-2016**

**10.- NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO.-**

**ENTREGA POR LA "CEA JALISCO"**


  
ING. HUGO E. GONZALEZ MAGALLANES  
RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA

ING. VICENTE QUINTERO ARAIZA  
GERENTE DE OBRAS CEA

  
ARQ. LUIS FERNANDO HORNER  
VALENCIA  
JEFE DE FORMULACIÓN DE ESTUDIOS  
Y PROYECTOS. CEA

**RECIBE POR EL H. AYUNTAMIENTO**

  
L.A.P. HECTOR ALVAREZ CONTRERAS  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
LIC. JAIME SALVADOR LUPERCIO PEREZ  
SINDICO MUNICIPAL

  
ING. S. JOSE GUILLERMO RAMIREZ MATUS  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR LA ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION DE COLECTOR LA CUCHARA, EN LA LOCALIDAD DE PUEBLOS DE LA BARRANCA (EL MAESTRANZO), MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO.", ENTRE EL H. AYUNTAMIENTO Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO.



COMISIÓN ESTATAL DEL  
**AGUA**  
JALISCO

MINUTA DE TRABAJO No 009

FECHA: 30 De Enero del 2017

OBRA: Línea de conducción al tanque existente de El Chalpicote, red de distribución de agua potable en el Chalpicote, y La Zapotera, incluye 125 y 111 tomas domiciliarias, respectivamente (segunda etapa), en las localidades de Chalpicote, La Zapotera y Agua Caliente, municipio de Poncitlan, Jalisco" Contrato: CEA-ZR-CI-028/2015

EN RECORRIDO POR LAS LOCALIDADES DEL CHALPICOTE Y LA ZAPOTERA, SE OBSERVA QUE LAS FUGAS EXISTENTES (2.00 FUGAS), ESTAN PROVOCADAS POR LOS TRABAJOS QUE SE VIENEN EJECUTANDO POR PARTE DE UNA EMPRESA CONTRATISTA QUE REALIZA UNA CONFORTACION DE LOS ACCESOS A LA LOCALIDADES ANTES MENCIONADAS, POR LO QUE SE LE INFORMO AL ING. JESUS MENDEZ CASTELLANOS, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y AGUA POTABLE DE PONCITLAN, QUE EN LO SUCESIVO CUALQUIER DAÑO A LA RED DE AGUA POTABLE ESTAS TENDRAN QUE SER REPARADAS POR QUIEN HAGA DAÑO A LAS MISMAS

MAS NO HABI LA EMPRESA INTEGRADORA DE SERVICIOS CONDE S.A DE C.V. TOMO CARTAS EN EL ASUNTO Y REPARO LAS FUGAS EXISTENTES, CON MATERIAL Y MANO DE OBRERA

*[Handwritten signature]*



JALISCO  
GOBIERNO DEL ESTADO





COMISIÓN ESTATAL DEL  
**AGUA**  
JALISCO

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

No Habiendo otro asunto que tratar firman los que aquí intervinieron.

Ing. J. Jesús Méndez Castellanos  
Director de Obras Públicas y Agua Potable  
Firma y Nombre



Ing. Hugo E. González Magallanes.  
Residente Supervisor de Obra.  
Comisión Estatal del Agua de Jalisco.  
Firma y Nombre.


Diego Esteban Hernández Valenciano  
Integradora de Servicios Conde S.A. de C.V.  
Diego Esteban





COMISIÓN ESTATAL DEL  
**AGUA**  
JALISCO


En la localidad de La Zapotera se observó el tubo descubierto de la red de distribución.

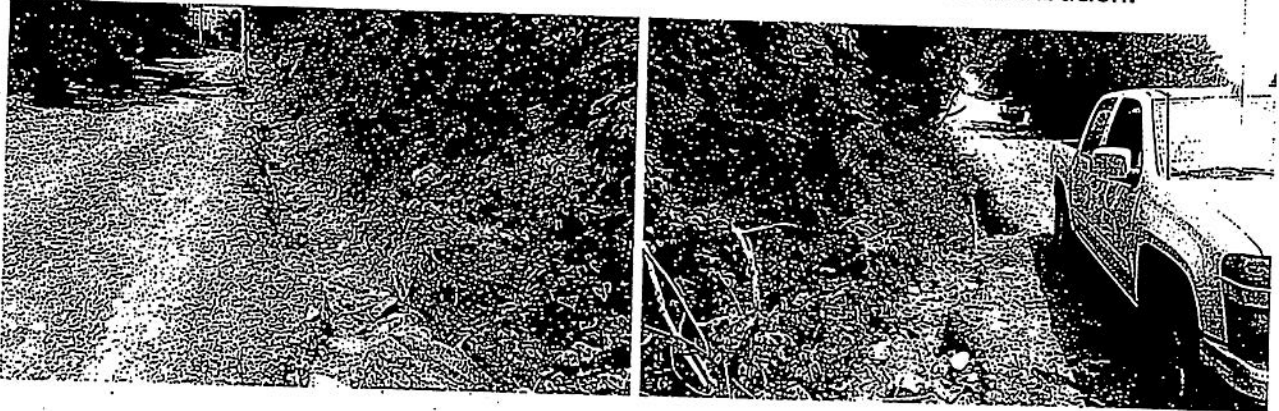

Lo que hago de su conocimiento a fin de que se giren las instrucciones conducentes, para atender dicha solicitud.

Agradeciendo como siempre su atención y respuesta, reciba un cordial saludo.

Atentamente

  
José Enrique Pelayo Ruiz  
Gerente de Gestión de Programas.

C.c. Ing. Hugo Ernesto Magallanes. Residente Supervisor de Obra. Para que notifique a la empresa constructora.  
Archivo.  
JEPR/eap

*Declaro*



**JALISCO**  
GOBIERNO DEL ESTADO



Av. Francia No. 1726, Col. Moderna C.P. 44190 Guadalajara, Jalisco, México  
Tels. (33) 3030-9200 y 01 800 087 9200  
ceajalisco.gob.mx




A/R

**NOTA INFORMATIVA**

Guadalajara, Jalisco, a 22 de noviembre de 2016


Para: Vicente Quintero Araiza; Gerente de Obras.



*Dimbica  
para  
Hugo  
Gonzalez*

En relación a la obra denominada **"Línea de conducción al tanque existente de El Chalpicote. Red de distribución de agua potable en El Chalpicote y La Zapotera, incluye 125 y 111 tomas domiciliarias respectivamente (segunda etapa)"**, que se ejecutó por medio del programa Prossapys 2015, a cargo de la empresa constructora Integradora de Servicios Conde S.A de C.V, bajo contrato CEA-ZR-CI-028/2015, al respecto informo a Usted.

En recorrido realizado los días 3 y 4 de noviembre del año en curso, en la localidad de El Chalpicote, se observó una fuga, fuera de la escuela primaria, frente a la vivienda del Sr. Felipe Baltazar.

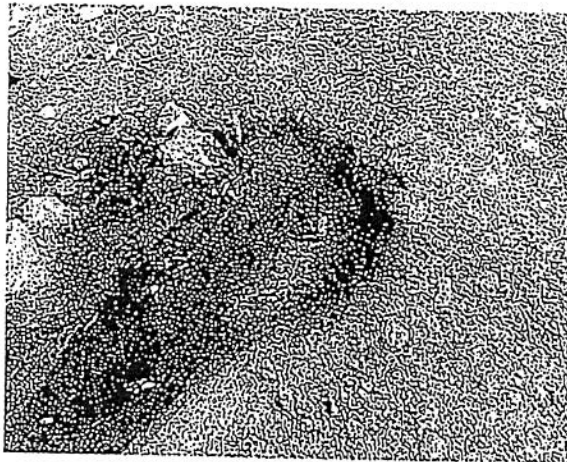

*Mebos*  
  
*[Signature]*  
DEPARTAMENTO DE  
OBRAS PÚBLICAS  
MUNICIPIO DE  
PONCITLÁN, JALISCO





COMISIÓN ESTATAL DEL

**AGUA  
JALISCO**

MINUTA DE TRABAJO No. 002

FECHA: 01 DE FEBRERO DEL 2017

• OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LA LOCALIDAD DE LOS CHAECOS, MUNICIPIO DE MEXTICACAN, JALISCO, EN DESEMPEÑO DE OBRA CON EL ING. EMETERIO FREGOSO SE OBSERVA A LA FECHA SE INICIARON LOS TRABAJOS EN ESTA LOCALIDAD DE LOS CHAECOS, MUNICIPIO DE MEXTICACAN, JALISCO,

SE HACE ENTREGA DE LA MISMA FORMA DEL DETALLE CONSTRUCTIVO, PARA REALIZAR LAS RETENIDAS DE LA TUBERÍA,

DE IGUAL FORMA SE LE INSTRUYE AL RESIDENTE DE OBRA QUE TODO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN TENDRA QUE SER RETIRADO FUERA DE LA OBRA Y NO ABANDONADO EN LOS LÍMITES EXISTENTES,

ASI MISMO SE LE SOLICITA AL RESIDENTE EL IR HACIENDO GENERADORES PARA SU PRESENTACION A ESTA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DE LA CEA.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE CIERRA LA PRESENTE MINUTA Y FIRMAN EN ELA LOS QUE ADELI APARECEN.



Leonardo Postillo Pusan

**JALISCO**  
GOBIERNO DEL ESTADO



Av. Francia No. 1726, Col. Moderna C.P. 44190 Guadalajara, Jalisco, México  
Tels. (33) 3030-9200 y 01 800 087 9200

ceajalisco.gob.mx



COMISIÓN ESTATAL DEL  
**AGUA**  
JALISCO

.....  
.....  
.....

*[Handwritten signature]*  
.....  
FIRMA Y NOMBRE  
COMISIÓN ESTATAL  
DEL AGUA DE JALISCO



*[Handwritten signature]*  
.....  
FIRMA Y NOMBRE

*[Handwritten signature]*  
.....  
FIRMA Y NOMBRE

*[Handwritten signature]*

.....  
FIRMA Y NOMBRE





COMISIÓN ESTATAL DEL  
**AGUA  
JALISCO**

MINUTA DE TRABAJO No. 004

FECHA: 03 de Febrero 2017.

OBRA: CONCLUSION DE LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EL BAJIO MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO."

Contrato: CEA-2016.


EN RECORRIDO POR LA OBRA SE VERIFICA LOS PROCESOS DE LOS TRABAJOS INDOLES A ESTE CONTRATO Y SE VISUALIZA LOS SIGUIENTES CONCEPTOS QUE NO CUMPLEN CON LA NORMATIVIDAD DE LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES Y POZOS DE VISITA.

LOS POZOS DEBEN SER REPELLADOS EN SU INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 E IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, ADEMAS DE LA INSTALACIÓN DE BROCALES Y TAPA DE CONCRETO, POR LO QUE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA CALLE 24 DE ENERO TENDRAN QUE SER CORREGIDOS LOS TRABAJOS REALIZADOS EN ESTE TRAMO.

LOS TRABAJOS EN LA LOCALIDAD DEL BAJIO, A LA FECHA YA SE INSTALO TUBERIA DE PVC EN LA CALLE DE NOMBRE MARTINEZ CON UNA LONGITUD DE 92.00 ML A EXCEPCION DE LOS POZOS DE VISITA N° 30'-27', Y DE LA PRIVADA S/NOMBRE YA SE INSTALO 60.00 ML DE TUBERIA.

SE HACE MENCION QUE NO SE ENCONTRARON PERSONAL LABOREANDO POR REGRESO A GUADALAJARA.

SE LE SOLICITA EL PROYECTO LEVANTADO DE LA LOCALIDAD



**JALISCO**  
GOBIERNO DEL ESTADO









COMISIÓN ESTATAL DEL  
**AGUA**  
**JALISCO**

El bajo para su aprobación por esta dependencia  
a la mayor brevedad.

Sin otro asunto que tratar se cierra la presente, y firman en ella los que aquí aparecen.

\_\_\_\_\_  
C. OFELIA REYES ESTRELLA.  
ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO.  
WENCES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

  
\_\_\_\_\_  
Ing. Hugb E. Gonzalez Magallanes.  
Residente Supervisor de Obras.  
Comisión Estatal del Agua de Jalisco.

  
\_\_\_\_\_  
C. DOMINGO MARTINEZ RAMOS  
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS  
HIDRAULICOS DE LAGOS DE MORENO.



**JALISCO**  
GOBIERNO DEL ESTADO 
