



Comisión Estatal del Agua Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

RECIBO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo	15/03/2019
Fecha Elib. Compiso	21/03/2019
N.º de Oficio:	DSM / C-0088 / 2019 F
RESUMEN COMI:	Del Seguimiento

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Mar 21 2019 9:36AM

DIRECTOR:	EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR	PUESTO:	Director de Área de Servicios a Municipios
COMISIONADO:	ROGELIO BARRAGAN CERVAANTES	PUESTO:	Jefe de Servicio y Apoyo Operativo
ACOMPANYA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO: ROGELIO BARRAGAN CERVAANTES - Jefe de Servicio y Apoyo Operativo

STATUS: Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
14/03/2019	MUNICIPIO: San Martín Hidalgo \$ 73.00 G.D.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00	San Martín Hidalgo \$ 128.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00	Sin Cena \$ 0.00	Sin Hospedaje \$*(0.00) - **IVA \$(0.00)
15/03/2019	MUNICIPIO: Ahualulco de Mercado \$ 92.00 G.D.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00	Ahualulco de Mercado \$ 166.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00	Sin Cena \$ 0.00	Sin Hospedaje \$*(0.00) - **IVA \$(0.00)

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**), IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, G.D. Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROBADO	IVA	SALDO	VEHÍCULO PLACAS	T/CON CARGA
FECHA SALIDA: 14/03/2019	VÍATICOS \$:	459.00	459.00	0.00	\$ 0.00	JT 93642	
HORA SALIDA: 8:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00		
DÍAS COMISIÓN: 2	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO: Ford / 2014	RANGER CREW CAB XLT / 4 Cil / 9.5 Km.
FECHA DE REGRESO: 15/03/2019	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL FINAL: 86,399.00 Km / 89,657.00 Km.	
HORA DE REGRESO: 18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO: 288.00 Km.	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN
TIPO DE COMISIÓN: Servicio sin code	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAR 2019				Anticipo - (anticipo) = (anticipo) = 0 + 0 - 0 = 0	
HORQUETOS COMPROBACIÓN: 0.00 Hrs.						Saldo para KW de Comprobado: 0.00	
JUSTI. VALES EXCE:						SALDO EN VALES RECORRIDO: 0.00	
						Vales Anticipo en Comprobado: 0.00 - 0.00	
						SALDO VALES MANIOBRAS: 0.00	
						\$ VALES A REGRESAR: 0.00 \$	

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ **459.00**

(CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARE EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DIAS HABLES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.


EFFECTIVO/A FAVOR	CEA
-------------------	-----

CARGO CONTABLE	\$ 459.00
MENOS ANTICIPO	\$ 459.00
SALDO	\$ 0.00

COMISIONADO:
ROGELIO BARRAGAN CERVAANTES
Jefe de Servicio y Apoyo Operativo

(*) Nota: Sólo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C.:

ROGELIO BARRAGAN CERVANTES N° OFICIO: DSM / C-0088 / 2019

DEL DÍA: 14/03/2019 AL DÍA: 15/03/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN:


14 de marzo de 2019.- En coordinación con los Ing. Edgar Said López Saldivar, Director de Área Servicio a Municipios y del Ing. Eduardo Huerta Oviedo, jefe de Pozos de la CEA, Jalisco, se acudió a supervisar los trabajos de pistoneo del nuevo pozo profundo que se perforó en la cabecera municipal de San Martín Hidalgo, Jalisco, el cual que tiene ademe de 8", 220 metros de profundidad total y un nivel estático de 53.30 metros. Se terminó la limpieza e inició la instalación de la bomba sumergible marca Grundfos modelo 300S400-10 con motor de 40 H. P., 460 volts, 3 fases.

La columna instalada es de 4" de diámetro y 172.80 metros de longitud. Para realizar esta prueba será necesario el traslado y uso de un generador de energía eléctrica con motor diésel de 80 KW de capacidad.

15 de marzo de 2019.- En coordinación con el Ing. José Luis Rojas Jefe Operativo de la Dirección de Agua Potable de Ahualulco de Mercado Jalisco, se supervisó la prueba de equipo de bombeo que se instaló en el pozo La Unidad Deportiva en la que se instaló bomba sumergible demarca BIMs con motor de 100 H. P., 460 volts con columna de bombeo de 8" y 6" con una longitud de 170.80, se iniciaron pruebas con un gasto a descarga libre de 40 L. P. S. con un nivel dinámico de 104 metros, una vez que se limpió el agua se interconectó el tren de descarga a la red , los valores de tensión son 441 volts. Y la corriente es de 115 amperes.

COMENTARIOS:

S/I.C.

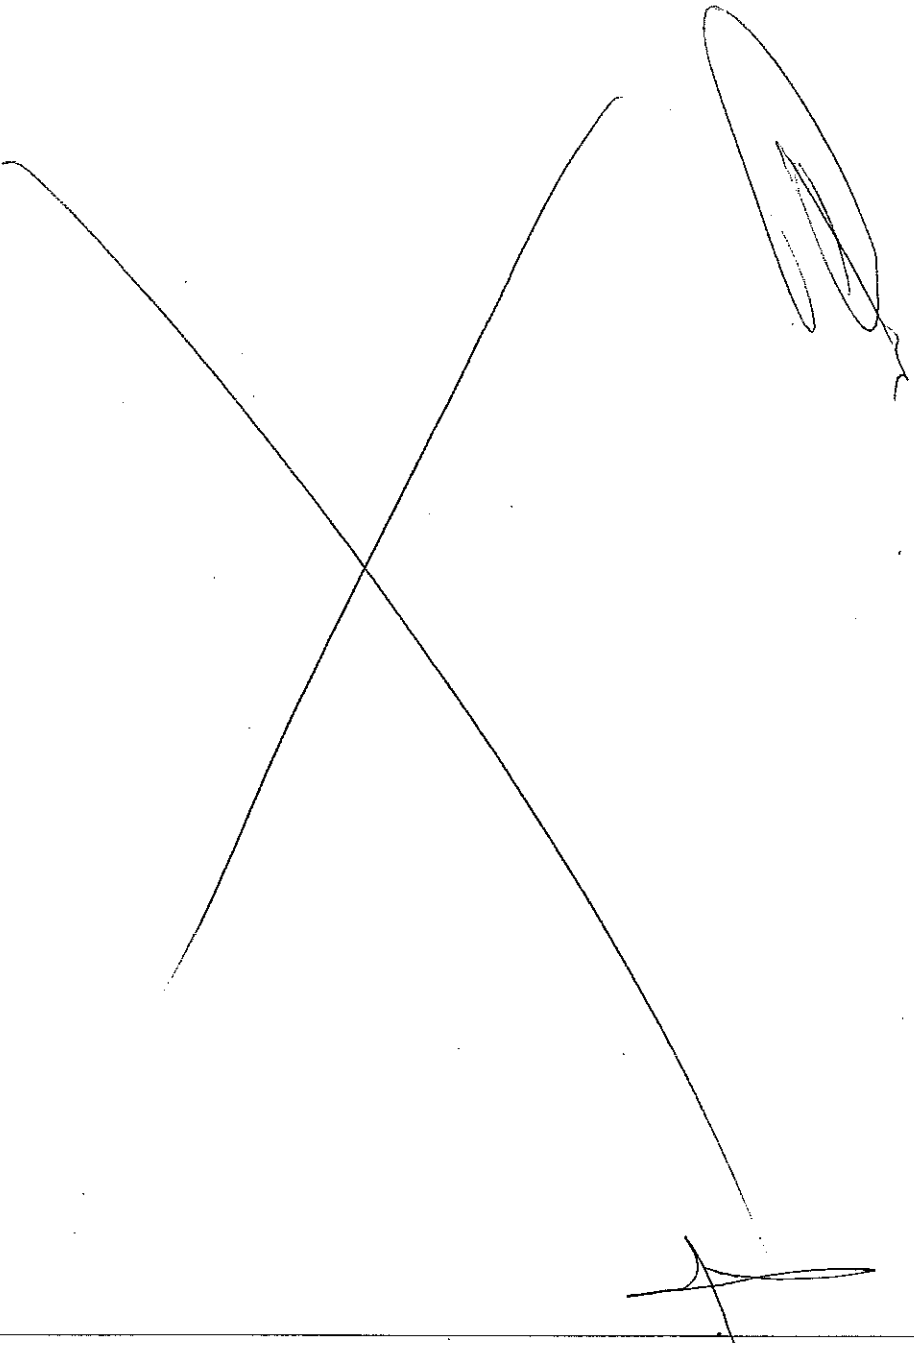

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C

ROGELIO BARRAGAN CERVANTES N° OFICIO: DSM / C-0088 / 2019

DEL D/A: 14/03/2019 AL D/A: 15/03/2019

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA

