

Fecha Pago Anticipo:	10/03/2017
Fecha Elib. Compro:	14/03/2017
N° de Oficio:	GSM / C-0298 / 2017 F
RESUMEN COMPRO:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Mar 14 2017 10:09AM

GERENTE O DIRECTOR:	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO:	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO:	ALFONSO ESPINOZA MENDEZ	PUESTO:	AYUDANTE DE GRUA
ACOMPANA:		PUESTO:	

EFABOR DOCUMENTO: ROGELIO BARRAGAN CERVANTES - JEFE DE SERVICIO Y APOYO OPERATIVO      ESTADO: Oficio Comprobado Pendiente Autorización por el Usuario

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
10/03/2017	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GP (1) 0.00 ACTIVIDAD: Traslado e iniciar cambio de equipo de bombeo del pozo profundo SCI 29 de CEA, Jalisco, Of. DOP-082/2017, Of. Deleg. DG-598/2016	Tlajomulco de Zúñiga \$ 128.00 GASOLINA 0.00 MUS EXCE HOSPE	Tlajomulco de Zúñiga \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
11/03/2017	MUNICIPIO Tlajomulco de Zúñiga \$ 75.00 GP (1) 0.00 ACTIVIDAD: Continuar cambio de equipo de bombeo del pozo profundo SCI 29 de CEA, Jalisco, Of. DOP-082/2017, Of. Deleg. DG-598/2016	Tlajomulco de Zúñiga \$ 128.00 GASOLINA 0.00 MUS EXCE HOSPE	Tlajomulco de Zúñiga \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)

(\*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB	IVA	SALDO	VEHICULO / PLACAS	JN 61030	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA:	10/03/2017	VIÁTICOS	753.00	477.00	0.00	\$ 276.00	TIPO/CILINDROS/REND	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	12:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA/MODELO	Ford / 2007	
DIA(S) COMISIÓN:	2	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL / FINAL	110,962.00 Km. / 111,082.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	11/03/2017	PEAJES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO	120.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	21:00 Hrs.	TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Especial	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017				Anticipo de Gasto	0 + 0 + 0 = 0	
HOROMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						Saldo por KM Recorrido	0.00	
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO	0.00	
							VALES EN VALES COMPROBADO	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS	0.00	
							VALES A REGRESAR	0.00	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 753.00 ( SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR  
 CEA

CARGO CONTABLE \$ 477.00  
 MENOS ANTICIPO \$ 753.00  
 SALDO \$ 276.00

JUSTIFICACIÓN COMISIÓN ESPECIAL: Características de trabajos de retiro e instalación de equipos de bombeo.

Por las características del trabajo realizado, consistente en realizar maniobras de retiro e instalación de columnas de bombeo, cable sumergible, equipo de bombeo, poliducto para sonda eléctrica de los pozos profundos, y de la necesidad de realizar los trabajos en el menor tiempo posible para restablecer el servicio de dotación de agua potable a la población, se hace necesario que el personal permanezca hospedándose en el municipio a quien se prestó este servicio. De otra manera, el traslado del personal al lugar de trabajo y regreso a Guadalajara, provocaría pérdidas de tiempo Horas / Hombre, mayor consumo de combustible, desgaste de equipos y riesgos Innecesarios. Generando además que los trabajos se prolongarían hasta el doble de tiempo.

NOTAS: SE AUTORIZA AL COMISIONADO COTIZAR IMPORTE IGUALES A SUPERIOR JERÁRQUICO Y/O COTIZAR DENTRO DE UNA DISTANCIA MENOR AL RANGO ESTABLECIDO.

COMISIONADO  
 ALFONSO ESPINOZA MENDEZ  
 AYUDANTE DE GRUA

AUTORIZA COMPROBACIÓN ESPECIAL  
 ERNESTO MARROQUIN ALVAREZ  
 DIRECTOR DE APOYO A MUNICIPIOS

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
 DIRECTOR O GERENTE

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.





## INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C.

ALFONSO ESPINOZA MENDEZ N° OFICIO: GSM / C-0298 / 2017

DEL DÍA 10/03/2017 AL DÍA 11/03/2017

### RESULTADO DE LA COMISIÓN

10 de marzo 2017.- En coordinación con el Tgo. Rogelio Barragan Cervantes, Jefe de Servicio y Apoyo Operativo, del Ing. Humberto González Valdez, Supervisor de Perforación de Pozos y del Ing. Pablo Alejandro Jimenez Bautista, Jefe de Planta Potabilizadora El Salto, se traslado en la camioneta placas JN 61030 para apoyar la llevada del camión grúa JN 75 242, a las instalaciones de la Planta SCI 29 de Tlajomulco de Zúñiga Jalisco para que estuviera preparada para el cambio de equipo de bombeo del pozo profundo.

11 de marzo 2017.- En coordinación con el Ing. Pablo Alejandro Jimenez Bautista, Jefe de Planta Potabilizadora El Salto, y del Ing. Misael Espinoza, Jefe de servicios de la Planta SCI 29, se realizó el cambio de equipos de bombeo del pozo profundo Planta SCI 29 de Tlajomulco de Zúñiga Jal.

#### Pozo SCI 29

##### Datos de pozo profundo:

- Diámetro de ademe 8".
- Profundidad del pozo 150.30 metros.
- Nivel estático 81 metros.

##### Datos del equipo original:

- Transformador 30 Kva – 23 Kv / 440 – 254 V. 3 fases.
- Arrancador a tensión reducida 20 H. P. 440 volts, 3 fases.
- Bomba Sumergible marca Grundfos modelo 300 S200 – 5.
- Motor Sumergible marca Franklin Electric modelo 2366148120, 20 H. P., 460 v., 3 fases., 3,450 R. P. M.
- Cable sumergible calibre 3 X 6 AWG.
- Columna de bombeo de 4" Ø y 134 m. de longitud.
- Tren de descarga de 6" Ø.

##### Valores de operación:

Nivel estático.- 81.00 m.

Gasto.- 3.00 l. p. s.

Nivel dinámico.- 88.00 m.

Presión de operación 1.20 Kg/cm<sup>2</sup>

Tensión.- 446.00 V.

Corriente.- 26.30 A.

##### Datos del equipo nuevo:

- Transformador 30 Kva – 23 Kv / 440 – 254 V. 3 fases.
- Variador de velocidad marca Damfos 20 H. P. 440 volts, 3 fases.
- Bomba Sumergible marca Altamira modelo KOR 10 R200 – 11.
- Motor Sumergible marca Franklin Electric modelo 2366148120, 20 H. P., 460 v., 3 fases., 3,450 R. P. M.
- Cable sumergible calibre 3 X 6 AWG.
- Columna de bombeo de 4" Ø y 134 m. de longitud.
- Tren de descarga de 6" Ø.

##### Valores de operación:

Nivel estático.- 81.00 m.

Gasto.- 3.30 l. p. s.


Nivel dinámico.- 126.00 m.

Presión de operación 1.20 Kg/cm<sup>2</sup>

Tensión.- 440.00 V.

Corriente.- 20.30 A.

Regulación de velocidad quedó en 3059 R. P. M. (53.20 Hz).





Se realizaron pruebas tratando de obtener un gasto mayor sin ser esto posible ya que sacando un gasto de 3.40 l. p. s. se va a fondo el nivel dinámico.

Se traslado y resguardó la camioneta en el almacén CEA. Francia

COMENTARIOS

se cumple con el objetivo

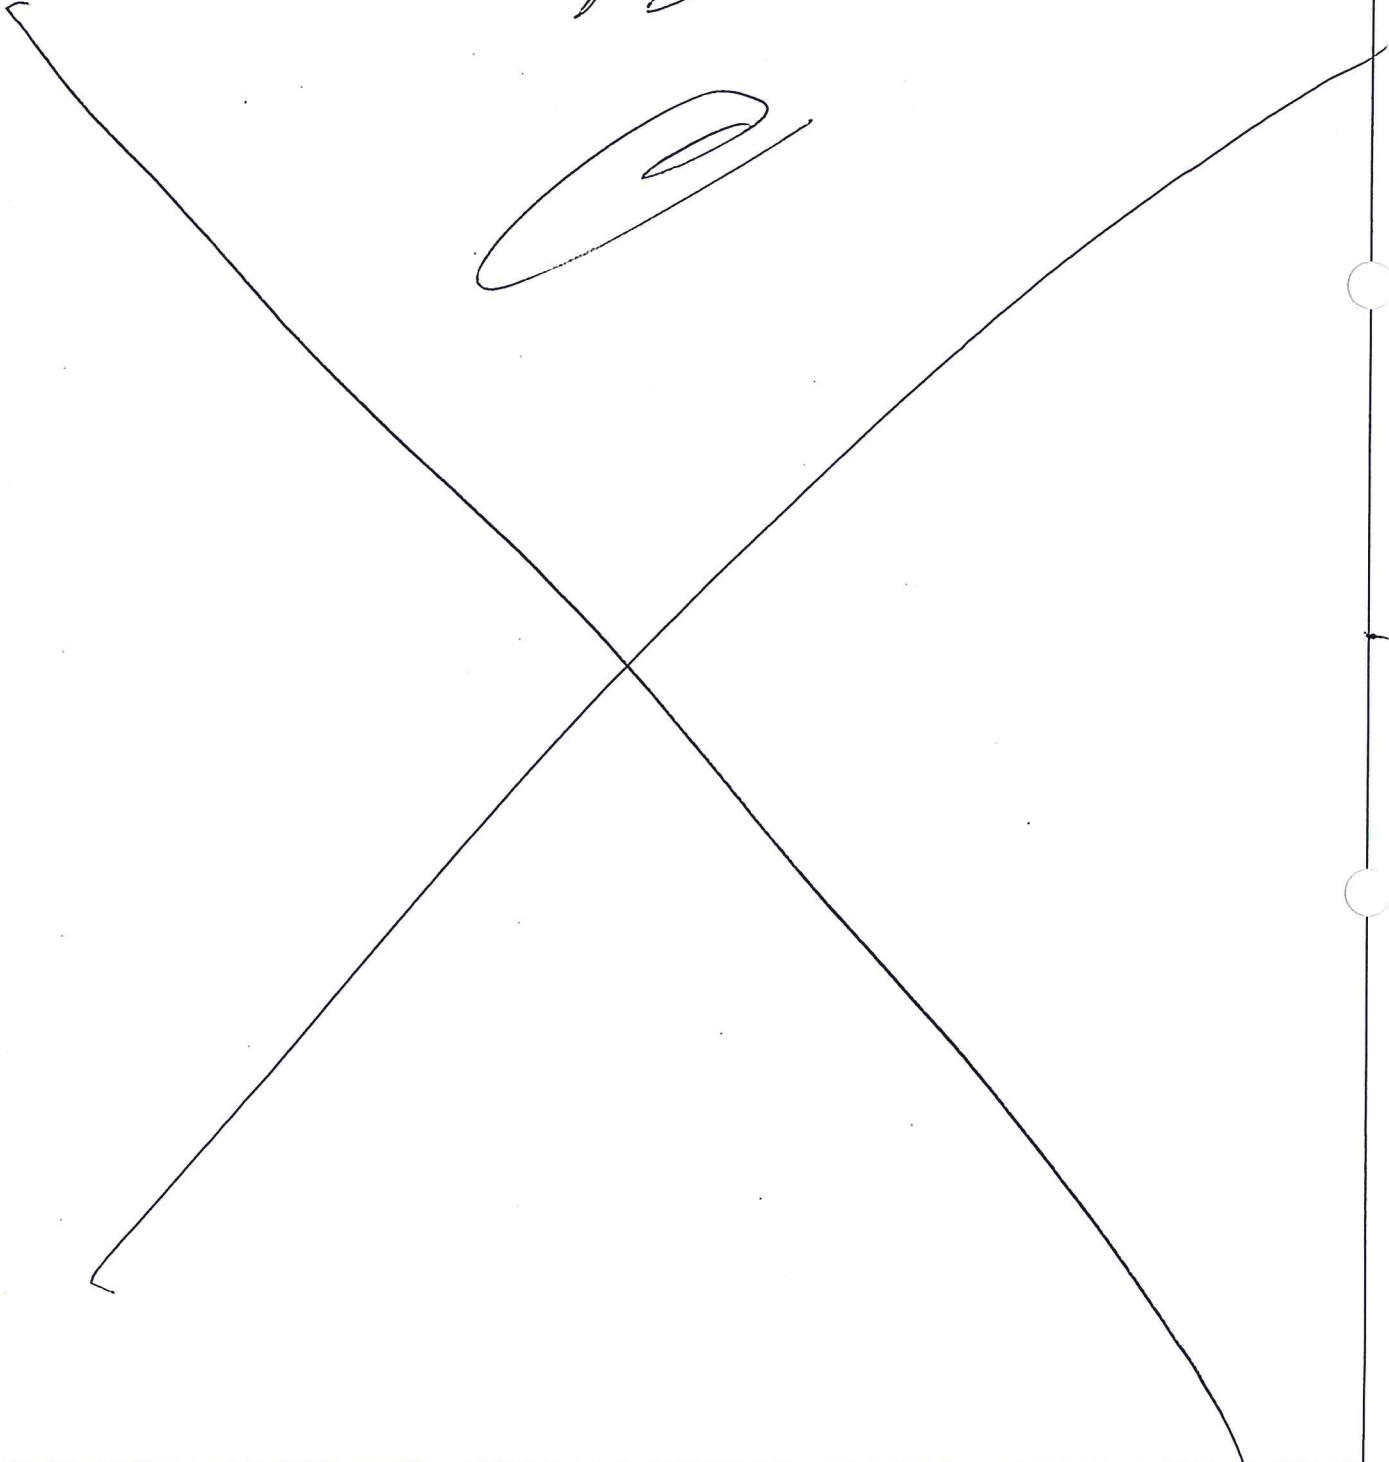

# COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
ALFONSO ESPINOZA MENDEZ	N° OFICIO: GSM / C-0298 / 2017
DEL DÍA: 10/03/2017	AL DÍA: 12/03/2017

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
<div data-bbox="259 514 706 808"></div> <p data-bbox="178 829 730 1123"><i>Jalea</i> Pablo Jiménez Parque Industrial El saito 11 / Mar 2017</p>	
