



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

RECIBO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



Fecha Pago Anticipo	10/03/2017
Fecha Elab. Compro.	21/03/2017
N° de Oficio	GSM / C-0303 / 2017 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Mar 21 2017 11:41AM

GERENTE O DIRECTOR:	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO:	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO:	SAUL OMAR AGUILAR LOPEZ	PUESTO:	OPERADOR DE GRUA
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO: ROGELIO BARRAGAN CERVANTES - JEFE DE SERVICIO Y APOYO OPERATIVO STATUS: Oficio Comprobado; Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
10/03/2017	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00	Tlajomulco de Zúñiga \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS: EXCE: HOSP:	Tlajomulco de Zúñiga \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: Traslado e iniciar cambio de equipo de bombeo del pozo profundo SCI 29 de CEA, Jalisco. Of. DOP-082/2017. Of. Deleg. DG-598/2016				
11/03/2017	MUNICIPIO Tlajomulco de Zúñiga \$ 75.00 GD: (1) 0.00	Tlajomulco de Zúñiga \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS: EXCE: HOSP:	Tlajomulco de Zúñiga \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: Continuar cambio de equipo de bombeo del pozo profundo SCI 29 de CEA, Jalisco. Of. DOP-082/2017. Of. Deleg. DG-598/2016				

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO = PLACAS	JN 75372	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA:	10/03/2017	VIÁTICOS \$:	753.00	477.00	0.00	\$ 276.00	TIPO / CILINDROS / REND:	CHASIS CABINA-PIPA / 6 Cil. / 3.5 Km.		
HORA SALIDA:	12:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	1,000.00	0.00	0.00	\$ 1,000.00	MARCA / MODELO:	Internacional / 2008		
DÍA(S) COMISIÓN:	2	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	100,970.00 Km. / 105,516.00 Km.		
FECHA DE REGRESO:	11/03/2017	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	4,546.00 Km.		
HORA DE REGRESO:	21:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN			
TIPO DE COMISIÓN:	Especial	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAP 2017				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPR:	0 + 0 + 0 = 0		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO:	18,770.00		
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00		
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00		
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00		
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 1,753.00 (MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100-MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE \$ 477.00
MENOS ANTICIPO \$ 1,753.00
SALDO \$ 1,276.00

JUSTIFICACIÓN COMISIÓN ESPECIAL: Por las características del trabajo realizado, consistente en realizar maniobras de llenado de pipas en fuentes de abastecimiento de agua potable y su traslado y distribución a zonas con desabasto, y de la necesidad de realizar los trabajos en el menor tiempo posible en tanto se restablecen los servicios normales abastecimiento, se hace necesario que el personal permanezca hospedándose en el municipio a quien se prestó este servicio. De otra manera, el traslado del personal al lugar de trabajo y regreso a Guadalajara, provocaría pérdidas de tiempo Horas / Hombre, mayor consumo de combustible, desgaste de equipos y riesgos Innecesarios. Generando además que los trabajos se prolongarían hasta el doble de tiempo.

NOTAS: SE AUTORIZA AL COMISIONADO COTIZAR IMPORTE IGUALES A SUPERIOR JERÁRQUICO Y/O COTIZAR DENTRO DE UNA DISTANCIA MENOR AL RANGO ESTABLECIDO.

COMISIONADO
SAUL OMAR AGUILAR LOPEZ
OPERADOR DE GRUA

AUTORIZA COMPROBACIÓN ESPECIAL
ERNESTO MARROQUIN ALVAREZ
DIRECTOR DE APOYO A MUNICIPIOS

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR O GERENTE

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

SAUL OMAR AGUILAR LOPEZ N° OFICIO: GSM / C-0303 / 2017

DEL DÍA: 10/03/2017 AL DÍA: 11/03/2017

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

10 de marzo 2017.- En coordinación con el Tgo. Rogelio Barragan Cervantes, Jefe de Servicio y Apoyo Operativo, del Ing. Humberto González Valdez, Supervisor de Perforación de Pozos y del Ing. Pablo Alejandro Jimenez Bautista, Jefe de Planta Potabilizadora El Salto, me trasladé en camión pipa a el Parque Industrial para la instalación de mangueras y conexiones nuevas para que estuvieran preparadas para el abastecimiento de agua potable por el cambio de equipos de bombeo del pozo profundo Planta SCI 29 de Tlajomulco de Zuñiga Jal.

11 de marzo 2017.-En coordinación con el Ing. Pablo Alejandro Jimenez Bautista, Jefe de Planta Potabilizadora El Salto, y del Ing. Misael Espinoza, Jefe de servicios de la Planta SCI 29, se realizó el apoyo en el abasto de agua con un total de 5 viajes en lo que se realizaba el cambio de equipos de bombeo del pozo profundo Planta SCI 29 de Tlajomulco de Zuñiga Jal. Se resguardó pipa en almacén de Ávila Camacho.

Pozo SCI 29

Datos de pozo profundo:

- Diámetro de ademe 8".
- Profundidad del pozo 150.30 metros.
- Nivel estático 81 metros.

Datos del equipo original:

- Transformador 30 Kva – 23 Kv / 440 – 254 V. 3 fases.
- Arrancador a tensión reducida 20 H. P. 440 volts, 3 fases.
- Bomba Sumergible marca Grundfos modelo 300 S200 – 5.
- Motor Sumergible marca Franklin Electric modelo 2366148120, 20 H. P., 460 v., 3 fases., 3,450 R. P. M.
- Cable sumergible calibre 3 X 6 AWG.
- Columna de bombeo de 4" Ø y 134 m. de longitud.
- Tren de descarga de 6" Ø.

Valores de operación:

Nivel estático.- 81.00 m.

Gasto.- 3.00 l. p. s.

Nivel dinámico.- 88.00 m.

Presión de operación 1.20 Kg/cm²

Tensión.- 446.00 V.

Corriente.- 26.30 A.

Datos del equipo nuevo:

- Transformador 30 Kva – 23 Kv / 440 – 254 V. 3 fases.
- Variador de velocidad marca Damfos 20 H. P. 440 volts, 3 fases.
- Bomba Sumergible marca Altamira modelo KOR 10 R200 – 11.
- Motor Sumergible marca Franklin Electric modelo 2366148120, 20 H. P., 460 v., 3 fases., 3,450 R. P. M.
- Cable sumergible calibre 3 X 6 AWG.
- Columna de bombeo de 4" Ø y 134 m. de longitud.
- Tren de descarga de 6" Ø.

Valores de operación:

Nivel estático.- 81.00 m.

Gasto.- 3.30 l. p. s.

Nivel dinámico.- 126.00 m.

Presión de operación 1.20 Kg/cm²

Tensión.- 440.00 V.


Corriente.- 20.30 A.

Regulación de velocidad quedó en 3059 R. P. M. (53.20 Hz).

Se realizaron pruebas tratando de obtener un gasto mayor sin ser esto posible ya que sacando un gasto de 3.40 l. p. s. se va a fondo el nivel


dinámico.

Señor Omar Acuña López




COMENTARIOS:

se cumplió el objetivo.

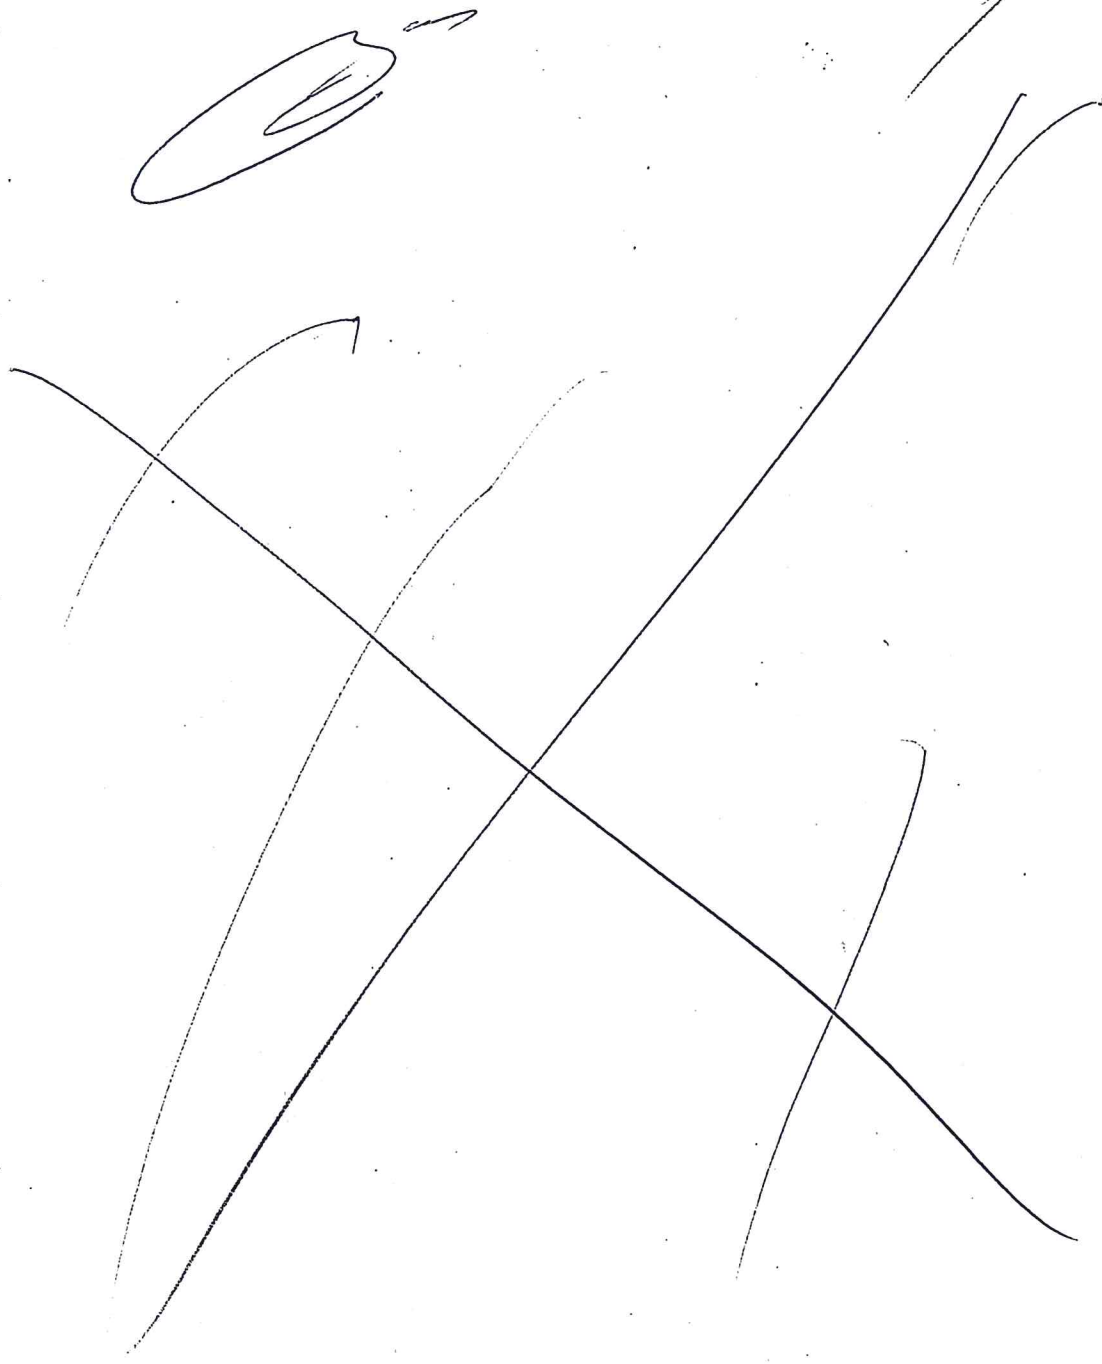

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C.	
SAUL OMAR AGUILAR LOPEZ	N° OFICIO: GSM / C-0303 / 2017
DEL DÍA: 10/03/2017	AL DÍA: 12/03/2017

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p><i>Jef</i> Pablo Jiménez Parque Industrial El Salto 11 / mar / 2017</p>	
