

Fecha Pago Anticipo	10/03/2017
Fecha Efectivo Compro	13/03/2017
N° de Oficio	GSM / C-0308 / 2017 F
RESUMEN COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Mar 13 2017 9:56AM

GERENTE O DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	ELIAS VILLALOBOS NUÑO	PUESTO	AYUDANTE DE PERFORADOR
ACOMPANAVA		PUESTO	

ELABORADOR DOCUMENTO: ROGELIO BARRAGAN CERVANTES - JEFE DE SERVICIO Y APOYO OPERATIVO STATUS Oficio Comprobado Rendiente Autorización por el Usuario

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y MONTOS POR FOLIO

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	ALMUERZO	HOSPEDAJE COMPROBADO
10/03/2017	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD (**) 0.00	El Salto \$ 128.00	El Salto \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD: traslado y cambio de mangueras y conexiones a camiones pipas			
11/03/2017	MUNICIPIO Tlajomulco de Zúñiga \$ 75.00 GD (**) 0.00	Tlajomulco de Zúñiga \$ 128.00	Tlajomulco de Zúñiga \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD: traslado y apoyo en el abasto de agua por cambio de equipo de bombeo en planta SCI29			

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISION		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VERIFICAR PLACAS	JN 61345	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA	10/03/2017	VIATICOS	753.00	477.00	0.00	\$ 276.00	TIPO QUINDROS / RENDI	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.		
HORA SALIDA	12:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO	Ford / 2007		
DIAS COMISION	2	GASOLINAS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL - FINAL	136,622.00 Km. / 136,937.00 Km.		
FECHA DE REGRESO	11/03/2017	PEAJES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO	315.00 Km.		
HORA DE REGRESO	18:00 Hrs.	TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISION			
TIPO DE COMISION	Especial	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017				VALOR EXCESIVO POR COMPROB.	0 + 0 + 0 = 0		
DURACION DE COMPROBACION	0.00 Hrs.						VALOR POSITIVO POR COMPROB.	0.00		
JUST. VAL. EXCE.							SALDO EN VAL. RECORRIDO	0.00		
							VAL. MÍN. EN VAL. RECORRIDO	0.00 - 0.00		
							SALDO VAL. MANIOBRAS	0.00		
							VAL. VAL. A REGRESAR	0.00		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 753.00 (SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPRÉ EN UN PLAZO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISION.

EFFECTIVO/A FAVOR	CARGO CONTABLE	\$ 477.00
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 753.00
	SALDO	\$ 276.00

JUSTIFICACIÓN COMISION ESPECIAL: Características de trabajos de abastecimiento de agua potable en pipas. Por las características del trabajo realizado, consistente en realizar maniobras de llenado de pipas en fuentes de abastecimiento de agua potable y su traslado y distribución a zonas con desabasto, y de la necesidad de realizar los trabajos en el menor tiempo posible en tanto se restablecen los servicios normales abastecimiento, se hace necesario que el personal permanezca hospedándose en el municipio a quien se prestó este servicio. De otra manera, el traslado del personal al lugar de trabajo y regreso a Guadalajara, provocaría pérdidas de tiempo Horas / Hombre, mayor consumo de combustible, desgaste de equipos y riesgos innecesarios. Generando además que los trabajos se prolongarían hasta el doble de tiempo.

NOTAS: SE AUTORIZA AL COMISIONADO COTIZAR IMPORTE IGUALES A SUPERIOR JERÁRQUICO Y/O COTIZAR DENTRO DE UNA DISTANCIA MENOR AL RANGO ESTABLECIDO.

Elías Villalobos Nuño
 COMISIONADO
 ELIAS VILLALOBOS NUÑO
 AYUDANTE DE PERFORADOR

AUTORIZA COMPROBACIÓN ESPECIAL
 ERNESTO MARROQUIN ALVAREZ
 DIRECTOR DE APOYO A MUNICIPIOS

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISION
 DIRECTOR O GERENTE

(1). Nola. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C.

ELIAS VILLALOBOS NUÑO N° OFICIO: GSM / C-0308 / 2017

DEL DÍA: 10/03/2017 AL DÍA: 11/03/2017

RESULTADO DE LA COMISIÓN

10 de marzo 2017.- En coordinación con el Tgo. Rogelio Barragan Cervantes, Jefe de Servicio y Apoyo Operativo, del Ing. Humberto González Valdez, Supervisor de Perforación de Pozos y del Ing. Pablo Alejandro Jimenez Bautista, Jefe de Planta Potabilizadora El Salto, me trasladé en pick up a el Parque Industrial para la instalación de mangueras y conexiones nuevas para que estuvieran preparadas para el abastecimiento de agua potable por el cambio de equipos de bombeo del pozo profundo Planta SCI 29 de Tlajomulco de Zuñiga Jal.

11 de marzo 2017.-En coordinación con el Ing. Pablo Alejandro Jimenez Bautista, Jefe de Planta Potabilizadora El Salto, y del Ing. Misael Espinoza, Jefe de servicios de la Planta SCI 29, se realizó el apoyo en el abasto de agua con un total de 5 viajes en lo que se realizaba el cambio de equipos de bombeo del pozo profundo Planta SCI 29 de Tlajomulco de Zuñiga Jal. Se resguardó pick up en francia.

Pozo SCI 29

Datos de pozo profundo:

- Diámetro de ademe 8".
- Profundidad del pozo 150.30 metros.
- Nivel estático 81 metros.

Datos del equipo original:

- Transformador 30 Kva – 23 Kv / 440 – 254 V. 3 fases.
- Arrancador a tensión reducida 20 H. P. 440 volts, 3 fases.
- Bomba Sumergible marca Grundfos modelo 300 S200 – 5.
- Motor Sumergible marca Franklin Electric modelo 2366148120, 20 H. P., 460 v., 3 fases., 3,450 R. P. M.
- Cable sumergible calibre 3 X 6 AWG.
- Columna de bombeo de 4" Ø y 134 m. de longitud.
- Tren de descarga de 6" Ø.

Valores de operación:

Nivel estático.-	81.00 m.
Gasto.-	3.00 l. p. s.
Nivel dinámico.-	88.00 m.
Presión de operación	1.20 Kg/cm ²
Tensión.-	446.00 V.
Corriente.-	26.30 A.

Datos del equipo nuevo:

- Transformador 30 Kva – 23 Kv / 440 – 254 V. 3 fases.
- Variador de velocidad marca Damfos 20 H. P. 440 volts, 3 fases.
- Bomba Sumergible marca Altamira modelo KOR 10 R200 – 11.
- Motor Sumergible marca Franklin Electric modelo 2366148120, 20 H. P., 460 v., 3 fases., 3,450 R. P. M.
- Cable sumergible calibre 3 X 6 AWG.
- Columna de bombeo de 4" Ø y 134 m. de longitud.
- Tren de descarga de 6" Ø.

Elias Villalobos

Valores de operación:

Nivel estático.- 81.00 m.
Gasto.- 3.30 l. p. s.
Nivel dinámico.- 126.00 m.
Presión de operación 1.20 Kg/cm²
Tensión.- 440.00 V.
Corriente.- 20.30 A.

Regulación de velocidad quedó en 3059 R. P. M. (53.20 Hz).


Se realizaron pruebas tratando de obtener un gasto mayor sin ser esto posible ya que sacando un gasto de 3.40 l. p. s. se va a fondo el nivel dinámico.

Elio Villalobos

COMENTARIOS


se cumplió con el objetivo

[Handwritten signature]

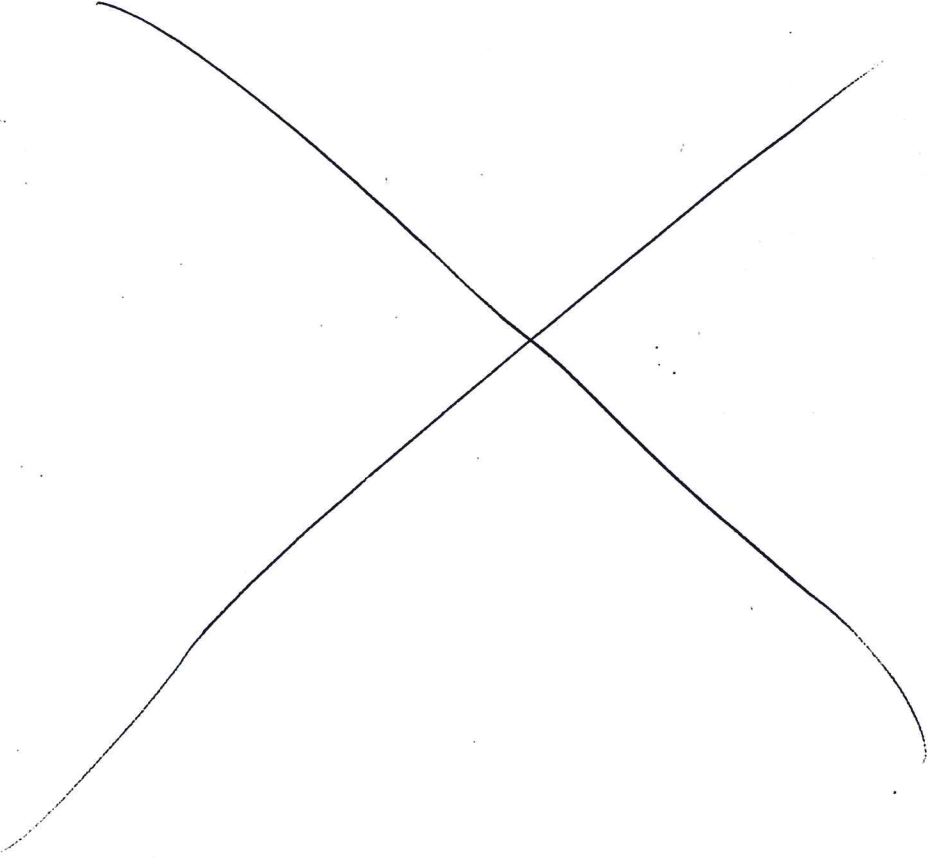

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
ELIAS VILLALOBOS NUÑO N° OFICIO: GSM / C-0308 / 2017
DEL DÍA: 10/03/2017 AL DÍA: 12/03/2017

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p><i>Yanf</i> Pablo Jiménez Parque Industrial El Sanito 11 / Mar / 2017</p>	
