

Fecha Pago Anticipo:	18/05/2018
Fecha Elab. Compro:	22/05/2018
N° de Oficio:	GSM / C-0477 / 2018 F
RESUMEN COM:	

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: May 22 2018 12:53PM

GERENTE O DIRECTOR:	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO:	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO:	ROGELIO BARRAGAN CERVANTES	PUESTO:	JEFE DE SERVICIO Y APOYO OPERATIVO
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO: ROGELIO BARRAGAN CERVANTES - JEFE DE SERVICIO Y APOYO OPERATIVO

STATUS: Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

### DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
18/05/2018	Poncitlán	Sin Desayuno. \$ 0.00	Poncitlán \$ 166.00	Poncitlán \$ 92.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	Prueba de productividad nuevo pozo San Pedro Itzcán (convenio CEA-PERF. 005/2018)			
19/05/2018	Poncitlán	Poncitlán \$ 92.00	Poncitlán \$ 166.00	Poncitlán \$ 92.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	Prueba de productividad nuevo pozo San Pedro Itzcán (convenio CEA-PERF. 005/2018)			

(\*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*) IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	JT 93642	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA:	18/05/2018	VIÁTICOS \$:	866.00	608.00	0.00	\$ 258.00	TIPO / CILINDROS / REND:	RANGER CREW CAB XLT / 4 Cil. / 9.5 Km/l.		
HORA SALIDA:	12:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	5,000.00	0.00	0.00	\$ 5,000.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2014		
DÍA(S) COMISIÓN:	2	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	70,482.00 Km. / 70,812.00 Km.		
FECHA DE REGRESO:	19/05/2018	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	330.00 Km.		
HORA DE REGRESO:	21:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN			
TIPO DE COMISIÓN:	Servicio sin cobr	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO =	0.00		
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00		
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00		
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00		
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **5,866.00** ( CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR  
CEA

CARGO CONTABLE \$ 608.00  
MENOS ANTICIPO \$ 5,866.00  
SALDO \$ 5,258.00

COMISIONADO  
ROGELIO BARRAGAN CERVANTES  
JEFE DE SERVICIO Y APOYO OPERATIVO

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
DIRECTOR / GERENTE

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.



## INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

ROGELIO BARRAGAN CERVANTES N° OFICIO: GSM / C-0477 / 2018

DEL DÍA: 18/05/2018 AL DÍA: 19/05/2018

### RESULTADO DE LA COMISIÓN:

18 de mayo de 2018.- Se acudió al nuevo pozo profundo en proceso de perforación de la localidad de San Pedro Itzcán, Municipio de Poncitlán, Jalisco, para en coordinación con el personal técnico y del Ing. Humberto González Valdez, Supervisor de Perforación de pozos de la Gerencia de Servicio a Municipios, con el fin de realizar una prueba de productividad de agua potable del pozo profundo mencionado.

19 de mayo 2018.- Se regresa al nuevo pozo profundo en proceso de perforación de la localidad de San Pedro Itzcán, Mpio. de Poncitlán, Jalisco.

Se instaló una bomba sumergible marca GRUNDFOS, Modelo 300S400-10, con motor de 40 H. P., 460 volts, columna de bombeo de perforación de 4" con sección libre de 2½" de diámetro y longitud de 90 metros.

El equipo se instaló con camisa de enfriamiento y filtro de grava obteniendo los siguientes resultados:

Nivel estático: 42 metros

#### Con descarga libre

Hora : 11:30  
 Gasto : 6.70 l. p. s.  
 Tensión : 440.00 volts.  
 R. P. M. : 2415.00  
 Nivel dinámico : 73.00 metros

Hora : 12:30  
 Gasto : 6.60 l. p. s.  
 Tensión : 440.00 volts.  
 R. P. M. : 2760.00  
 Nivel dinámico : 75.00 metros

Hora : 14:30  
 Gasto : 7.20 l. p. s.  
 Tensión : 440.00 volts.  
 R. P. M. : 2875.00  
 Nivel dinámico : 75.00 metros

Hora : 16:30  
 Gasto : 7.20 l. p. s.  
 Tensión : 440.00 volts.  
 R. P. M. : 3162.00  
 Nivel dinámico : 73.00 metros


Hora : 18:30  
 Gasto : 7.20 l. p. s.  
 Tensión : 440.00 volts.  
 R. P. M. : 3450.00  
 Nivel dinámico : 73.00 metros




Se inicia el retiro del equipo de bombeo acomodando el cable sumergible en el carrete y junto con la camisa de enfriamiento con filtro de graba se subió al camión HIAB placas JP 29431 y la camioneta placas JU 53523 que trae el generador eléctrico de 80 KW, se trasladaron al almacén de CEA Ávila Camacho en Guadalajara, Jalisco, en donde quedaron resguardados.

COMENTARIOS:

S / C

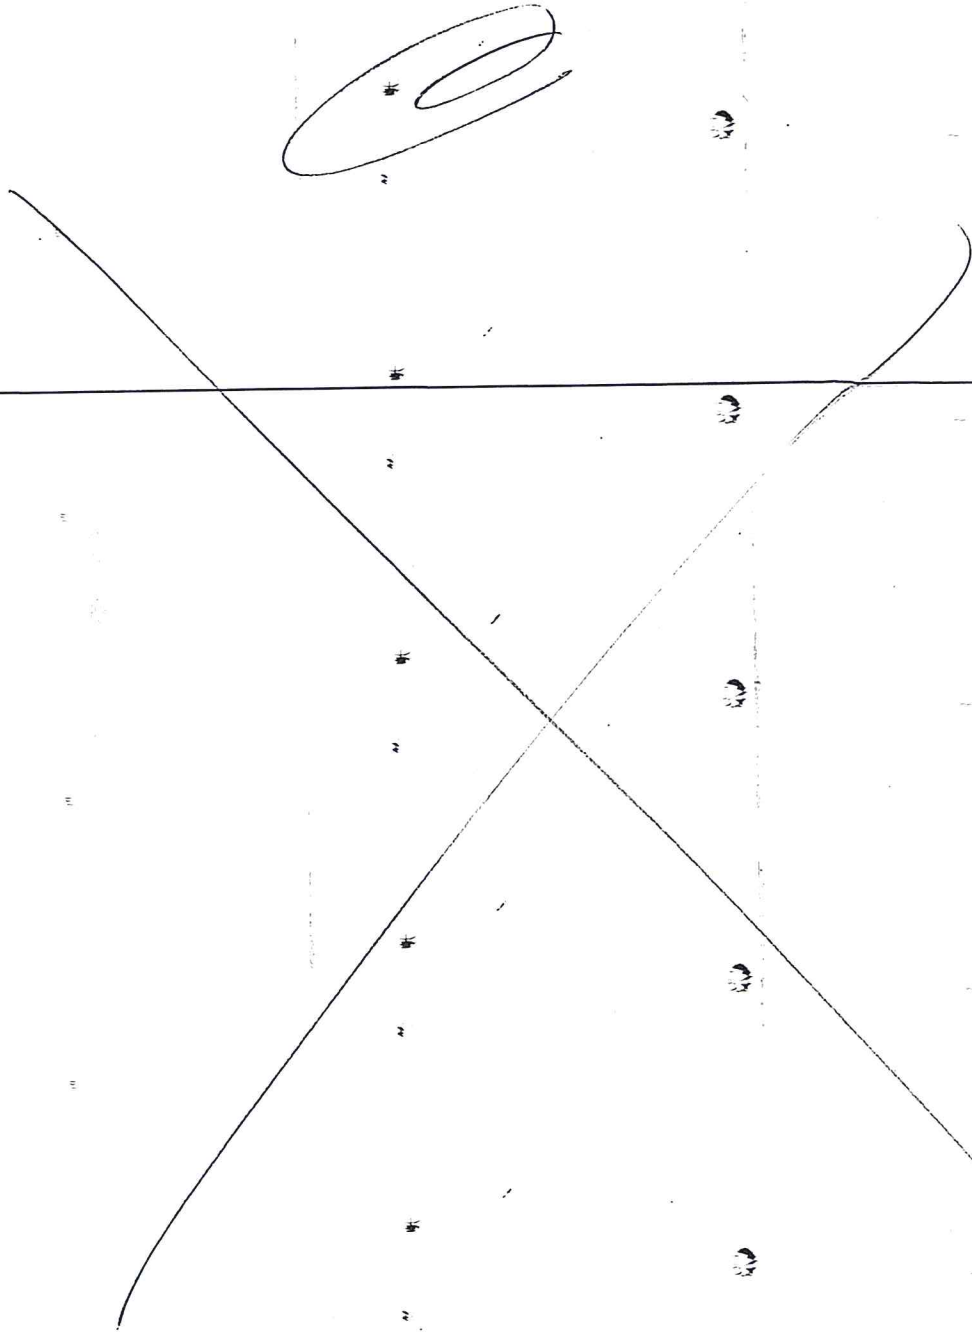

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
ROGELIO BARRAGAN CERVANTES	Nº OFICIO: GSM / C-0477 / 2018
DEL DÍA: 18/05/2018	AL DÍA: 20/05/2018

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	<p>Saturnino Loza Saturnino LOZA</p>
