

Fecha Pago Anticipo	28/04/2017
Fecha Elab Compro	08/05/2017
N° de Oficio	GSM / C-0484 / 2017 F
RESUMEN COMA	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: May 8 2017 2:22PM

GERENTE/DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	RUBEN CEJA CASTILLO	PUESTO	AUXILIAR ELECTROMECHANICO
ACOMPANAA		PUESTO	
ELABORADOR DOCUMENTO	GENA ELIZABETH IRIGUIEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO		ESTATUS: Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Municipio

DESCGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DIA					
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO	
28/04/2017	MUNICIPIO: Etzatlán \$ 75.00 GD: 0.00 GASOLINA: 0.00 EXCEHOSP: 0.00	Etzatlán \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	
ACTIVIDAD: TRASLADO Y DIAGNOSTICO ELECTROMECHANICO POZO OCONAHUA Y REGRESO A GDL					
02/05/2017	MUNICIPIO: Degollado \$ 75.00 GD: 0.00 GASOLINA: 0.00 EXCEHOSP: 0.00	Degollado \$ 128.00	Degollado \$ 73.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	
ACTIVIDAD: REVISION DE EFICIENCIA ELÉCTRICA EN POZOS PROFUNDOS NÚMERO DE OFICIOS S/N 32228 S/N 32194					

(\*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN						VEHICULO - PLACAS	JN 61029	*CON RECARGA
FECHA SALIDA	28/04/2017	CONCEPTO	VIÁTICOS	ANTICIPO	479.00	TIPO/CIENDROS/REND	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORAS SALIDA	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS		0.00	0.00	MARGA/MODELO	Ford / 2007	
DÍAS COMISIÓN	2	GASOLINA		0.00	0.00	MUNICIPAL/FINAL	141,713.00 Km. / 142,252.00 Km.	
FECHA DE REGRESO	02/05/2017	RENTA		0.00	0.00	KM RECORRIDO	539.00 Km.	
HORA DE REGRESO	21:00 Hrs.	TRANSPORTE		0.00	0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN	Servicio sin cobr	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017			0 + 0 + 0 = 0		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN	0.00 Hrs.					130.00		
JUST. VALES EXCE						SALDO EN VALES RECORRIDO	0.00	
						VALES EN VALORES RECORRIDOS	0.00 - 0.00	
						SALDO VALES MANIOBRAS	0.00	
						VALES A REGRESAR	0.00	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 203.00 ( DOSCIENTOS TRES PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR  
EMPLEADO

CARGO CONTABLE \$ 479.00  
MENOS ANTICIPO \$ 203.00  
SALDO \$ 276.00

COMISIONADO  
RUBEN CEJA CASTILLO  
AUXILIAR ELECTROMECHANICO

*Ruben Ceja*

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
DIRECTOR Ó GERENTE

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C

RUBEN CEJA CASTILLO N° OFICIO: GSM / C-0484 / 2017

DEL DÍA 28/04/2017 AL DÍA 02/05/2017

RESULTADO DE LA COMISIÓN

28 de abril de 2017. Me traslade al Municipio de Etzatlán, localidad Oconahua para medir mediciones técnicas de parámetros hidráulicos y mecánicos-eléctricos, en el pozo el tenedor obteniendo los siguientes resultados:

Ubicación del pozo W= 104° 9' 22.719" N= 20° 45' 45.512" Z= 1 353 m,  
Pg = 11.00 kg/cm2, E = 428 425 427 V, I = 55 56 55 A, G = 8.03 l/s, Fp= 85 % ángulo de desfase < 31.78°; Pt= 35.01 kW

Se sugiere video-grabación del pozo y rehabilitación del mismo, instalar poliducto y electro nivel. Se anexará a esta nota el reporte técnico para verificar la normatividad y el cumplimiento de eficiencia mecánica y eléctrica del conjunto motor-bomba, para así poder determinar mejoras del sistema

En toda actividad estuvo presente el Director de Obras Públicas Arq. Miguel Dávalos, y se dialogo con el Presidente de Etzatlán Lic. Eduardo Ron Ramos con relación a la eficiencia de energía eléctrica en dicho pozo

02 de mayo de 2017. Me traslade a Degollado Jalisco, para realizar mediciones en los pozos presa 1, presa 2 y los novios obteniendo los siguientes resultados:

Pozo Presa 1: Ubicación W= 102° 8' 22.304" N= 20° 26' 14.412" Z= 1 721 m,  
Pg = 6.6 kg/cm2, E = 416 419 427 V, I = 56 66 60 A, G = 9.00 l/s, Fp= 85 % < 31.78°, Pt= 37.10 kW

Pozo Presa 2: Ubicación W= 102° 8' 24.762" N= 20° 26' 14.954" Z= 1 718 m,  
Pg = 7.5 kg/cm2, E = 414 418 414 V, I = 126 140 130 A, G = 19.73 l/s, Fp= 89 % < 27.12°, Pt= 84.64 kW ND= 175 m


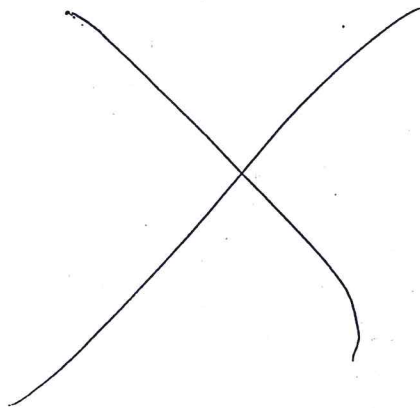
Pozo de los Novios: Ubicación W= 102° 8' 40.366" N= 20° 27' 3.060" Z= 1 715 m,  
Pg = 10.2 kg/cm2, E = 411 417 412 V, I = 41 39 40 A, G = 3.9 l/s, Fp= 85 % < 31.78°, Pt= 24.32 kW, ND= 137 m

En toda actividad estuvo presente el Director de Agua Potable y Alcantarillado de Degollado C. Juan Mesa




COMENTARIOS

S/D

Ruben Ceja

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C  
RUBEN CEJA CASTILLO N° OFICIO: GSM / C-0484 / 2017  
DEL DÍA: 28/04/2017 AL DÍA: 28/04/2017

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>SERVICIOS MUNICIPALES ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2015 2018 ETZATLÁN, JALISCO</p>   <p>SIAPADEC SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y MANEAMIENTO DE DESOLLADO, JAL.</p>	<p>Ricardo Maniscal M. Juan Meza S</p>
